



Koninkrijk der Nederlanden
Ministerie van Binnenlandse Zaken



Covid-19: Van Sprint naar Marathon

Project afschalen
crisisstructuur VWS



Uitgangspunten voor geleidelijke afschaling van de crisisstructuur van VWS

1. Terug naar de lijn waar mogelijk onder voorwaarde:
 - dat alle inhoudelijke dossiers/vraagstukken goed geborgd zijn.
 - dat de inhoudelijke coördinatie geborgd is
 - dat de lijn daarvoor is toegerust.
2. Beleg de uit de Crisisstructuur voortkomende onderwerpen die apart georganiseerd moeten worden (administratieve afhandeling), zoals voorbereiding op de evaluatie.
3. Borg zoveel mogelijk continuïteit (inhoud en personen, veerkracht om de marathon vol te houden)



Niet in het project maar wel te beleggen

1. Afstemming over de ordening en borging van de onderwerpen als bredere afwegingen voor de transitieperiode, opstarten reguliere zorg, toekomstige organisatie van de zorg, contourennota, volksgezondheidsvraagstukken enz. (zie mail (10)(2e) en notitie (10)(2e) (' (10)(2e))
2. Scenario's voor nieuwe crisissituatie/2^e corona Piek: op basis van welke criteria moet er mogelijk weer gekozen worden voor opschaling, mocht een tweede uitbraak of andere onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven. De vraag is waar dat belegd moet worden (DCC?)?
3. Voorbereiding nieuwe kabinetsperiode




Resultaten project 'afschaling'

- **Huidige situatie** in beeld gebracht:
 - Taken VWS
 - Wat verandert er als het NCTV stopt
- Eisen en randvoorwaarden voor de **toekomstige situatie**
- Voorstel voor de **transitie**



Huidige situatie: Crisisstructuur VWS

Crisisstructuur bewindspersonen

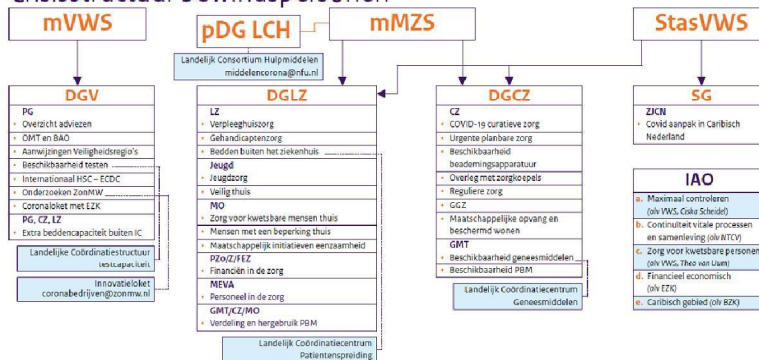

VWS brede Covid-processen

RCC - organisatie crisisonderzoek VWS (OTCB, MBTCB) - terugkoppeling interdepartementale overleggen (UAG, LCB, MCB) - aansluiting op Veiligheidsregio's - dagelijkse uitrap - Contact met IG, RIVM, andere departementen	Liesbeth de Vries met RIVM - Input en terugkoppeling OMT - Organisatie BAO - Crisissituatie discussie - Infectiebestrijding / vraagbaak - Infectiebestrijding en bestaande structuren - Uitwerken scenario's	Coördinatie parlementaire processen: - Kamerbrief - Coördinatie debat (woensdag) - Coördinatie kamervragen - Contactpersoon: Technische briefing	Schrijft team burgerbrieven Ca 15 personen van verschillende VWS-directies Productie ca 100 reacties per dag op vragen en brieven van burgers.	Communicatie
--	---	---	---	---------------------



Huidige situatie : taken DCC

Taken DDC kernteam	Crisissituatie: FTE DCC
Coördinatie werkzaamheden	1
Secretariële taken: - DCC organisatie crisioverleggen VWS (OTCB, MBTCB) - Terugkoppeling interdepartementale overleggen (IAO, ICCB, MCCB)	4
Aansluiting op veiligheidsregio's	2
Dagelijkse sitrap (nieuwsbrief)	2
Communicatie taken: - Contact met RIVM en andere departementen - Liaison functie NCC - Liaison functie LOTC	3



Huidige situatie: Inhoudelijke crisistaken VWS

Crisistaken VWS beheersing gezondheidsrisico's

	DGCZ	DGLZ	DGV	SG
Maximaal controleren				
Testen				
Vaccins				
Apps				
Persoonlijke beschermingsmiddelen				
Controle strategie				
Traceren				
Protocollen (1,5 meter samenleving)				
Innovatieve behandelingen				
BPM buiten de zorg				
IC capaciteit				
Kwetsbare Personen				
Verpleeghuizen				
Ouderen thuis				
Gehandicaptenzorg				
Bedden capaciteit				

[illegible]

- » Het programma in licht blauw draagt zorg voor **integrale advisering** aan het SGO
- » De ambtelijke coördinatie van de besluitvorming die via de AC Covid-19 naar de MC Covid-19 loopt zal worden verricht vanuit het Directeurenoverleg Covid-19
- » Programmadirectie communicatie eerste schets conform VoRa voorstel - besluitvorming hieromtrent moet nog plaatsvinden



Toekomstige situatie Vws

Terug naar vóór de crisis, maar met hulpstructuren. Deze hulpstructuren hebben de volgende doelen:

1. Verbinden
2. Strategie bepalen
3. Eenduidige communicatie
4. Besluitvorming en parlementair proces coördineren



Toekomstige situatie

Randvoorwaarden en eisen afschaling

- Continuïteit moet zijn gewaarborgd
 - Niet afschalen voordat nieuwe structuur staat
 - Stapsgewijze afschaling
- Verantwoordelijkheden (zo veel mogelijk) terug naar waar ze waren
- DGV houdt coördinerende verantwoordelijkheid COVID-19
- Alleen coördineren wat gecoördineerd moet worden -> zo licht mogelijke structuur
- Snelle respons op nieuwe crisis moet mogelijk zijn
- Streef naar optimaal draagvlak
- Aandacht voor vitaliteit medewerkers moet zijn geborgd



Transitieladder

Uitgangspunt continuïteit: veranderen wat noodzakelijk is en wanneer dat mogelijk is





Voorstel transitie

Onderdelen	Beschrijving	Deadline/ planning
1. Aansluiten op nieuwe interdepartementale overlegstructuur	Concreet betekent dit: DGV gaat mee naar SGO COVID-19, IAO wordt directeurenoverleg. VWS liaison krijgt belangrijke rol bij project 1,5 m samenleving	8 juni 2020
2. Eerste afschaling DCC taken		- Zo snel mogelijk starten - 1 september 2020 rond
3. Tijdelijk programma Covid 19	Programma met programmadirecteur DGV uiteindelijke verantwoordelijkheid (mogelijk aanstellen extra pDGV)	- Zolang noodzakelijk - Rekening houden met einddatum 1 augustus 2021
4. <i>Beleggen Covid taken & activiteiten binnen Vws</i>	Vws organisatie inrichten zodat nieuwe Covid-19 taken kunnen worden uitgevoerd (vraagstukken capaciteit, organisatiestructuren ed)	31 december 2020



1. Aansluiten op nieuwe overlegstructuur

Wat verandert er?

Kwartiermaker aanstellen voor programma Covid-19 bij Vws



2. Voorstel afschalen DCC:

Taken DDC kernteam	Crisissituatie : FTE DCC	Transitiefase: FTE nieuw COVID coördinatieteam	Eind transitiefase: normale situatie
Coördinatie werkzaamheden	1	1	uitfaseren
Secretariële taken: - DCC organisatie crisissituatie VWS (OTCB, MBTCB) - Terugkoppeling interdepartementale overleggen (IAO, ICCB, MCCB)	4	2	uitfaseren
Aansluiting op veiligheidsregio's	2	DCC blijft dit doen. Geen extra fte nodig.	Wet COVID-19
Dagelijkse sitrap (nieuwsbrief)	2	2?	
Communicatie taken: - Contact met RIVM en andere departementen - Liaison functie NCC - Liaison functie LOTC	3	2	uitfaseren



3. Van crisisstructuur naar tijdelijk programma COVID-19

Opdracht kwartiermaker programma:

1. Opzetten programma(directie)
2. Programma gaat Covid 19 activiteiten coördineren.
3. Programma faseert activiteiten steeds meer uit naar de 'normale' lijn
4. Beginnen met afschalen DCC in aanloop naar programma



4. Beleggen COVID-19 taken en activiteiten binnen VWS
