

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Fri 9/25/2020 10:05:56 AM
Subject: RE: "huiswerk" n.a.v. de microplanningsgesprekken van deze week.
Received: Fri 9/25/2020 10:05:58 AM
[microplanning_offertes 2021 v.10 JW JdJ.xlsx](#)

Hoi (10)(2e),

(10)(2e) en ik zijn door de microplanning gegaan en hebben dingen aangepast na alle feedback en overleg met de betrokken PI's. We hebben het zo redelijk kloppend gekregen qua uren. We dachten de IPB's hier later op aan te passen en deze microplanning als uitgang te gebruiken voor de finale IPB's? De projectleiders moeten dan nog kijken of ze hen projectplannen en op te leveren producten aan moeten passen aan de hand van de hen toegekende uren.

Er is 1 brok aan werk die ik even wil aankaarten omdat ik met (10)(2e) heb overlegd dat ze aankomend jaar het ILI corona onderzoek (data analyse en paper schrijven) niet kan doen (300 uren in mindering op project ILI voor haar). Dit stuk ligt er wel en we zouden graag willen kijken wie dit dan wel kan op pakken of dat we het stuk dit jaar gewoon moeten uitstellen (ik heb het nu nergens onder kunnen schrijven). Iets voor in het IMT te bespreken?

buiten verzoek

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: woensdag 23 september 2020 10:25
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: "huiswerk" n.a.v. de microplanningsgesprekken van deze week.

Beste afdelingshoofden,

Bij deze het 'huiswerk' waar we het deze week over gehad hebben. Bij sommige projecten staat al een actienemer omdat dit zo besproken is in de verschillende overleggen. Willen jullie van de projecten die onder je verantwoording vallen, de acties verder oppakken? Indien gewenst met de betreffende projectleider.

Voor de IMM afdeling maak ik nog een uren overzicht op medewerker niveau om zo direct de knelpunten boven tafel te krijgen (deze volgt later vandaag). Ter info stuur ik alvast wel de microplanning mee zoals deze er nu voor staat. Mochten er wijzigingen zijn in de IPB's, willen jullie deze dan via de mail ([deze week!](#)) aan mij doorgeven zodat ik het kan verwerken in de microplanning?

Willen jullie tevens ook nog even naar de offerteteksten kijken die ik afgelopen maandag verstuurd heb? [Deze, inclusief planning, moeten maandag!!! Voor 12.00 uur!! In SAP staan.](#)

Voor alle projecten geldt:

- Stem de uren die gevraagd worden bij andere afdelingen af. Weet zeker dat het aantal uur wat je vraagt voor een bepaalde assay/ werkzaamheden ook goed ingeschat is (m.n. KIM uren lijken soms onderschat).
- De inhoudelijke ambitie is groot, maar gaat dit, met alles wat er allemaal nog meer speelt, wel passen volgend jaar? Bekijk nog even goed naar de inhoudelijke ambitie en houd daarbij de volgende punten in het achterhoofd:
 - 1,5m op het lab.
 - Thuiswerken, tenzij....
 - Verhuizing (dit vraagt veel van de mensen)
 - Aanstelling AIO('s)
 - In relatie tot COVID werkzaamheden

Kijk met bovenstaande punten opnieuw naar de planning, en vraag dan of het realistisch is om de geplande producten ook daadwerkelijk op te kunnen leveren.

V150407 COPS:

- Bacterieel:
 - Wat gaat er gedaan worden door de postdoc? Taken specificeren. En wat doet de AIO (blijft er genoeg over voor de postdoc?). combineren met postdoc op kinkhoest?
 - Wat gaat Intravacc doen voor (10)(2b)? Is dit nog nodig?
- Transleerbare modellen:
 - Zijn de proefdierkosten reëel? Gaat dit allemaal lukken voor 2021 ook i.s.m. COVID transleerbare modellen? Past het allemaal bij de dierverblijven?
 - We hebben twee proeven gepland 2021; Een flu en een corona vaccin proef. En een derde als 'misschien'. Planning voor de twee proeven is zeker realistisch (2-3 proeven per jaar mogelijk) Eerste = (10)(2b) De 'misschien' proef hebben we (10)(2b) voor gereserveerd. Dierverblijf zit nu nog niet vol. Wel is besloten de AIO met een jaar uit te stellen. Deze was als overlap met Koen bedoeld voor techniek transfer. Dit wordt nu gewaarborgd door de corona Postdoc.
- Longterm memory:
 - Uren bij KIM afstemmen met (10)(2e). Wat ga je doen, wat moet er geleverd worden?
- Innate:
 - Wanneer start de postdoc?
 - Stukje (10)(2e) vragen.
 - In relatie tot COVID project... is de planning dan realistisch (10)(2b)ur op beide projecten)

buiten verzoek

buiten verzoek


- Optimalisatie BMR 1-2 vaccinatie:
 - Wat moet er echt en wat is haalbaar gezien de inzet van (10)(2e) op COVID?
 - Is er genoeg ruimte en tijd om de AIO aan te stellen?
 - Als er een mazelen uitbraak komt, hoeveel budget is er dan nodig? (10)(2e) levert deze aan om opgenomen te worden onder platform.

V152103 Vaccinfalen:

- Immfact:
 - Kloppen de KIM uren?
 - COVID tak onder FFX laten vallen (10)(2e)

COVID projecten:

- Tcell immunity wordt onder gebracht onder FFX studie. Van de FFX nog geen planning gezien.
- Project Susana wordt onder gebracht bij Transleerbare modellen. **Klopt**

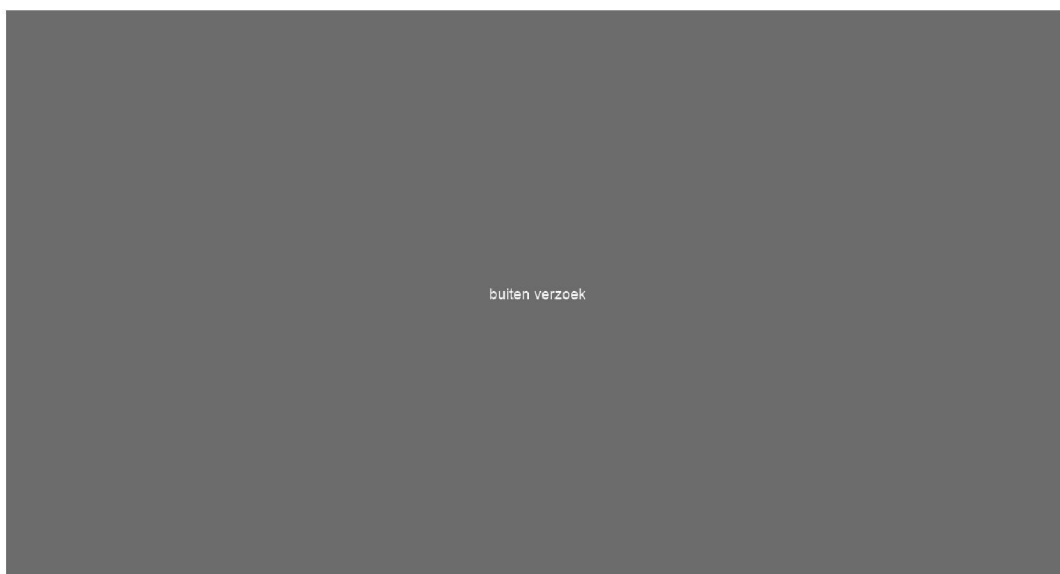

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) g
