

# Update Medicatieoverdracht



Kerngroep IB  
26 januari 2021

5.1.2e

5.1.2e



[samenvoormedicatieoverdracht.nl](http://samenvoormedicatieoverdracht.nl)

## Onderwerpen



- Toelichting
- Inrichting
- Voortgang
- Aandachtspunten

# Programma



## Missie

Het verbeteren van de medicatieveiligheid door afspraken over verantwoordelijkheden, werkprocessen en betere informatievoorziening die het startpunt zijn van voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie.

## Doel

Het implementeren van de herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de bijbehorende set informatie-standaarden: Medicatieproces, Labwaarden tbv medicatie en Contra-indicaties & Overgevoeligheden.

## Scope

10 sectoren

+ 16.000 zorgorganisaties

+ 75 leveranciers

Zorginhoud

Medicatieverificatie/risico-inschatting

Kwetsbare oudere/wettelijk vertegenwoordiger

Toediener/trombosezorg

Digitale overdracht

Medicatieproces

Lab tbv medicatie


CI

Digitaal receptenverkeer


Medicatieoverzicht

Toedienlijst


# 10-Stappenplan Medicatieoverdracht

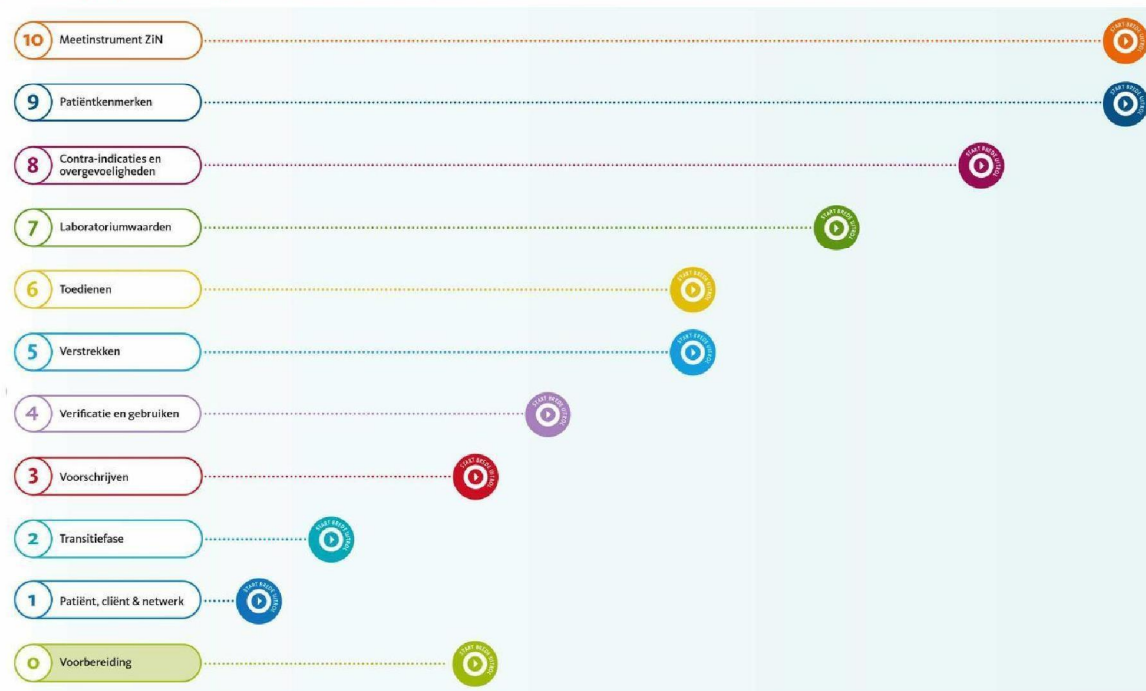


# Samenhang

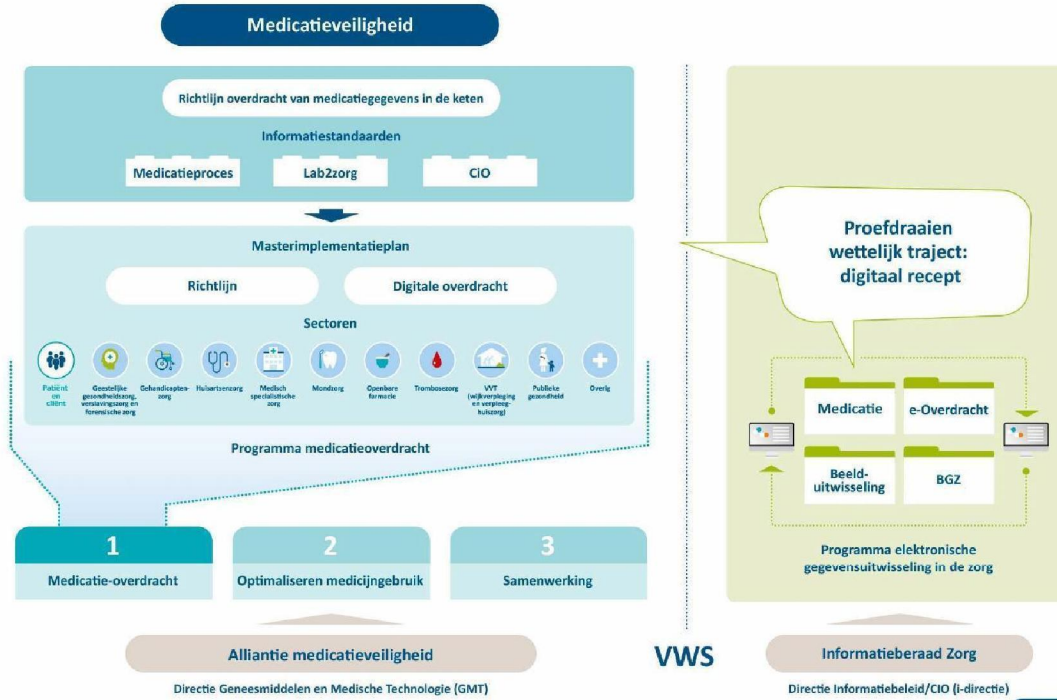

# Governance

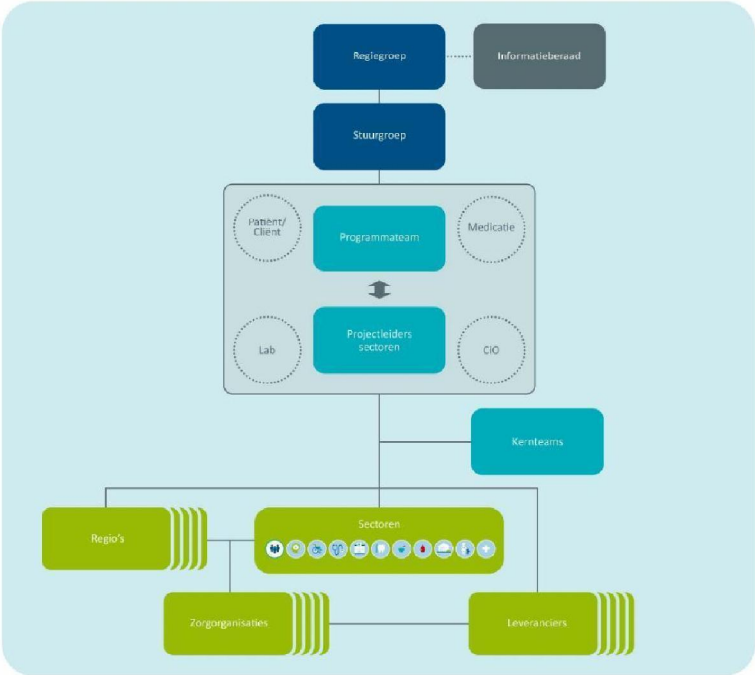


# Landelijke implementatieondersteuning

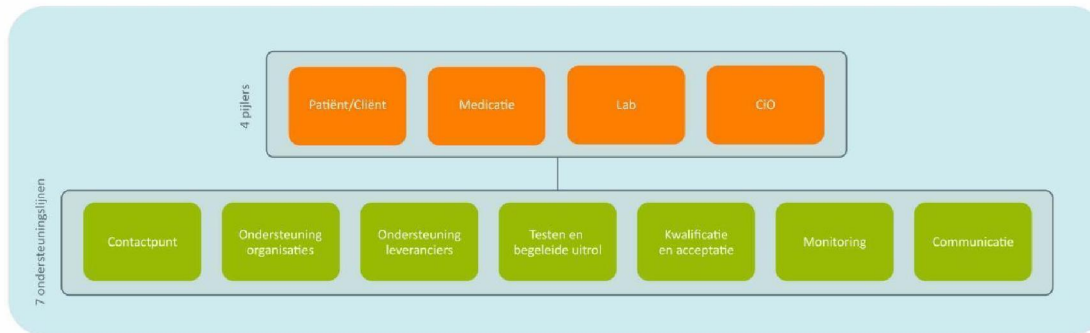

Het programmateam biedt:

- coördinatie
- ondersteuning en
- inbreng expertise

om sectoren, regio's en softwareleveranciers te helpen richtlijn en bijbehorende informatiestandaarden juist en eenduidig te implementeren.



# Kernteams




- Patiënt & cliënt (stap 1 en 9)
- Medicatie (stap 2 t/m 5)
- Toedienen (stap 6)
- Lab (stap 7)
- CiO (stap 8)



Afspraken over beleid,  
verantwoordelijkheden, zorgprocessen,  
transitieperiode, eenheid van taal in  
terminologie en codestelsels

Vorbereidingsgroep  
(selectie sectoren)

Kernteam  
(alle sectoren)

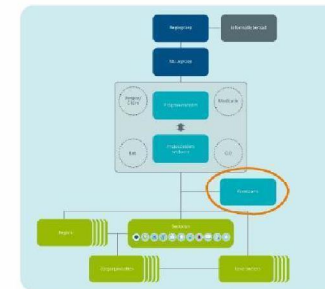



## Algemeen beeld



Het gaat goed met Medicatieoverdracht. Zowel het sector-overstijgende programma als de sectoren zelf maken grote stappen met het inrichten van hun teams, het vormgeven van de onderlinge samenwerking en het uitwerken van eerste resultaten.

De samenwerking tussen VWS, het programmateam en de sectoren verloopt goed. De betrokkenen ervaren het belang, weten elkaar te vinden en zitten welwillend in de wedstrijd. De focus van de activiteiten ligt nu op:

- *kwartiermaken*: inrichten governance, sectorteam, ondersteuningslijnen, programmabeheersing;
- *randvoorwaarden*: uitvoeren BIA's, MKBA Medicatieoverdracht, financiering;
- *inhoud*: kernteams Patiënt & cliënt en Medicatie maken afspraken over verantwoordelijkheden en processen voor richtlijn en informatiestandaarden;
- *doorontwikkeling informatiestandaarden*: toedienkolom binnen Medicatieproces, Labwaarden en Contra-indicaties en Overgevoeligheden;
- *testen van de informatiestandaarden*: praktijktest Amsterdam en inrichten volwaardige praktijktest.

## Voortgang pijlers



Pijler		Opmerking
Patiënt & cliënt		Op schema. Relatie met Mitz vergt aandacht. Beschreven verantwoordelijkheden in de richtlijn worden geconcretiseerd met instemming van alle sectoren.
Medicatie		Op schema. De pijler Medicatie komt nu op het punt dat een aantal gevoelige besluiten uit het kernteam genomen moet worden. Besluitvorming t/m stap 2 stappenplan heeft plaatsgevonden. Voorgenomen besluiten stap 3 worden in februari afgerond.
Laboratoriumwaarden voor medicatieveiligheid		Domein beheer: Op schema. Conceptversie functionele use cases uitgewerkt. Werkgroep richtlijn heeft vertraging door COVID (beperkte beschikbaarheid deelnemers), maar vooralsnog geen risico voor planning stappenplan.
Contra-indicaties & overgevoeligheden		Domein beheer: Werkgroep Proces en Organisatie CiO nog niet opgestart door COVID (beperkte beschikbaarheid deelnemers). Vooralsnog geen risico voor planning stappenplan.

## Voortgang ondersteuningslijnen



Ondersteuningslijn		Opmerking
Contactpunt		Op schema. Plan van aanpak is opgeleverd. Het contactpunt wordt bij VZVZ Servicecentrum ondergebracht en de komende tijd gefaseerd ingericht.
Ondersteuning organisaties		Op schema. Afgelopen maanden met name gefocust op subsidieaanvragen sectoren.
Ondersteuning leveranciers		Op schema. Samen met de sectoren wordt een gezamenlijke leveranciersstrategie vormgegeven. Daarnaast loopt de inrichting van de one-stop-shop.
Testen & begeleiden		Vraagt aandacht. Commitment van leveranciers oa door financiën en prioritering onder druk. Samen met VWS werken aan nieuw plan en afspraken over financiering.
Infrastructuur		Op schema. Gewerkt wordt aan de randvoorwaarden (authenticatie en digitale handtekening) en het mogelijk maken van de uitwisseling.
Monitoring		Op schema. Uitwerken tijdelijk on hold vanwege andere prioriteiten binnen het programma, maar vormt geen risico voor de planning.
Communicatie		Op schema. Focus op afspraken over een gezamenlijke communicatielijn, de ontwikkeling van de website en communicatiemateriaal.

## Kickstart/praktijktest



Om de vernieuwde richtlijn/informatiestandaard Medicatieproces beheerst te kunnen implementeren is, zoals in het programmaplan benoemd, een praktijktest nodig voordat een implementatie bij alle leveranciers/zorgaanbieders plaatsvindt (van tekentafel naar praktijk). Een volwaardige praktijktest vraagt verbouw niet alleen van communicatielaag maar ook database en frontend van het XIS (een grote verbouwing) en een ketentest tussen verschillende sectoren in verschillende regio's. De huidige praktijktest loopt vast op onvoldoende prioritering en financiering bij leveranciers. VWS stelt substantieel geld beschikbaar onder de noemer Kickstart om een volwaardige praktijktest met de benodigde stevigheid te kunnen uitvoeren.

De acties op dit moment zijn:

- opstellen financiële regeling;
- opstellen plan van aanpak praktijktest.

Deze informatie is/wordt gedeeld met sectoren, leveranciers en regio's. Zo snel mogelijk moet de opzet duidelijk zijn zodat men zich kan voorbereiden. Tevens gaat samen met de sectoren gewerkt worden aan een plan om de "volgers" zo snel mogelijk te (kunnen) laten starten.

# Aandachtspunten Medicatieoverdracht



Aandachtspunt/risico	Toelichting	Mitigerende maatregel	Verantwoordelijke
"Afhaken" zorgaanbieders en leveranciers bij uitblijven duidelijkheid over prioritering, planning en financiering (verleggen focus/inzet)	Landelijk spelen vele initiatieven die om aandacht van zorgaanbieders en leveranciers vragen. Focus en helderheid richting deze partijen draagt bij aan de kans van succes voor de implementatie.	Opzet volwaardige praktijktest + zorgdragen voor duidelijkheid z.s.m. + afstemmen communicatie met achterban en leveranciers	VWS, programmateam, sectoren
De impact van Wegiz op dit programma	De wijze waarop Medicatieoverdracht wordt gepositioneerd binnen de Wegiz is van strategisch belang om de juiste beweging bij zorgaanbieders en leveranciers te stimuleren. Het is van belang dat wettelijke kaders de juiste stimulans geven voor de implementatie.	Het volgen, anticiperen en afstemmen met alle stakeholders over impact en (on)mogelijkheden	VWS, programmateam, sectoren
Voldoende capaciteit beschikbaar vanuit de zorg en leveranciers omdat focus op Covid-19 blijft	De pandemie heeft impact op het programma. Met name zorgverleners zijn minder beschikbaar en overige stakeholders (o.a. leveranciers) hebben de focus op Covid-gerelateerde zaken. Hierdoor ontstaat o.a. vertraging bij de werkgroep richtlijn Lab, is de werkgroep Proces en organisatie GIO nog niet opgestart en ligt de praktijktest in Amsterdam vrijwel stil.	Anticiperen op beschikbaarheid + vacatieregeling voor zorgverleners die vervanging moeten regelen	Sectoren, programmateam, VWS
Toestemmingsstructuur Mitz	Patiënten moeten toestemming geven voor het beschikbaar stellen/benaderbaar maken van hun medicatiegegevens via landelijke infrastructuur. Zoals Mitz nu is opgezet, lijkt het alsof patiënten voor alle categorieën toestemming moeten geven om te komen tot een actueel medicatieoverzicht voor zorgverleners. Ook is nog niet elke sector vertegenwoordigd binnen Mitz.	Gezamenlijk onderzoek programma en Mitz	Programmteam



**samen voor  
medicatieoverdracht**
