



Utrecht University
Faculty of Social Sciences
Department of Management Science
Management Science



Planning voorbereiding en realisatie


Inschatting mensen, tijden en activiteiten
korte termijn



25 maart 2021



Landschap vaccinatiebewijs

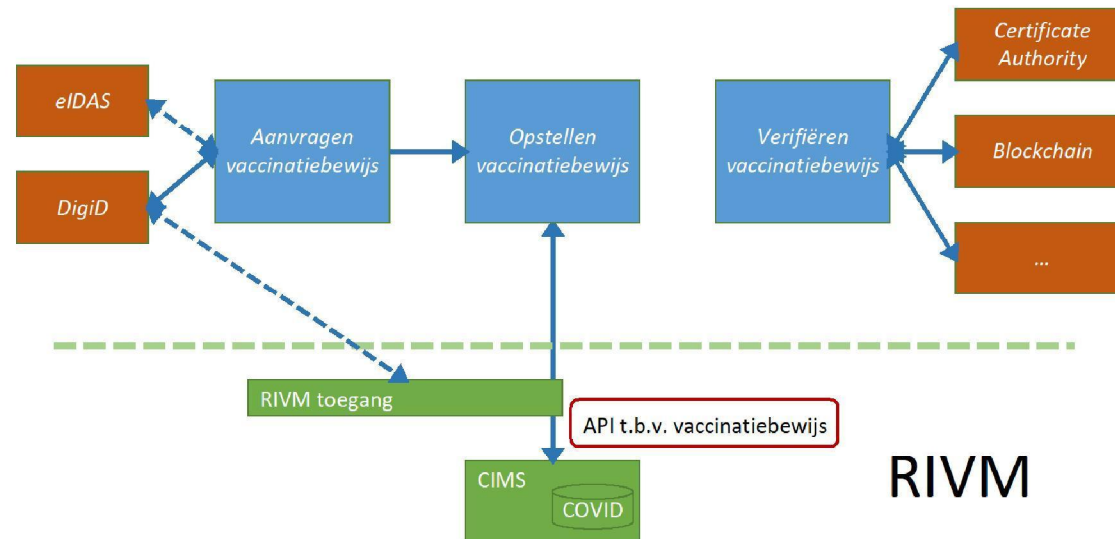



Tijdslijn hele traject

- 11 maart: Start voorbereidingen RIVM
- 24 maart: Start project
- 1 april: Keuze technologische oplossing definitief
- 2 april: Functioneel ontwerp API definitief

- 1 mei: Test
- 15 mei: Technisch live
- 1 juni: Livegang voor publiek




Tijdslijn komende week

- 25 maart: opstellen keuzescenario's
 - 26 maart: eerste workshop kiezen richting
 - 29 maart: uitwerken keuze richting
 - Architectuur en ontwerp
 - Inschatting planning en realisatie
 - 30 maart: tweede workshop valideren keuze richting
 - 31 maart: beschrijven keuze richting in ontwerp
 - PSA
 - PID
 - 1 april: Presentatie oplossing aan CIO's RIVM en VWS
- Parallele activiteiten:
- Ontwerp API
 - DPIA
 - Risicoanalyse IB



Betrokkenen

- Adviseren in keuzescenario's (elk 1 dag tot 1-4)



- Opstellen architectuur en ontwerp (4 dagen tot 1-4)



- Opstellen PID (3 dagen tot 1-4)
 - Deelprojectleider CIMS-programma (Helen?)
 - Technische projectleider IV-organisatie (?)

Parallele activiteiten:

- Ontwerp API (5 dagen)



- Ontwerp integratieservice



- DPIA (?)



- Risicoanalyse IB (?)



- Test





Uitgangspunten

- Agile: waterval werk niet!
- Team met alle benodigde kennis en bevoegdheden aan boord
- Eén document met volledige beschrijving. Geen aparte PSA's project- en IV-organisatie. Ook FO als hoofdstuk van PSA.
