



## **Uitvoeringsplan testen COVID19**

Uitrol van teststrategie

---

## Leeswijzer

---

**Doel Uitvoeringsplan**

Fasering en 3 sporen

Mijlpalen

Governance & dashboard

## Doel Uitvoeringsplan



### Oogmerk en teststrategie

**Oogmerk** is het zoveel en zo zinvol mogelijk testen ten behoeven van:

- 1) Indammen pandemie Covid-19
- 2) Op gang houden economie en samenleving

**De teststrategie** geeft de uitgangspunten voor het inrichten van het testlandschap. Dit gaat op in:

- Welke sporen incl. tijdlijn onderscheiden we?
- Welke doelgroepen willen we op welke manier en met welke prioriteit bedienen?
- Welke (snel)testen zetten we op welke manier in?

**Het Ontwerp Fasering Testen** is eerste versie van de teststrategie. (zie slide 5) Deze wordt verder verfijnd



### Uitvoeringsplan geeft invulling aan teststrategie

**Dit uitvoeringsplan** geeft invulling aan het Ontwerp Fasering Testen door beschrijving van:

- **Fasering en 3 sporen**; toelichting op de fasering van het opschalen en versnellen van testen
- **Mijlpalen**: overzicht van de belangrijkste mijlpalen van de verschillende sporen in 2020
- **Governance**: de structuur en coördinatie tussen de verschillende betrokken bij de uitvoering
- **Dashboard**: toelichting op de data die gebruikt wordt voor monitoring en bijsturing



## Leeswijzer

---

Doel Uitvoeringsplan

**Fasering en 3 sporen**

Mijlpalen

Governance & dashboard

## Ontwerp Fasering Testen

	November 2020	December 2020	Januari 2021	Februari 2021	Maart 2021
<b>Spoor 1</b> <b>Basis Testinfrastructuur</b> Naast huidige PCR testen, ook introduceren LAMP, Antigeen sneltest en ademtest in teststraten voor snelheid en volume	EXTRA naast huidige PCR structuur: • Opschalen huidige testlocaties en labcapaciteit • Behouden voorrang zorg en onderwijspersoneel	EXTRA: • Openen fijnmaziger testlocaties voor sneltesten + PCR • Openen XL locaties	• Verdere ophoging aantal testen		
<b>Testcapaciteit</b>	Circa 70.000	Circa 90.000	Circa 100.000 - 130.000	Nader te bepalen	
<b>Doelgroepen</b>	Mensen met klachten & uitbraken zorginstellingen	Mensen met klachten & uitbraken zorginstellingen + BCO en app	Mensen met klachten & uitbraken zorginstellingen + BCO en app + besluit nemen reizigers en mensen zonder klachten		
<b>Spoor 2</b> <b>Aanvullend testspoor sneltesten door werkgevers zelf</b> Fijnmaziger testen met (antigeen)sneltesten door werkgevers zelf maakt testen toegankelijker	• Voorbereiden testlogistiek, ICT, CoronIT en medische randvoorwaarden • Verdeelsystematiek testen • Eerste werkgevers live	• Uitbreiden aantal werkgevers live	• Uitbreiden aantal werkgevers live		
<b>Testcapaciteit</b>	Voorbereiding	Circa 10.000 - 50.000	50.000 - 100.000	Nader te bepalen	
<b>Doelgroepen</b>	Hier toe behoren ook werkgevers in de zorg, onderwijs, kinderopvang en politie.	Mensen met klachten & uitbraken zorginstellingen	Mensen met klachten & uitbraken zorginstellingen + besluit nemen mensen zonder klachten		
<b>Spoor 3</b> <b>Begeleide thuisafname / thuisstest</b> Burgers kunnen thuis worden getest of zichzelf testen. Daarmee kan men deelnemen aan het sociale verkeer, o.a. toegang evenementen	• Onderzoek sneltest voor begeleide thuisafname / thuisstest	• Validatietest van begeleide thuisafname / thuisstest	• Mogelijk kleinschalige start begeleide thuisafname / thuisstest	• Onderzoeken mogelijkheid tot inzet sneltesten bij toegang tot evenementen, mits testen geschikt zijn	
<b>Testcapaciteit</b>			Pilots, 10.000/dag	Nader te bepalen	
<b>Doelgroepen</b>	Nog niet van toepassing	Nog niet van toepassing	Nader te bepalen		

Bron = Ontwerp fasering testen - bijlage bij kamerbrief stand van zaken COVID-19. Gepubliceerd op 27-10-2020

## Fasering | testcapaciteit vergroten en versnellen door inzet op drie sporen



**Basis testinfrastructuur**

### Doelstelling

- Neerzetten basis infrastructuur en goedwerkende keten om minimaal 100.000 testen per dag te kunnen uitvoeren
- Opschalen van bestaande teststraten en het openen van nieuwe teststraten

5.1.2i

### Inrichting

- 25 kleinere sneltest locaties (inzet PCR en antigeen)
- GGD verkent inzetten wijkgerichte testcapaciteit, waaronder inzet mobiele units.



**Aanvullend testspoor  
sneltesten door werkgevers zelf**

### Doelstelling

- Fijnmaziger en toegankelijke testen door gebruik van sneltesten door werkgevers (met name antigeen)
- In eerste instantie prioritering van werkgevers met een essentiële publieke taak. De ambitie is om het voorrangbeleid zo spoedig mogelijk los te kunnen laten, zodat alle werkgevers die dit willen en kunnen hun personeel kunnen testen

### Inrichting

- Voorwaarden voor werkgevers worden uitgewerkt in LCI-richtlijn (o.a. medische eisen, scholingsvereisten en meldingsplicht)
- Uitvoering door Taskforce
- VWS faciliteert de inkoop van de testen, de werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de infrastructuur en de exploitatie daarvan.



**Begeleide thuisafname/ thuistest**

### Doelstelling

- Het breder beschikbaar stellen van het afnemen en testen thuis
- Onderzoeken mogelijkheden voor inzet bij evenementen

### Inrichting

- Onderzoeken hoe hier invulling aan gegeven kan worden met aandacht voor wettelijke eisen
- Opstarten begeleid thuis testen door daarvoor opgeleide medewerkers

## Leeswijzer

---

Doel Uitvoeringsplan

Fasering en 3 sporen

**Mijlpalen**

Governance & dashboard

## Mijlpalen spoor 1 | basis testinfrastructuur

	Algemeen	Antigeen	LAMP	Adem		
November	wk44	1 Opbouw XL-locaties voor PCR-structuur	2 Afronden validatie antigeentest voor symptomatisch testen	3 Validatie antigeentest voor asymptomatisch testen		
	wk45			4 Validatiestatus LAMP bepalen	5 Inkoopplan LAMP apparatuur en materialen	
	wk46	7 Monitoring XL-locaties gereed	6 Plan van aanpak fijnmazige testlocaties	8 LCI richtlijn antigeen-test	9 Implementatie-plan LAMP	10 Valideren ademtest
	wk47	12 Opening eerste XL-testlocaties	13 Voorbereidingen uitrol fijnmazige testlocaties	16 Start met antigeentesten op 10 XL-locaties	17 Voorbereiding implementatie	11 Inkoopplan ademtest materiaal en apparatuur
wk48	14 Testcapaciteit totaal 60.000 testen					
December	wk49	15 Uitbreiding naar fijnmazige testlocaties voor sneltesten			18 Implementatie-plan ademtest	
	wk50	19 Monitoring fijnmazige locaties gereed				
	wk51	21 Opening eerste fijnmazige testlocaties			22 Voorbereiding implementatie	
	wk52	23 Opening overige fijnmazige testlocaties			24 Implementatie ademtest op XL-locaties met paviljoen	
	wk53	25 Testcapaciteit totaal 90.000 testen				



## Mijlpalen spoor 2 en 3 | Aanvullend testspoor sneltesten door werkgevers zelf & Begeleide thuisafname/ thuistest

Concept

		Spoor 2   Werkgevers		
November	wk44	1 Voorbereiden testlogistiek	2 Voorbereiden ICT en CoronIT	3 Invullen medische randvoorwaarden
	wk45			
	wk46	4 Verdeelsystematiek van testen vaststellen		
	wk47	5 Implementatieplan werkgeversspoor: zorg, kinderopvang, onderwijs en politie		
December	wk48	6 Uitrol eerste testen in werkgeversspoor	7 Monitoring werkgevers-testen gereed	
	wk49	8 Eerste tests in werkgeversspoor live (10.000 – 50.000 testen)		
	wk50	9 Uitbreiden aantal werkgevers	10 Besluit nemen asymptomatisch testen	
	wk51			
	wk52			
	wk53	11 Uitgebreider netwerk werkgeversspoor (50.000 – 100.000 testen)		

		Spoor 3   zelfafname en zelftest
November	wk44	
	wk45	1 Wergroep opgericht
	wk46	
	wk47	
December	wk48	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <b>Nader te bepalen</b> </div>
	wk49	
	wk50	
	wk51	
	wk52	
	wk53	

## Aanvullende mijlpalen | Ter discussie

Mijlpaal	Datum
Eerste XL gaat testen met sneltesten naast swabben (spoor 1)	Week 46
Eerste kleine snelteststraat gaat open met alleen antigeen sneltest aanpak (spoor 1)	Week 46
Doorlooptijd van monsterbewerking in laboratoria plus testuitslag ter plekke is gemiddeld 24 uur geworden (dus daarmee 2x24) (spoor 1)	Onbekend
Eerste Teststraten die voldoen aan de (pre)LCI richtlijn in de zorg gaat open (spoor 2)	Week 49
Idem in een commercieel bedrijf (spoor 2)	Week 49
Validatie van sneltesten onder mensen zonder klachten is gereed (alle sporen). Specifiek antigeen	Week 47
Eerste grote pilot van thuis testen is gestart (spoor 3)	Week 48
Validatie van de ademtest is gereed (alle sporen)	Onbekend
Alle XL locaties zijn gestart/draaiende (spoor 1)	Week 50
Alle extra publieke snelteststraten zijn open en draaiende (spoor 1)	Week 50
Eerste grote robotlocatie van monsterverwerking start pilot met validatie (spoor 1)	Week 1
Test voorraad en labcapaciteit is voldoende ingekocht om de griepgolf 2020/2021 aan te kunnen (alle sporen).	Onbekend

## Leeswijzer

---


Doel Uitvoeringsplan

Fasering en 3 sporen

Mijlpalen

Governance & dashboard

**Proces beleid, besluitvorming en implementatie** | leidraad en courses of action zijn leidend om te komen tot heldere besluitvorming en uitzetten van opdrachten

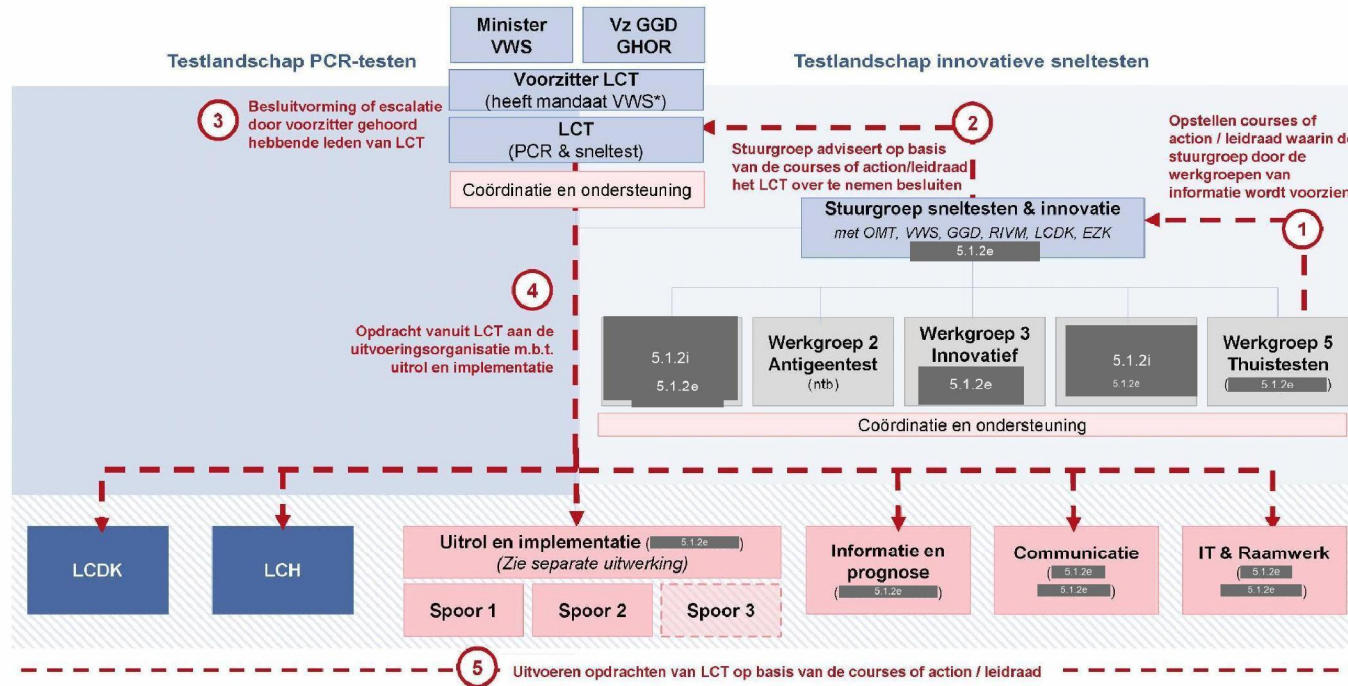

\* Voorzitter LCT heeft beslissingsbevoegdheid, gehoord hebbende alle partijen in LCT. De voorzitter heeft mandaat vanuit VWS, en haalt mandaat bij, EZK en V&J

## Detailuitwerking Uitrol en implementatie | Inzicht in de uitvoering



## Dashboard voor monitoren implementatie | continu meten van criteria voor een succesvolle implementatie en bijsturen waar nodig

Concept



### Bron van informatie

- LCDK
- GGD GHOR
- LCH
- RIVM

Kartrekkers IG&H en VWS



### Inhoud dashboard

- Afgenomen testen, PCR en sneltest
- Afgenomen klinisch, via GGD, VNO-NCW en spoor 2
- Doorlooptijd afspraak-afname-uitslag
- BCO intensiteit, aantal gestart
- Capaciteitsmodel
- Vraagprognose



### Ontvangers dashboard

Informatievoorziening opgezet voor

- Ministerie van VWS
- LCT

Kan ook verder gedeeld worden met betrokken partijen

*Dit dashboard wordt wekelijks verstuurd  
Op langere termijn overwegen of we naar een dagelijks dashboard gaan*



## **Uitvoeringsplan testen COVID19**

Uitrol van teststrategie

---
