

Planning COVID Informatie en Monitoringsysteem (CIMS)

Status: Concept

Datum: 15 jan. 2021



Mijlpalen	2021 week 40
<p>Clientgegevens ingelezen (COA?, Probas?)</p> <p>Stamgegevens gevuld</p> <p>Functionaliteiten CIMS opgeleverd</p> <p>Technische infrastructuur CIMS gereed (OTAP straat) en decharge</p> <p>CIMS in beheer genomen (DVP/BIS)</p> <p>Bronnen vaccinatiedata gekoppeld (GGDGHOR (13/1), BRBA (encrypted; 20/1), HIS (1/2)), Lareb?</p> <p>API's CP design en security design afgerond</p> <p>API's CP onboarding op gateway (TAP)</p> <p>API Gateway hoog beschikbaar A en P</p> <p>RIVMtoegang gekoppeld aan API gateway tbv clientportaal</p> <p>Pentesten en ketentesten uitgevoerd</p> <p>Beheer ingeregeld</p> <p>Ontwerp BRBA af (realisatie BRBA nog te bepalen)</p> <p>API PGO onboarding gereed</p> <p>API Gateway Roadmap bepaald /dienst ingericht</p> <p>API dashboard onboarding gereed</p> <p>Skeleton & ontwikkeling Clientenportaal afgerond</p> <p>Security testen Clientenportaal uitgevoerd (Pentesten en Code review)</p> <p>Usability testen door Ruigrok</p> <p>Performance testen keten API Gateway-CP-CIMS</p> <p>Accessability getest</p> <p>Client portaal Go-Live</p> <p>Specificaties vastgesteld</p> <p>Met EVS-en getest</p> <p>Eventueel vervolg verdere VG's aangesloten</p> <p>VVT's ondersteuning verleend</p> <p>Technische infrastructuur rapportages gereed</p> <p>Dataflow en -structuur gedocumenteerd (incl. pseudonimisering)</p> <p>Accreditatie verkregen</p> <p>Rapportageomgeving livegang</p> <p>Eerste EPI rapport anoniem klaar</p> <p>Definitieve rapporten voorbereid</p> <p>Rapporten doorontwikkeld (beheer)</p>	<p>1e Sprint</p>
<p>Functioneel applicatiebeheer ingericht</p> <p>Technisch applicatiebeheer ingericht</p> <p>Infrastructuur in beheer genomen</p> <p>Datakoppelingen in beheer</p> <p>Documentatie CIMS bijgewerkt</p>	

Opmerkingen:

1) Zorgverlenersportaal

2) CIMS functionaliteiten

3) API Gateway en API's

Dit is exclusief inzage


Live gang is afhankeli

Mogelijk is er een live

Vaccinatieschema's n


Niet alle zorgverlene

Nog te bepalen same

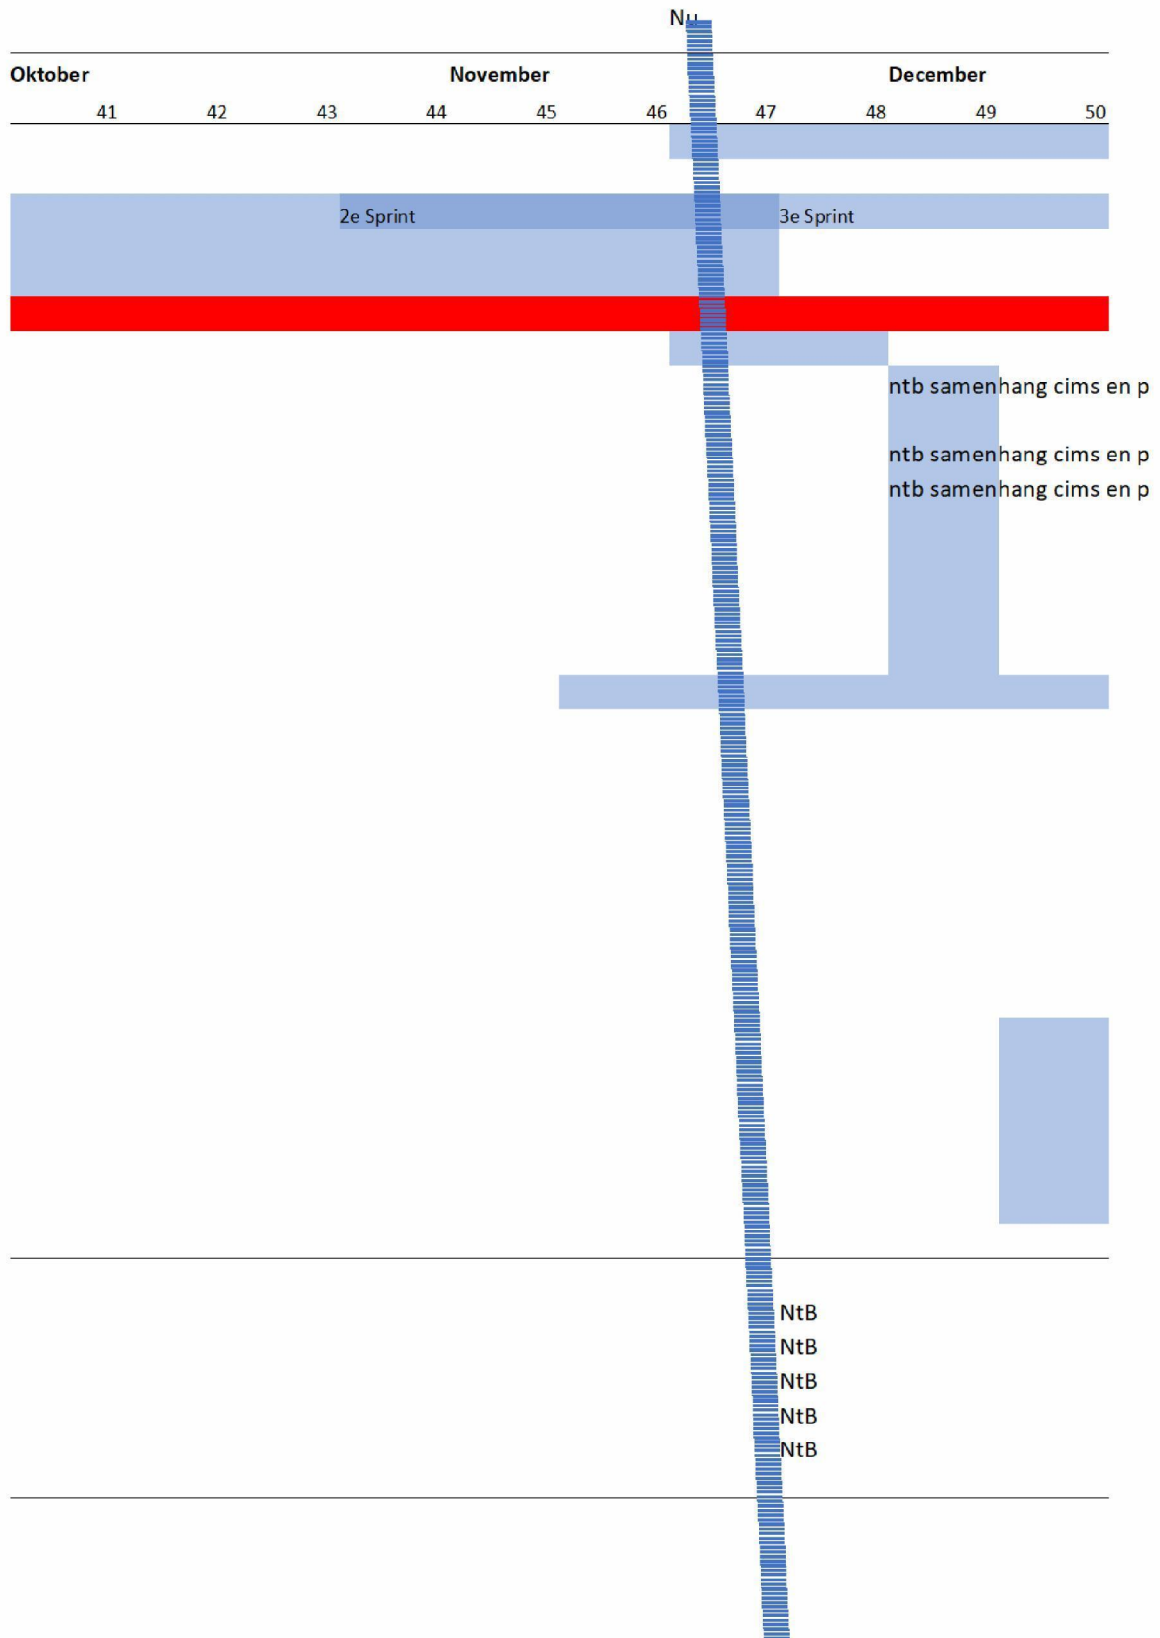

in vaccinaties, dit staat nog ter discussie
jk van live-gang RIVMToegang, zonder die bouwsteen kunnen we niet live
gang zonder volledige stamgegevens
og niet beschikbaar
rs als stamgegevens beschikbaar
nhang CIMS en Portalen



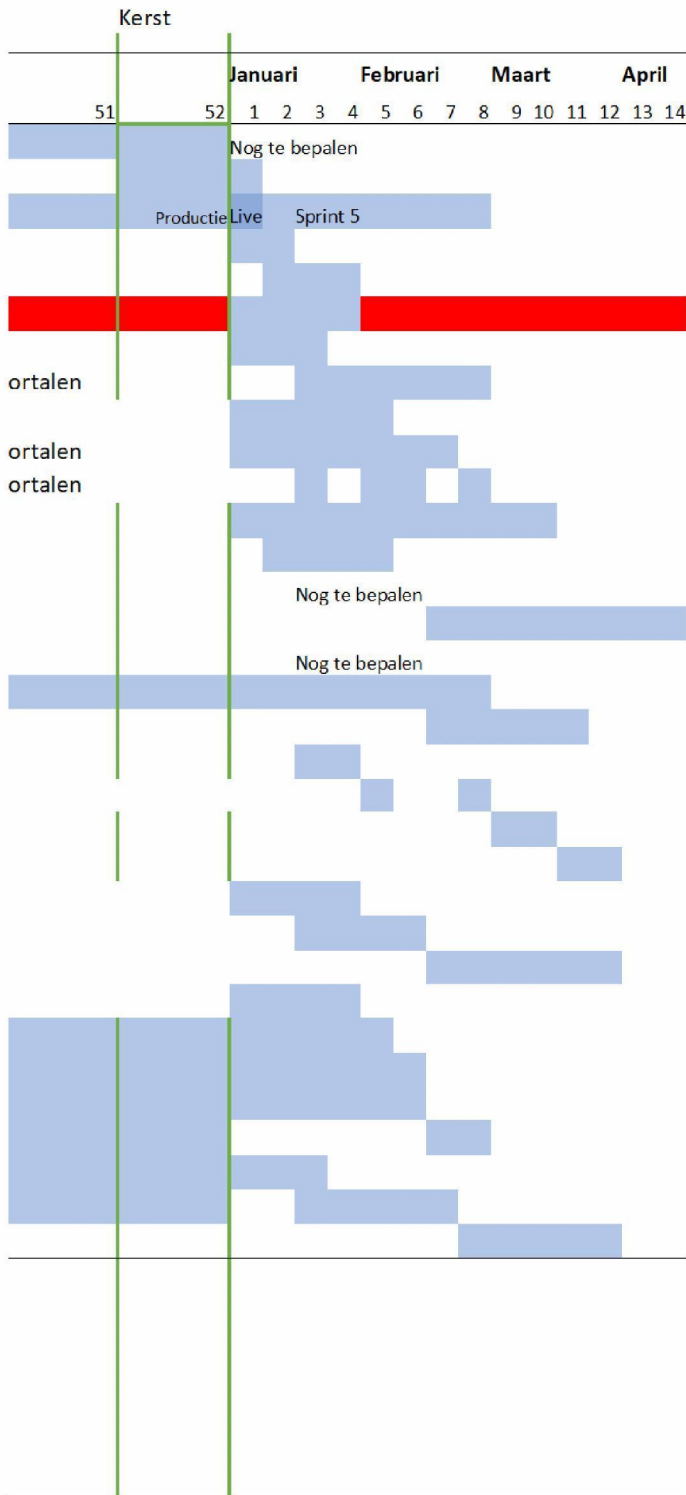

Planning COVID Informatie en Monitoringsysteem (CIMS)

Status: Concept

Datum: 20 jan. 2021

	Mijlpalen en besluitmomenten	2021
		week 40
Functionaliteiten CIMS oplossing	Functionaliteiten (o.a. oproepen) CIMS 2.0 opgeleverd (26 feb)	1e Sprint
	API Gateway hoog beschikbaar A en P	
	API's (CP, BRBA (Ntb), PGO (Ntb), dashboard (Ntb)) onboarding gereed	
	Gehele keten Client portaal Go-Live (22 maart)	
	Rapportageomgeving CIMS BI Go-Live (18 feb)	
Datakoppelingen	Clientgegevens ingelezen (COA?)	
	Clientgegevens ingelezen (Probas?)	
	Bronnen vaccinatiedata GGDGHOR gekoppeld (13/1)	
	Bronnen vaccinatiedata BRBA gekoppeld (encrypted; 20/1)	
	Bronnen vaccinatiedata HIS gekoppeld (1/2)	
	Bronnen vaccinatiedata Lareb gekoppeld (?)	
	Bronnen vaccinatiedata VVT's (HIS/EPD,EVS) gekoppeld	
	Bronnen vaccinatiedata VG 's (EVS) gekoppeld	
	Bronnen vaccinatiedata ziekenhuizen (Chipsoft)	
	PGO aangesloten	
Berichtenbox aangesloten		
IB en P risicoanalyses	CIMS release 2.0 uitgevoerd	
	API Gateway en API's	
	Clientportaal uitgevoerd	
	CIMS BI uitgevoerd	
	Per datakoppeling uitgevoerd	
Beheer	CIMS in beheer genomen (DVP/BIS)	
	Beheer API ingeregeld	
	API Gateway Roadmap bepaald /dienst ingericht	
	Clientportaal in beheer genomen	
	Rapporten doorontwikkeld (beheer)	
	Datakoppelingen in beheer genomen	
	BRBA in beheer genomen	

