

## Rapporteren voortgang – 8 dec| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

| Werkgroep                                             | Toelichting op status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Activiteiten afgelopen week                                                                                                                                                                                                                                                                             | Activiteiten komende week                                                                                                                                                                                                                            | Huidige status                        | Vorige status                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Werkgroep Antigeen</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Validatie bij contacten BCO/coronamelder nog niet gestart. Identificatie van juiste doelgroep in teststraat blijkt lastig. Nieuwe doel is vrijdag beginnen.</li> <li>Validatie van antigeentesten uit nieuwe consultatieronde loopt.</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Verpleeghuisstudie, eerstelijns spoedzorg studie, wijkstudie &amp; BCO-coronamelder dag 5 studie worden voortgezet</li> <li>Antigeentesten uit nieuwe consultatieronde worden gevalideerd</li> </ol>                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>Validatie BCO/coronamelder gaat van start.</li> <li>Wijkstudie, eerstelijns spoedzorg studie, verpleeghuis studie worden voortgezet.</li> <li>Validatie van nieuwe antigeentesten wordt voortgezet</li> </ol> | <span style="color: orange;">●</span> | <span style="color: green;">●</span>  |
| <b>Werkgroep LAMP</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Op dit moment is LAMP-uitrol in de opstartfase: <ul style="list-style-type: none"> <li>De eerst analysestraat is geplaatst op RAI en wordt getest</li> <li>Definitieve LAMP-pakket is bepaald en wordt gevalideerd</li> <li>Partijen maken afspraken over inkoop voor Amsterdam</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Opstartfase LAMP: bepalen hoe definitieve pakket er uit ziet, oplossen kinderziekten en deal inkoop maken</li> </ol>                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>Afronden opstartfase LAMP</li> <li>Voorbereiden bredere uitrol van LAMP</li> <li>Inzetten LAMP-testen in teststraat (<i>'tube transfer'-gedeelte</i> handmatig i.p.v. met robot)</li> </ol>                   | <span style="color: orange;">●</span> | <span style="color: orange;">●</span> |
| <b>Werkgroep STRIP</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>STRIP pilot loopt. Robot 18 december beschikbaar voor validatiepilot fasen 2-4, eind januari productiepilot met GGD Brabant Zuidoost launch robot 1.</li> <li>STRIP scale-up nota Minister beslispunten 1) aantal robots en 2) aanbesteding.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memo criteria robotlocaties (ter vaststelling)</li> <li>Memo TOMi (ter vaststelling)</li> <li>Robot 1 gearriveerd bij PAMM</li> <li>Nota minister met beslispunten scale-up</li> </ol>                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Cross contamination oplossen</li> <li>Criteria robotlocaties naar Dienst Testen</li> <li>TOMi expertgroep instellen</li> <li>Opname STRIP in teststromen in gang zetten</li> </ol>                            | <span style="color: orange;">●</span> | <span style="color: orange;">●</span> |
| <b>Werkgroep Innovatieve testen (incl. Spironose)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Expertgroep beoordeelt ademtest geschikt voor inzet bij symptomen, OMT-bespreking 12/12</li> <li>Andere randvoorwaarde inzet is verkrijgen van een CE-markering voor ademtest, hiervoor is versneld traject ingezet</li> <li>Werkgroep heeft een afwegingskader opgesteld om te beoordelen welke nieuwe testen, (1) ondersteund kunnen worden door de werkgroep (2) geschikt zijn voor bredere inzet (bijlage)</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Afwegingskader met criteria voor innovatieve testen opgesteld met expertgroep</li> <li>Voorbereiding OMT</li> <li>Versnelde aanvraag CE-markering ademtest</li> </ol>                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Verkrijgen OMT-advies ademtest</li> <li>Verkrijgen CE-markering ademtest</li> <li>Voorbereiden uitrol ademtest</li> </ol>                                                                                     | <span style="color: green;">●</span>  | <span style="color: green;">●</span>  |
| <b>Werkgroep Thuis testen</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Validatie zelftesten wordt voorbereid</li> <li>Studie kwalitatieve afname begint 10 december</li> <li>Juridische vraagstukken liggen bij VJZ/GMT, worden uitgezocht</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Validatie zelftesten wordt voorbereid en studie kwalitatieve problemen bij afname wordt voorbereid.</li> <li>Juridische hobbels worden verkend</li> <li>Toenadering tot spoor 2 gezocht, mogelijkheden tot begeleide afname bij pilots worden verkend</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Validatie zelftesten wordt verder uitgewerkt. Opname instructievideo's wordt gepland</li> <li>Kwalitatieve studie naar afname gaat van start</li> </ol>                                                       | <span style="color: green;">●</span>  | <span style="color: green;">●</span>  |

## Rapporteren voortgang – 8 dec | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

| Werkgroep                      | Toelichting op status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Activiteiten afgelopen week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Activiteiten komende week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Huidige status                        | Vorige status                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Uitrol en implementatie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanaf vorige week zijn locaties Eindhoven (1-12), Schiphol (1-12) en Zwolle (4-12) open. Locatie Groningen officieel overgedragen aan lokale GGD. Overige locaties op schema voor opening week 51 en 52.</li> <li>Toolkit / Blauwdruk is in concept gereed. Ligt voor commentaar bij GGD en IGJ.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tijdslijn opstellen voor levering LAMP-robots en Breathomix apparatuur</li> <li>Defensiepersoneel wordt stapsgewijs afgebouwd</li> <li>Voorzetting en continuïteit van Operatie Fastlane na opening XL-locaties. Deels overdragen aan de GGD, deels behouden en invullen in de stichting</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Afronden Toolkit voor antigeenproces voor GGD fase 2</li> <li>Voorleggen toolkit aan de IGJ</li> <li>Start met afbouwen van Operatie Fastlane in Spoor 1. Bezig met overdracht van contracten, concepten naar GGDGHOR. Bijdrage aan spoor 1 eindigt eind 2020.</li> <li>Doorstart van Operatie Fastlane naar spoor 2</li> </ol> | <span style="color: green;">●</span>  | <span style="color: orange;">●</span> |
| <b>Informatie en prognose</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soepele update van cockpit</li> <li>Geen voortgang op aansluiting bronnen, doorlooptijden en cijfers antigeen</li> <li>Toegang tot extra informatie over o.a. BCO/coronamelder komt niet van de grond</li> </ul>                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Afgerond reizigers, LCT akkoord (met voorwaarden)</li> <li>E-nose toegevoegd in cockpit</li> </ol>                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Analyse impact coronamelder/BCO</li> <li>Analyse zorg/onderwijs in prio</li> <li>Datatoegang coronIT</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                 | <span style="color: orange;">●</span> | <span style="color: orange;">●</span> |
| <b>Communicatie</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Communicatie rond verbreding testdoelgroepen (1/12) lopend</li> <li>Communicatiewerkgroepen proefprojecten gestart</li> <li>Mijlpalen - communicatie korte termijn vastgesteld</li> <li>Triage middellange termijn: communicatie i.o.m. GGD</li> </ul>                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Proefprojecten: communicatie vastgesteld</li> <li>Mijlpalen uitgewerkt voor periode tot februari 2012</li> </ol>                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Uitwerking mijlpalen - communicatie: ademtest, STRIP, laatste fase XL</li> <li>Uitvoering publiciteit korte termijn met MVWS</li> <li>Communicatiewerkgroep Rotterdam-Zuid</li> <li>Rapportage IT audit</li> </ol>                                                                                                              | <span style="color: green;">●</span>  | <span style="color: green;">●</span>  |

| GGD regio          | Locatie                                 | Type locatie | Livegang                                  | Aantal tests PCR  | Aantal sneltesten | Huidige status | Toelichting status                                                                                                                                                                                                                                                                | Activiteiten komende week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groningen          | Martiniplaza<br>5.1.2e 5.1.2e           | Indoor       | 09-nov                                    | 800               | 2469              |                | Martiniplaza heeft als proeftuin gediend. Hierdoor zijn veel zaken aan het licht gekomen, zoals een bug in Coron IT en opgelost. GGD Groningen gaat nu de huidige bezetting overnemen van landelijk naar regionaal.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Huidige bezetting Martiniplaza is slechts opgeleid om 1 taak uit te voeren. Hierdoor is de bezetting niet opgeleid volgens de standaard GGD Groningen waar alle mensen elkaar kunnen vervangen.</li> <li>Komende periode nieuwe sollicitatie gesprekken voeren en opleiden medewerkers om diverse taken uit te kunnen voeren om de onderlinge vervangbaarheid te vergroten</li> </ul> |
| Amsterdam          | Zuidoost<br>5.1.2e                      | Paviljoen L  | LAMP<br>14-dec                            | AL in GGD roadmap | Week 1:<br>3000   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Validatie van blaastesten</li> <li>Vorbereiding voor de feestdagen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Amsterdam          | RAI<br>5.1.2e                           | Indoor       | LAMP<br>7-dec                             | AL in GGD roadmap | Week 1:<br>5050   |                | Vandaag gestart met LAMP (handmatig).                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Validatie van blaastesten</li> <li>Vorbereiding voor de feestdagen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Amsterdam          | Sloterdijk<br>5.1.2e                    | Paviljoen XL | LAMP<br>18-jan                            | AL in GGD roadmap | Week 1:<br>3000   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Validatie van blaastesten</li> <li>Vorbereiding voor de feestdagen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Amsterdam          | Noord<br>5.1.2e                         | Paviljoen L  | LAMP<br>16 dec                            | AL in GGD roadmap | Week 1:<br>3000   |                | Komende donderdag start met LAMP, locatie staat al                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Validatie van blaastesten</li> <li>Vorbereiding voor de feestdagen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kennemerland       | Schiphol<br>5.1.2e                      | Paviljoen XL | 01-dec                                    | 1.100             | 2899              |                | Locatie is open sinds vorige week, aanloop is laag (200 mensen per dag). Aantal kinderziektes                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draaiboek optimaliseren</li> <li>Werkprocessen gedurende operatie verder optimaliseren en verbeteren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kennemerland       | Expo Vijfhuizen<br>5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | Indoor       | 21-dec                                    | AL in GGD roadmap | 2500              |                | Aantal straten aan het bijschakelen voor antigeen.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Utrecht            | Jaarbeurs<br>5.1.2e                     | Paviljoen XL | 16-11-2020 (PCR)<br>23-11-2020 (Antigeen) | 1300              | 3905              |                | Zien aantallen wat toenemen. Gister voor het eerst 1200 antigeen, ruimte om op te schalen. Paviljoen A antigeen gemaakt, Paviljoen B PCR.                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Overdracht afronden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Haaglanden         | Broodfabriek<br>5.1.2e                  | Indoor       | 11-nov                                    | 600               | 2400              |                | Er worden alleen antigeen testen afgenomen. Momenteel in gesprek om te kijken wat er nog dient te gebeuren rond overname locatieverantwoordelijkheid door de GGD. Stresstest locatie en luchtkwaliteitsmeting nog niet afgerond. Locatie is halve dagen geopend, nog vrij rustig. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inplannen verificatie proces PCR met Lab RdG</li> <li>Verdere afstemming overdracht locatie en huurcontract</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rotterdam Rijnmond | RTH Airport<br>5.1.2e                   | Paviljoen XL | 23-11-2020 (PCR)<br>30-11-2020 (Antigeen) | 2600              | Roche<br>7578     |                | RTHA is 23 november open voor PCR en voor Antigeen op 30 november. Er zijn nu nog erg weinig bezoekers, neemt wel iets toe.                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leren &amp; verbeteren</li> <li>Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR &amp; sneltesten</li> <li>Inrichten 2e laboratorium (lab wordt 21 december geleverd, nog bepalen waar deze wordt geplaatst)</li> </ul>                                                                                                                                        |

| GGD regio            | Locatie                       | Type locatie      | Livegang | Aantal tests PCR | Aantal sneltesten | Huidige status | Toelichting status                                                                                                                                                                                    | Activiteiten komende week                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotterdam<br>Rijmond | Ahoy<br>5.1.2e                | Paviljoen XL      | 21-dec   | 1400             | Roche<br>4245     |                | Start bouw paviljoen woensdag 25 november. Verwachte opening met PCR naar verwachting in week 52. Idealiter met een lab ook voor Antigeen (2e lab wordt week later geleverd)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR &amp; sneltesten</li> <li>Inrichten IT (paviljoen en lab)</li> </ul>                                                                            |
| Brabant<br>Zuidoost  | Anton Coolenlaan<br>5.1.2e    | Outdoor           | 01-dec   | 1100             | 3196              |                | Vorige week open gegaan, deze week meer bezoekers, door bug in CoronIT was aanloop laag.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rollen specifiek maken zoals regionale GGD</li> <li>Overdracht vormgeven</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Gelderland           | P&R Lent<br>5.1.2e            | Paviljoen L       | 14-dec   | 1100             | 3309              |                | GGD Gelderland-Zuid neemt de medische eindverantwoordelijkheid op zich. ACBN is opdrachtnemer facilitair. Opening teststraat: 14 dec. met 4 antigeen-straten.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definitieve opdrachtverstrekking GGD</li> <li>Afstemming GGD Inkoop, ICT, Medisch sup.</li> <li>Briefing personeel</li> <li>Dry-run (do. 11 en vr. 12 dec.) en openen locatie</li> </ul>                                |
| Zwolle               | IJsselhallen<br>5.1.2e        | Indoor            | 04-dec   | 600              | 1855              |                | 4 december was de officiële opening, goede eerste dagen gehad. Overdracht organiseren. Nog geen lokaal lab gekoppeld. Gestart met Antigeen, toch veel zorgmedewerkers uit triage! Toename testvolume. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afspraak Trilat, LCDK, LMIMI, GGD regelen</li> <li>Overdracht naar regionale kwaliteitscontroles door Supervisor lab en DIP-er GGD</li> <li>Werven en onboarden gaat door</li> </ul>                                    |
| Zuid Limburg         | MECC<br>5.1.2e                | Paviljoen         | 15-dec   | 900              | 2673              |                | Loopt op schema voor opening per 15 december                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opleveren bouw &amp; inrichten locatie</li> <li>Opleiding personeel</li> <li>Bestellen materialen</li> </ul>                                                                                                            |
| Twente               | NTB<br>5.1.2e                 | Indoor            | 21-dec   | 600              | 1864              |                | Locatie gevonden. Vraag rondom medische eindverantwoordelijkheid van het laboratorium.                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Werkbezoek L-locatie Zwolle</li> <li>Afstemming laboratorium en bezien werkprocessen</li> <li>Locatie: plattegrond, vergunning</li> </ul>                                                                               |
| West Brabant         | Meerdere locaties<br>5.1.2e   | Meerdere locaties | 15-dec   | 900              | 3379              |                | Koppeling met landelijk team. Onderzoeken ook nog andere antigeentest.                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definitief akkoord voor locaties en testen</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Friesland            | WTC Saxenhal<br>5.1.2e 5.1.2e | Indoor            | 15-dec   | 425              | 1275              |                | Locatie wordt ingericht. Personeel opgeleid. Definitieve keuze voor locatie gemaakt.                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personeel opleiden</li> <li>Voorbereiden proefdraaien a.s. vrijdag 11/12</li> <li>Afstemmen CoronIT</li> <li>Capaciteitsplanning &gt; 2 weken berekenen</li> </ul>                                                      |
| Drenthe              | TT Circuit Assen<br>5.1.2e    | Klein Paviljoen   | 21-dec   | 275              | 824               |                | Er ligt een voorgenomen besluit voor de locatie en de inrichtingsvariant. Vanaf 7-12 worden inhoudelijk de processen en ondersteunende middelen uitgewerkt.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Locatiebezoek voorgenomen locatie</li> <li>Scholings- en bezettingsplan opstellen</li> <li>Procesinrichting bepalen</li> <li>Reg. lab aanhaken, bepalen verantwoordelijkheid</li> </ul>                                 |
| Zeeland              | Zeelandhallen<br>5.1.2e       | Indoor            | 15-dec   | 324              | 971               |                | Planning lijkt op schema                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opbouwen locatie (va. do 10-12 en vrij)</li> <li>IT-mogelijkheden bespreken</li> <li>Locatiecoördinator aannemen</li> <li>Contract tekenen Zeelandhallen</li> <li>Verkeersrouteplanning, borden bij gemeente</li> </ul> |





## Monitoring uitrol XL-teststraten

Week 50

---


# 1. Martiniplaza Groningen

Projectleider: 5.1.2e 06 5.1.2e


## Testlocatie

- Indoor locatie
- Hal van Martiniplaza
- Volgens concept VNO-NCW
- Openingstijden: 9.00-17.00 uur

| Type testen | vanaf    | # testen / dag                 |
|-------------|----------|--------------------------------|
| PCR         | Geen PCR | 0                              |
| Antigeen    | 9 nov    | Staat open voor 750, komen 600 |

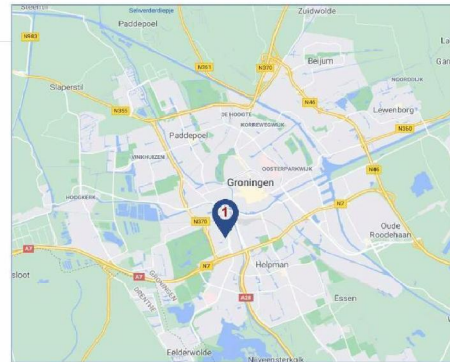

## Aantal testen verwacht vs. actueel

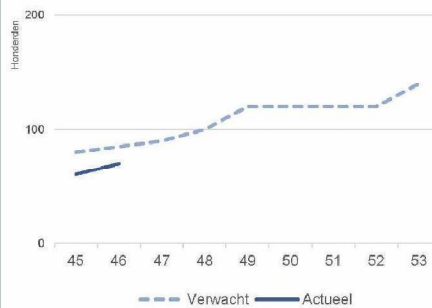

## Activiteiten afgelopen week

- Vanaf 1 december is GGD Groningen verantwoordelijk voor Martiniplaza en gaat de huidige contracten waar mogelijk overnemen van landelijk. Contacten zijn hierover belegd.

## Activiteiten komende week

- Huidige bezetting Martiniplaza is slechts opgeleid om 1 taak uit te voeren. Hierdoor is de bezetting niet opgeleid volgens de standaard GGD Groningen waar alle mensen elkaar kunnen vervangen. Komende periode worden er nieuwe sollicitatie gesprekken gevoerd en worden de medewerkers opgeleid om diverse taken uit te kunnen voeren om de onderlinge vervangbaarheid te vergroten.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

## Status XL-locatie Martiniplaza

Martiniplaza heeft als proeftuin gediend. Hierdoor zijn veel zaken aan het licht gekomen, zoals een bug in CoronIT en opgelost. GGD Groningen gaat nu de huidige bezetting overnemen van landelijk naar regionaal.

| ✓ | Onderwerp                                           | Progress |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Contact met DPG                                     | ●        |
|   | Driehoek DPG – LAB - OB                             | ●        |
|   | Vergunningen en contracten                          | ●        |
|   | Materieel en inrichting                             | ●        |
|   | Personeel                                           | ●        |
|   | Opleiding personeel                                 | ●        |
|   | Koppeling CoronIT                                   | ●        |
|   | Infrastructuur                                      | ●        |
|   | Apparatuur                                          | ●        |
|   | Afnamemateriaal                                     | ●        |
|   | Reagentia / testen                                  | ●        |
|   | PBM                                                 | ●        |
|   | Verkeersstromen                                     | ●        |
|   | Labs op locatie                                     | ●        |
|   | Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | ●        |
|   | Procesbeschrijvingen                                | ●        |
|   | Capaciteitsplanning en forecast                     | ●        |
|   | Waarborging privacy                                 | ●        |


## 6. Luchthaven Schiphol

Projectleider: 5.1.2e

### Testlocatie

- P4
- Volgens concept Amsterdams paviljoen (XL)
- Openingstijden: 08.00 – 18.00 uur (eerste twee dagen: 10.00 – 17.00 uur)

| Test       | vanaf  | # testen / dag |
|------------|--------|----------------|
| PCR        | 1 dec. | 1.000          |
| Antigeen   | 1 dec. | 1.000          |
| LAMP       | N.n.b. | N.n.b.         |
| Breathomix | N.n.b. | N.n.b.         |

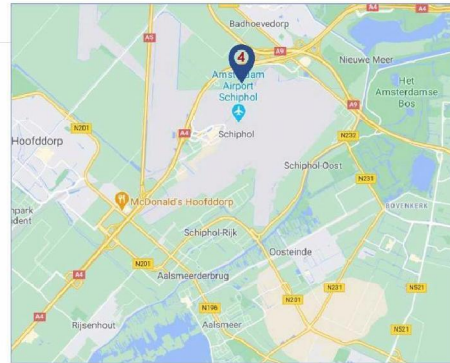


### Status XL-locatie Schiphol

**Toelichting op status algemeen:** Locatie Schiphol is akkoord vanuit alle betrokken partijen. Vergunningsvraag is ingediend, bouw is afgelopen weekend gestart.

| ✓ | Onderwerp                                           | Progress |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Contact met DPG                                     | ●        |
|   | Driehoek DPG – LAB - OB                             | ●        |
|   | Vergunningen en contracten                          | ●        |
|   | Materieel en inrichting                             | ●        |
|   | Personeel                                           | ●        |
|   | Opleiding                                           | ●        |
|   | Koppeling CoronIT                                   | ●        |
|   | Infrastructuur                                      | ●        |
|   | Apparatuur                                          | ●        |
|   | Afnamemateriaal                                     | ●        |
|   | Reagentia / testen                                  | ●        |
|   | PBM                                                 | ●        |
|   | Verkeersstromen                                     | ●        |
|   | Labs op locatie                                     | ●        |
|   | Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | ●        |
|   | Procesbeschrijvingen                                | ●        |
|   | Capaciteitsplanning en forecast                     | ●        |
|   | Waarborging privacy                                 | ●        |

### Aantal testen verwacht vs. actueel

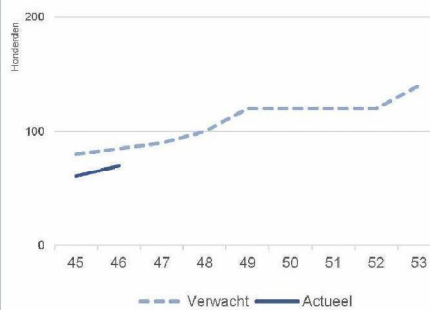

VOORBEELD

### Activiteiten afgelopen week

1. Afronding bouw
2. Personeel inzet/planning
3. Bestellingen testen en materialen
4. Facilitaire zaken geregeld

### Activiteiten komende week

1. Opening
2. Draaiboek optimaliseren
3. Werkprocessen gedurende operatie verder optimaliseren en verbeteren

● Op koers    ● Issues, in control    ● Issues, interventie nodig

## 9. Broodfabriek Haaglanden

Projectleider: 5.1.2e


### Testlocatie

- Indoor locatie
- Hal van Broodfabriek
- Openingstijden:

| Type testen | vanaf | # testen / dag |
|-------------|-------|----------------|
| Antigeen    | 9/11  | <2500          |
|             |       |                |
|             |       |                |



### Aantal testen verwacht vs. actueel

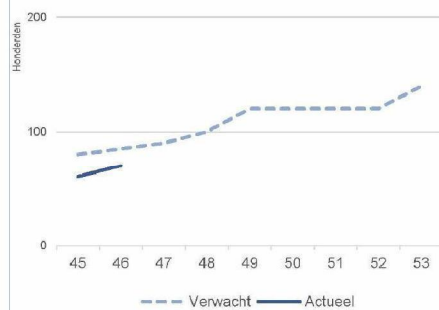

VOORBEELD

### Activiteiten afgelopen week

- 1.
- 2.
- 3.

### Activiteiten komende week

1. inplannen verificatie proces PCR met Lab RdG
2. Verdere afstemming overdracht locatie en huurcontract
- 3.

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

### Status XL-locatie Haaglanden

Toelichting op status algemeen: er worden alleen antigeen testen afgenomen. Momenteel in gesprek om te kijken wat er nog dient te gebeuren rond overname locatieverantwoordelijkheid door de GGD. Stresstest locatie en luchtkwaliteitsmeting nog niet afgerond. Locatie is halve dagen geopend, nog vrij rustig.

| ✓ | Onderwerp                                           | Progress |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Contact met DPG                                     | ●        |
|   | Driehoek DPG – LAB - OB                             | ●        |
|   | Vergunningen en contracten                          | ●        |
|   | Materieel en inrichting                             | ●        |
|   | Personeel                                           | ●        |
|   | Opleiding personeel                                 | ●        |
|   | Koppeling CoronIT                                   | ●        |
|   | Infrastructuur                                      | ●        |
|   | Apparatuur                                          | ●        |
|   | Afnamemateriaal                                     | ●        |
|   | Reagentia / testen                                  | ●        |
|   | PBM                                                 | ●        |
|   | Verkeersstromen                                     | ●        |
|   | Labs op locatie                                     | ●        |
|   | Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | ●        |
|   | Procesbeschrijvingen                                | ●        |
|   | Capaciteitsplanning en forecast                     | ●        |
|   | Waarborging privacy                                 | ●        |



## 7. RTHA


Datum: 7 december 2020

Aanspreekpunt: 5.1.2e

### Testlocatie

- Parkeerterrein
- Concept: paviljoen met sneltesten
- Openingstijden: 8:30 – 16:00

| Test       | vanaf    | # testen / dag  |
|------------|----------|-----------------|
| PCR        | ~ 23 nov | ~1.000 – 2.600  |
| Antigene   | ~ 30 nov | ~1.000 – n.t.b. |
| LAMP       | Dec      | N.t.b.          |
| Breathomix | Dec      | N.t.b.          |

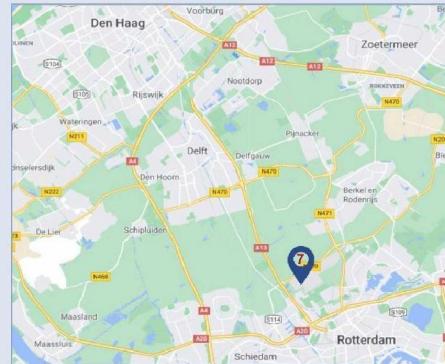

### Activiteiten afgelopen week


1. Opening paviljoen voor PCR & Antigene
2. Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten

### Activiteiten komende week

1. Leren & verbeteren
2. Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten
3. Inrichten 2<sup>e</sup> laboratorium (lab wordt 21 december geleverd, nog bepalen waar deze wordt geplaatst)

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

### Aantal testen verwacht vs. actueel

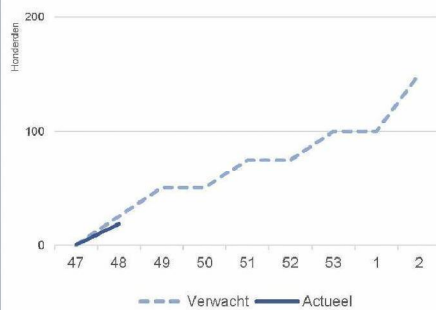

### Status XL-locatie RTH Airport

RTHA is 23 november open voor PCR en voor Antigene op 30 november. Er zijn nu nog erg weinig klanten

| ✓ Onderwerp                             | PCR/LAMP | Antigene |
|-----------------------------------------|----------|----------|
| Contact met DPG                         | ●        | ●        |
| Driehoek DPG – LAB - OB                 | ●        | ●        |
| Vergunningen en contracten              | ●        | ●        |
| Materieel en inrichting                 | ●        | ●        |
| Personeel                               | ●        | ●        |
| Opleiding                               | ●        | ●        |
| Koppeling CoronIT                       | ●        | ●        |
| Infrastructuur                          | ●        | ●        |
| Apparatuur                              | ●        | ●        |
| Afnamemateriaal                         | ●        | ●        |
| Reagentia / testen                      | ●        | ●        |
| PBM                                     | ●        | ●        |
| Verkeersstromen                         | ●        | ●        |
| Labs op locatie                         | ●        | ●        |
| Kwaliteitsbewaking en medische verantw. | ●        | ●        |
| Procesbeschrijvingen                    | ●        | ●        |
| Capaciteitsplanning en forecast         | ●        | ●        |
| Waarborging privacy                     | ●        | ●        |

## 8. Ahoy Rotterdam

Datum: 7 december 2020

Aanspreekpunt: 5.1.2e


### Testlocatie

- Ahoy Parkeerterrein
- Concept: Paviljoen met sneltesten
- Openingstijden: 8:30 – 16:00

| Test       | Vanaf  | # testen / dag  |
|------------|--------|-----------------|
| PCR        | n.t.b. | ~ 1.000 – 2.600 |
| Antigeen   | n.t.b. | ~ 1.000 – 4.200 |
| LAMP       | Dec    | N.t.b.          |
| Breathomix | Dec    | N.t.b.          |



### Aantal testen verwacht vs. actueel

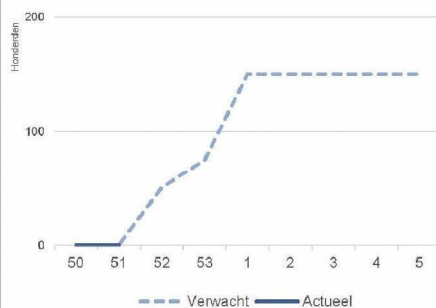

### Activiteiten afgelopen week

- Start bouw woensdag 25 november
- Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten
- Inrichten 1<sup>o</sup> lab

### Activiteiten komende week

- Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten
- Inrichten IT (paviljoen en lab)

● Op koers    ● Issues, in control    ● Issues, interventie nodig

### Status XL-locatie Ahoy

Start bouw paviljoen woensdag 25 november. Verwachte opening met PCR naar verwachting in week 52. Idealiter met een lab ook voor Antigeen (2<sup>o</sup> lab wordt week later geleverd)

| ✓ Onderwerp                             | PCR/LAMP | Antigeen |
|-----------------------------------------|----------|----------|
| Contact met DPG                         | ●        | ●        |
| Driehoek DPG – LAB - OB                 | ●        | ●        |
| Vergunningen en contracten              | ●        | ●        |
| Materieel en inrichting                 | ●        | ●        |
| Personeel                               | ●        | ●        |
| Opleiding                               | ●        | ●        |
| Koppeling CoronIT                       | ●        | ●        |
| Infrastructuur                          | ●        | ●        |
| Apparatuur                              | ●        | ●        |
| Afnamemateriaal                         | ●        | ●        |
| Reagentia / testen                      | ●        | ●        |
| PBM                                     | ●        | ●        |
| Verkeersstromen                         | ●        | ●        |
| Labs op locatie                         | ●        | ●        |
| Kwaliteitsbewaking en medische verantw. | ●        | ●        |
| Procesbeschrijvingen                    | ●        | ●        |
| Capaciteitsplanning en forecast         | ●        | ●        |
| Waarborging privacy                     | ●        | ●        |



## 13. Arnhem / Nijmegen

Projectleider: 5.1.2e

### Testlocatie

- Locatie gekozen
- Volgens concept Amsterdam Z-O paviljoen (L)

| Test       | vanaf | # testen / dag |
|------------|-------|----------------|
| PCR        |       |                |
| Antigeen   |       |                |
| LAMP       |       |                |
| Breathomix |       |                |

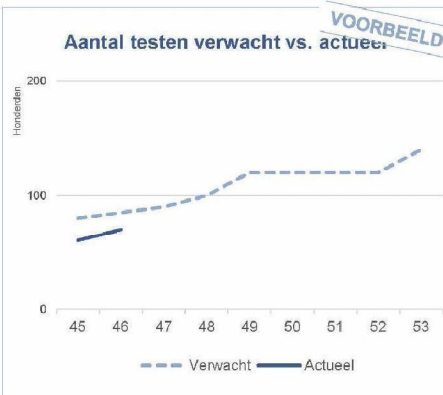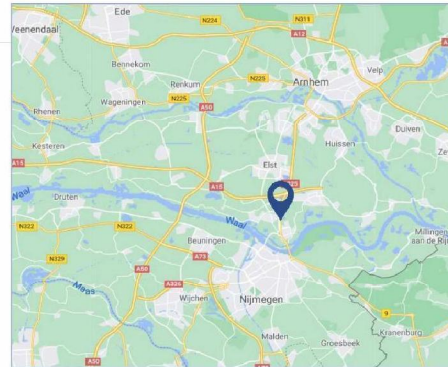

### Activiteiten afgelopen week

- Definitieve opdrachtverstrekking GGD aan ACBN (Stuurgroep)
- Verantwoordelijkheden projectteam duidelijk
- Opdrachtverstrekking personeel invulling Randstad/Defensie
- Afstemming GGD Inkoop, ICT, Medische Supervisie
- Aanleg Infra

### Activiteiten komende week

- Definitieve opdrachtverstrekking GGD aan ACBN (Stuurgroep)
- Afstemming GGD Inkoop, ICT, Medische Supervisie
- Briefing personeel
- Volledig operationeel
- Dry-run (do. 11 en vr. 12 dec.)

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

### Status XL-locatie Arnhem/Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid neemt de medische eindverantwoordelijkheid op zich. ACBN is opdrachtnemer facilitair. Opening teststraat: 14 dec. met 4 antigeen-straten.

| ✓ | Onderwerp                                           | Progress |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Contact met DPG                                     | ●        |
|   | Driehoek DPG – LAB - OB                             | ●        |
|   | Vergunningen en contracten                          | ●        |
|   | Materieel en inrichting                             | ●        |
|   | Personeel                                           | ●        |
|   | Opleiding                                           | ●        |
|   | Koppeling CoronIT                                   | ●        |
|   | Infrastructuur                                      | ●        |
|   | Apparatuur                                          | ●        |
|   | Afnamemateriaal                                     | ●        |
|   | Reagentia / testen                                  | ●        |
|   | PBM                                                 | ●        |
|   | Verkeersstromen                                     | ●        |
|   | Labs op locatie                                     | ●        |
|   | Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | ●        |
|   | Procesbeschrijvingen                                | ●        |
|   | Capaciteitsplanning en forecast                     | ●        |
|   | Waarborging privacy                                 | ●        |

# 14. IJsselland

Datum: 07-12-2020



Projectleider: 5.1.2e

## Testlocatie

- Locatie: De IJsselhallen
- Openingstijden: 8- 15 uur

| Test       | vanaf | # testen / dag |
|------------|-------|----------------|
| PCR        |       | 600            |
| Antigeen   |       | 1885           |
| LAMP       |       |                |
| Breathomix |       |                |

## Aantal testen verwacht vs. actueel

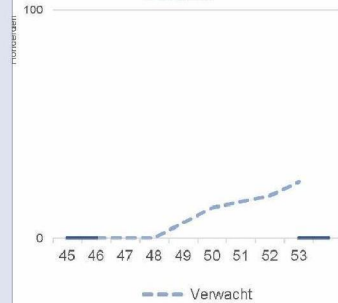

## Activiteiten afgelopen week

- Dry run goed verlopen
- Onderhandeling lokaal lab loopt nog
- 4 december Llocatie geopend
- Personeel geworven en ingewerkt

## Activiteiten komende week

- Afspraak Trilat, LCDK, LMML, GGD regelen
- Overdracht naar regionale kwaliteitscontroles door Supervisor lab en DIP-er GGD
- Werven en onboarden gaat door.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

## Status L-locatie IJsselland

4 december was de officiële opening, goede eerste dagen gehad. Overdracht organiseren. Nog geen lokaal lab gekoppeld. Gestart met Antigeen, toch veel zorgmedewerkers uit triage!

| ✓ Onderwerp                                         | Progres               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Contact met DPG                                     | <input type="radio"/> |
| Driehoek DPG – LAB - OB                             | <input type="radio"/> |
| Vergunningen en contracten                          | <input type="radio"/> |
| Materieel en inrichting                             | <input type="radio"/> |
| Personeel                                           | <input type="radio"/> |
| Opleiding personeel                                 | <input type="radio"/> |
| Koppeling CoronIT                                   | <input type="radio"/> |
| Infrastructuur                                      | <input type="radio"/> |
| Apparatuur                                          | <input type="radio"/> |
| Afnamemateriaal                                     | <input type="radio"/> |
| Reagentia / testen                                  | <input type="radio"/> |
| PBM                                                 | <input type="radio"/> |
| Verkeersstromen                                     | <input type="radio"/> |
| Labs op locatie                                     | <input type="radio"/> |
| Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | <input type="radio"/> |
| Procesbeschrijvingen                                | <input type="radio"/> |
| Capaciteitsplanning en forecast                     | <input type="radio"/> |



## 15. Zuid Limburg



Datum: 7 december 2020

Projectleider: 5.1.2e

### Testlocatie

- Locatie: MECC Maastricht (paviljoen)
- Openingstijden: 08.00 – 16.00 uur (bij start)

| Test       | vanaf | # testen / dag |
|------------|-------|----------------|
| PCR        | 15-12 |                |
| Antigeen   | 15-12 |                |
| LAMP       |       |                |
| Breathomix |       |                |

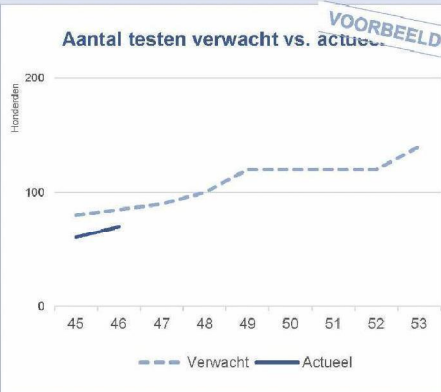

### Activiteiten afgelopen week

- Vervolg bouw locatie
- Selectiegesprekken personeel / voorbereiding opleiding
- Procesbeschrijvingen / kwaliteit / medisch

### Activiteiten komende week

- Opleveren bouw & inrichten locatie
- Opleiding personeel
- Bestellen materialen

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

### Status XL-locatie Zuid Limburg

Loopt op schema voor opening per 15-12.

| ✓ | Onderwerp                                           | Progress |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
| ✓ | Contact met DPG                                     | ●        |
| ✓ | Driehoek DPG – LAB - OB                             | ●        |
| ✓ | Vergunningen en contracten                          | ●        |
|   | Materieel en inrichting                             | ●        |
|   | Personeel                                           | ●        |
| ✓ | Opleiding personeel                                 | ●        |
|   | Koppeling CoronIT                                   | ●        |
|   | Infrastructuur                                      | ●        |
|   | Apparatuur                                          | ●        |
|   | Afnamemateriaal                                     | ●        |
|   | Reagentia / testen                                  | ●        |
|   | PBM                                                 | ●        |
|   | Verkeersstromen                                     | ●        |
|   | Labs op locatie                                     | ●        |
|   | Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | ●        |
|   | Procesbeschrijvingen                                | ●        |
|   | Capaciteitsplanning en forecast                     | ○        |
|   | Waarborging privacy                                 | ○        |

## 16. Twente

Projectleider: 5.1.2e




### Testlocatie

- Locatie:
- Openingstijden:

| Test | vanaf | # testen / dag |
|------|-------|----------------|
|------|-------|----------------|

- PCR
- Antigeen
- LAMP
- Breathomix

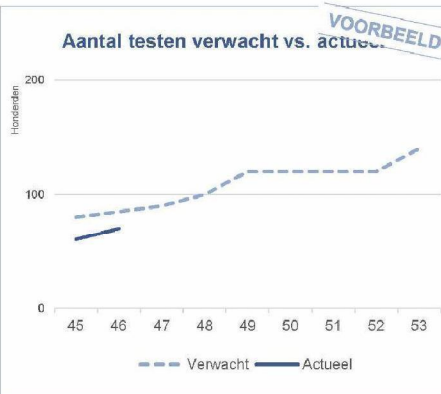

### Activiteiten afgelopen week

- Locatie gezocht en gevonden
- 
- 

### Activiteiten komende week

- Werkbezoek L-locatie Zwolle
- Afstemming laboratorium
- Locatie: plattegrond, vergunning
- Werkprocessen bezien

- Op koers
- Issues, in control
- Issues, interventie nodig

### Status L-locatie Twente

Toelichting op status algemeen:

| ✓ | Onderwerp                                           | Progress |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Contact met DPG                                     | ●        |
|   | Driehoek DPG – LAB - OB                             | ●        |
|   | Vergunningen en contracten                          | ●        |
|   | Materieel en inrichting                             | ○        |
|   | Personeel                                           | ○        |
|   | Opleiding personeel                                 | ○        |
|   | Koppeling CoronIT                                   | ○        |
|   | Infrastructuur                                      | ○        |
|   | Apparatuur                                          | ○        |
|   | Afnamemateriaal                                     | ○        |
|   | Reagentia / testen                                  | ○        |
|   | PBM                                                 | ○        |
|   | Verkeersstromen                                     | ○        |
|   | Labs op locatie                                     | ○        |
|   | Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | ○        |
|   | Procesbeschrijvingen                                | ○        |
|   | Capaciteitsplanning en forecast                     | ○        |
|   | Waarborging privacy                                 | ○        |



## 17. Drenthe

Projectleider: 5.1.2e

### Testlocatie

- Locatie: n.t.b.
- Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

| Test       | vanaf | # testen / dag |
|------------|-------|----------------|
| PCR        | 15-12 | 140            |
| Antigeen   | 15-12 | 280 (van 507)  |
| LAMP       |       |                |
| Breathomix |       |                |

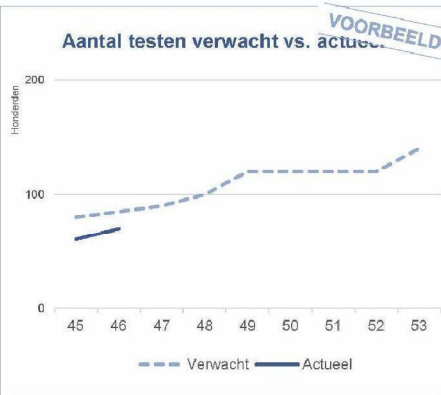

### Activiteiten afgelopen week

1. Eerste (interne) projectgroepbijeenkomst
2. Voorgenomen locatie-keuze
3. Voorgenomen keuze inrichtingsvariant
4. Tweede tekening inrichting gereed
5. Eerste projectteambijeenkomst L-locatie
6. Concept bestelling IT-hardware

### Activiteiten komende week

1. Locatiebezoek voorgenomen locatie
2. Scholings- en bezettingsplan opstellen
3. Procesinrichting bepalen
4. Regionale lab-partner aanhaken en verantwoordelijkheidsverdeling bepalen

● Op koers    ● Issues, in control    ● Issues, interventie nodig

### Status XL-locatie Drenthe

**Toelichting op status algemeen:**  
Er ligt een voorgenomen besluit voor de locatie en de inrichtingsvariant. Vanaf 7-12 worden inhoudelijk de processen en ondersteunende middelen uitgewerkt.

| ✓ | Onderwerp                                           | Progress |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
| ✓ | Contact met DPG                                     | ●        |
| ✓ | Driehoek DPG – LAB - OB                             | ●        |
|   | Vergunningen en contracten                          | ○        |
|   | Materieel en inrichting                             | ○        |
|   | Personeel                                           | ●        |
|   | Opleiding personeel                                 | ●        |
|   | Koppeling CoronIT                                   | ○        |
|   | Infrastructuur                                      | ○        |
|   | Apparatuur                                          | ●        |
|   | Afnamemateriaal                                     | ○        |
|   | Reagentia / testen                                  | ○        |
|   | PBM                                                 | ●        |
|   | Verkeersstromen                                     | ○        |
|   | Labs op locatie                                     | ●        |
|   | Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | ○        |
|   | Procesbeschrijvingen                                | ●        |
|   | Capaciteitsplanning en forecast                     | ●        |
|   | Waarborging privacy                                 | ○        |

## 18. Friesland


Projectleider: 5.1.2n 5.1.2n



### Testlocatie

- Locatie: WTC Leeuwarden
- Openingstijden: 8.30 – 17.00


| Test       | vanaf | # testen / dag |
|------------|-------|----------------|
| PCR        | 15-12 | 425            |
| Antigeen   | 15-12 | 1275           |
| LAMP       |       |                |
| Breathomix |       |                |



### Status XL-locatie Friesland

Toelichting op status algemeen: Locatie wordt ingericht.  
Personeel opgeleid.

| ✓ | Onderwerp                                           | Progress |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Contact met DPG                                     | ●        |
|   | Driehoek DPG – LAB - OB                             | ●        |
|   | Vergunningen en contracten                          | ○        |
|   | Materieel en inrichting                             | ○        |
|   | Personeel                                           | ○        |
|   | Opleiding personeel                                 | ○        |
|   | Koppeling CoronIT                                   | ○        |
|   | Infrastructuur                                      | ○        |
|   | Apparatuur                                          | ○        |
|   | Afnamemateriaal                                     | ○        |
|   | Reagentia / testen                                  | ○        |
|   | PBM                                                 | ○        |
|   | Verkeersstromen                                     | ○        |
|   | Labs op locatie                                     | ○        |
|   | Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | ○        |
|   | Procesbeschrijvingen                                | ○        |
|   | Capaciteitsplanning en forecast                     | ○        |
|   | Waarborging privacy                                 | ○        |

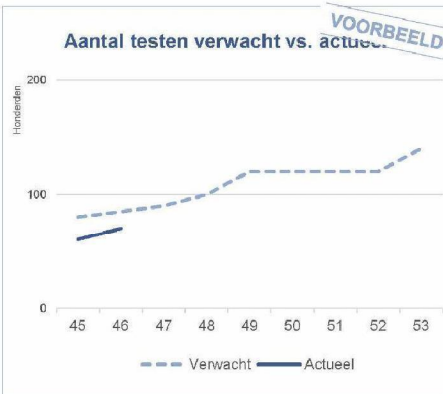

### Activiteiten afgelopen week

- Definitieve keuze locatie
- Personeelsoverzicht afgerond
- Processen verhelderen

### Activiteiten komende week

- Personeel opleiden
- Voorbereiden proefdraaien a.s. vrijdag 11 december
- Afstemmen Coron-it
- Capaciteitsplanning > 2 weken berekenen

● Op koers    ● Issues, in control    ● Issues, interventie nodig



## 19. Zeeland



Projectleider: 5.1.2e



### Testlocatie

- Locatie: Zeelandhallen Goes
- Openingstijden: 08:30 – 16:30

| Test       | vanaf  | # testen / dag |
|------------|--------|----------------|
| PCR        | 14-12  | 630            |
| Antigeen   | N.t.b. |                |
| LAMP       |        |                |
| Breathomix |        |                |

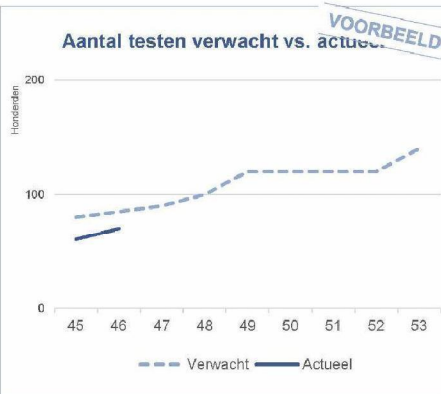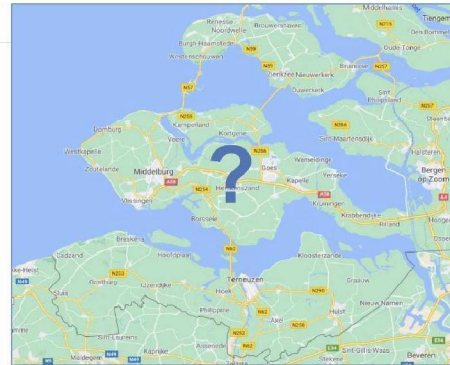

### Activiteiten afgelopen week

- Overeenkomst gesloten met de locatie
- Indeling locatie schriftelijk bepaald
- Vacature bemonstersaars uitgezet
- Vergunning aangevraagd bij gemeente

### Activiteiten komende week

- Opbouwen locatie (va. wo 9-12)
- IT-mogelijkheden bespreken met Marissa Gubler
- Locatiecoördinator aannemen
- Contract tekenen Zeelandhallen
- Verkeersrouteplanning, borden regelen bij gemeente

● Op koers    ● Issues, in control    ● Issues, interventie nodig

### Status XL-locatie Zeeland

Toelichting op status algemeen: Planning lijkt op schema te zijn.

| ✓ | Onderwerp                                           | Progress |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
| ✓ | Contact met DPG                                     | ○        |
|   | Driehoek DPG – LAB - OB                             | ○        |
|   | Vergunningen en contracten                          | ○        |
|   | Materieel en inrichting                             | ○        |
|   | Personeel                                           | ○        |
|   | Opleiding personeel                                 | ○        |
|   | Koppeling CoronIT                                   | ○        |
|   | Infrastructuur                                      | ○        |
|   | Apparatuur                                          | ○        |
|   | Afnamemateriaal                                     | ○        |
|   | Reagentia / testen                                  | ○        |
|   | PBM                                                 | ○        |
|   | Verkeersstromen                                     | ○        |
|   | Labs op locatie                                     | ○        |
|   | Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid | ○        |
|   | Procesbeschrijvingen                                | ○        |
|   | Capaciteitsplanning en forecast                     | ○        |
|   | Waarborging privacy                                 | ○        |
