

Zeist, 2 november 2020



Monitoring uitrol XL-teststraten op 10 locaties

Week 45

Voortgang XL-testlocaties 1/2

Datum: 2 november 2020

● Op koers
● Issues, in control
● Issues, interventie nodig

Locatie	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Groningen 5.1.2e	Op koers voor livegang op 6 november. Het is echter wachten op legal entity voor tekenen contract. Koppeling met CoronIT is aandachtspunt.	<ol style="list-style-type: none"> Afstemming regionale GGD en veiligheidsreg. Kick-off Finaliseren plannen met Martiniplaza 	<ol style="list-style-type: none"> Finaliseren planning tot livegang (GGD, locatie en defensie) Start bouw, test proces op locatie 	●	○
Zuidoost 5.1.2e	Opschaling voor de klassieke PCR is volledig op koers, maar voor de implementatie en opschaling van de LAMP test zijn we afhankelijk van VWS.	<ol style="list-style-type: none"> Het opschalingsplan is in grote lijnen gemaakt Extra materiaal besteld voor de LAMP testen 	<ol style="list-style-type: none"> Gedetailleerd uitwerken opschalingsplan 	●	○
RAI 5.1.2e	Opschaling voor de klassieke PCR is volledig op koers, maar voor de implementatie en opschaling van de LAMP test zijn we afhankelijk van VWS.	<ol style="list-style-type: none"> Het opschalingsplan is in grote lijnen gemaakt Extra materiaal besteld voor de LAMP testen 	<ol style="list-style-type: none"> Gedetailleerd uitwerken opschalingsplan Woensdag komt er een extra portal cabin 	●	○
Schiphol 5.1.2e	Projectteam is gestart. Locatie Schiphol P2 bezocht en offertes worden aangeleverd. Project Amsterdam is aangehaakt v.w.b. de bouw van het paviljoen. De verwachte opening is 23/11	<ol style="list-style-type: none"> Projectteam aangewezen, locatie bezocht Project Amsterdam aangehaakt over XL-paviljoen 	<ol style="list-style-type: none"> Akkoord op locatie en offerte Verkenning welke testen in de XL-locatie Start werving / opleiden personeel 	●	○
Jaarbeurs 5.1.2e	Vrijdag 30 oktober is men in Utrecht enthousiast van start gegaan met de bouw van het XL-paviljoen. De verwachte opening is 16 nov. De acties rondom alle onderwerpen lopen volgens planning.	<ol style="list-style-type: none"> Omg. vergunning, huur contract, start bouw PvE facilitaire ondersteuning, start werving Informeren OB, LAB, pers etc. 	<ol style="list-style-type: none"> Bouw paviljoen Werven/opleiden personeel continueren Inkopen facilitaire onderst., hardware, ICT 	●	○
Haaglanden 5.1.2e	Testlocatie op locatie Broodfabriek. Op dit moment nog veel ontbrekende antwoorden. Dinsdag 3/11 overleg met als doel verantwoordelijkheden helder te maken en processen uitwerken. <u>Nog geen duidelijkheid over verwachte opening</u>	<ol style="list-style-type: none"> Afstemming regionale GGD en projectteam vanuit trilat 	<ol style="list-style-type: none"> Helderheid creëren over verantwoordelijkheid testlocatie en processen m.b.t. testen 	●	○
RTH Airport 5.1.2e	Vorbereidende werkzaamheden in volle gang. Bestaande aanpak en ervaringen toegepast op inrichten XL-locatie. Eigenaarschap van de DPG m.b.t. Antigeen onduidelijk. Verwachte opening 23/11	<ol style="list-style-type: none"> Afstemmen rGGD, DPG en trilat Akkoord op huurprijs en akkoord voor bouw Inventarisatie paviljoen bij RTHA locatie 	<ol style="list-style-type: none"> Start bouw (4/11), evt. samenw. Den Haag Start werving/opleiding, inv. IT en hardware Logistiek proces XL uitwerken 	●	○
Ahoy 5.1.2e	Met Ahoy nog geen overeenstemming over huurprijs, formeel nog geen GO om te starten met bouwen. Vorbereidende werkzaamheden wel parallel gestart. Verwachte opening 30/11	<ol style="list-style-type: none"> Onderhandeling over locatie en huurprijs Afstemmen met locatie coördinator VNO - NCW 	<ol style="list-style-type: none"> Overeenkomst bereiken over huurprijs Akkoord geven start bouw Inventarisatie en start werving en opleiden 	●	○
Brabant 5.1.2e	Locatie in Eindhoven blijkt niet geschikt, GGD en gemeente nu gezamenlijk op zoek naar een geschikte locatie. Bezoek van twee mogelijke locatie en op korte termijn keuze maken.	<ol style="list-style-type: none"> Gezamenlijk (GGD en gemeente) op zoek naar locatie voor XL-teststraat Locatie bezoek twee mogelijke locaties 	<ol style="list-style-type: none"> Selecteren locatie XL-teststraat 	●	○
Gelderland 5.1.2e	Locatie keuze leidend voor start. Locatie momenteel op het oog, deze week keuze definitief maken.	<ol style="list-style-type: none"> Vraag duidelijk krijgen Organisatie starten Locatie zoeken 	<ol style="list-style-type: none"> Locatie vaststellen en voorbereiden Organisatie helder, communicatie stakehold. Bezoek paviljoen Amsterdam 	●	○

Voortgang XL-testlocaties 2/2

Datum: 2 november 2020

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Locatie	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Zwolle 5.1.2e	Verkenning naar mogelijke L of XL-testlocatie in de regio. Contactpersoon voor verkenning door de regio aangewezen.		1. Verkenning locaties voor XL-teststraat en sneltesten in de regio	●	<input type="radio"/>
Zuid Limburg 5.1.2e	Verkenning naar mogelijke L of XL-testlocatie in de regio. Contactpersoon voor verkenning door de regio aangewezen.		1. Verkenning locaties voor XL-teststraat en sneltesten in de regio	●	<input type="radio"/>
Twente 5.1.2e	Verkenning naar mogelijke L of XL-testlocatie in de regio. Contactpersoon voor verkenning door de regio aangewezen.		1. Verkenning locaties voor XL-teststraat en sneltesten in de regio	●	<input type="radio"/>
West Brabant ??	Verkenning naar mogelijke L of XL-testlocatie in de regio.		1. Verkenning locaties voor XL-teststraat en sneltesten in de regio	●	<input type="radio"/>

Verkenning voor deze locaties is deze week gestart. Nog geen gedetailleerd overzicht per locatie opgenomen in deze statusrapportage

1. Martiniplaza Groningen

Datum: 2 november 2020


Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie


- Indoor locatie
- Hal van Martiniplaza
- Volgens concept VNO-NCW
- Openingstijden:

Type testen	vanaf	# testen / dag
PCR	?	1.500
Antigeen	6 nov.	2.500

PCR op huidige GGD locaties in Groningen, Antigeen in Martiniplaza

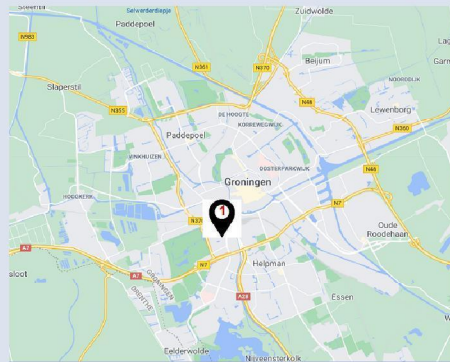

VOORBEELD

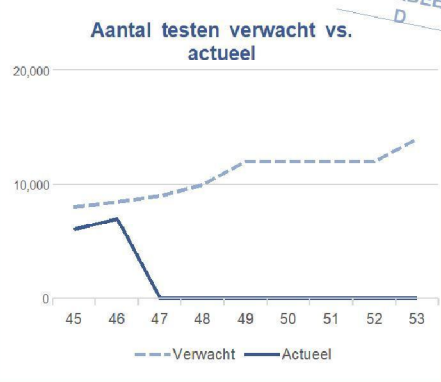

Activiteiten afgelopen week

- Afstemming gezocht met plaatselijke GGD
- Kick-off met projectteam
- Antigeen coördinator aangesteld
- Finaliseren plannen met Martiniplaza
- Afstemming met veiligheidsregio door Martiniplaza

Activiteiten komende week

- Finalisering planning tot livegang (GGD, locatie, defensie)
- Start opbouw locatie
- Testen proces op locatie
- Start met testen (per 6 november)

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Martiniplaza

Toelichting op status algemeen: Op koers voor livegang per 6 november. Echter is het wachten op de legal entity voor tekenen van contracten.

✓ Onderwerp	Progress
Contact met DPG	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●
Vergunningen en contracten	●
Materieel en inrichting	●
Personeel	●
Opleiding personeel	●
Koppeling CoronIT	●
Infrastructuur	●
Apparatuur	●
Afnamemateriaal	●
Reagentia / testen	●
PBM	●
Verkeersstromen	●
Labs op locatie	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
Procesbeschrijvingen	●
Capaciteitsplanning en forecast	●
Waarborging privacy	●

2. Paviljoen Zuidoost

Datum: 2 november 2020


Projectleider:

5.1.2e

Testlocatie

- Concept Amsterdams Paviljoen (L) reeds aanwezig
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	Wk 44	1.200
Antigeen		
LAMP	Wk 48	2.250
Breathomix		

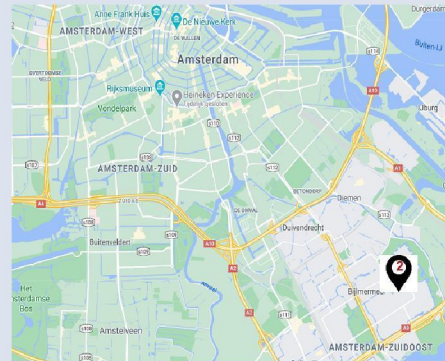


Status L-locatie Zuidoost

Toelichting op status algemeen:
Opschaling voor de klassieke PCR is volledig op koers, maar voor de implementatie en opschaling van de LAMP test zijn we afhankelijk van VWS.

✓ Onderwerp	Progress
Contact met DPG	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●
Vergunningen en contracten	●
Materieel en inrichting	●
Personeel	●
Opleiding	●
Koppeling CoronIT	●
Infrastructuur	●
Apparatuur	●
Afnamemateriaal	●
Reagentia / testen	●
PBM	●
Verkeersstromen	●
Labs op locatie	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
Procesbeschrijvingen	●
Capaciteitsplanning en forecast	●
Waarborging privacy	●

Aantal testen verwacht vs. actueel

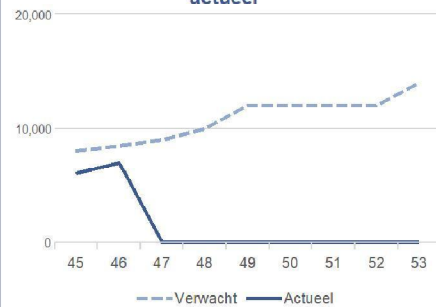

VOORBEELD

Activiteiten afgelopen week

1. Het opschalingsplan is in grote lijnen gemaakt
2. Extra materiaal besteld voor de LAMP testen
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Activiteiten komende week

1. Het opschalingsplan gedetailleerder uitwerken
- 2.
- 3.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

3. Amsterdam RAI

Datum: 2 november 2020


Projectleider: 5.1.2e



Testlocatie

- Aansluiten bij de bestaande teststraat GGD
- Hal 1 is beschikbaar
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	Wk 45	3.600
Antigeen		
LAMP	Wk 46 Wk 47	1.000 2.500
Breathomix		

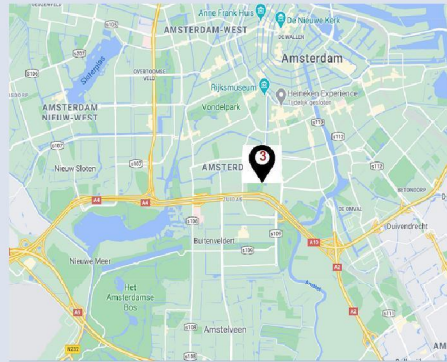


Status XL-locatie RAI

Toelichting op status algemeen:
Opschaling voor de klassieke PCR is volledig op koers, maar voor de implementatie en opschaling van de LAMP test zijn we afhankelijk van VWS.

✓ Onderwerp	Progress
Contact met DPG	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●
Vergunningen en contracten	●
Materieel en inrichting	●
Personeel	●
Opleiding	●
Koppeling CoronIT	●
Infrastructuur	●
Apparatuur	●
Afnamemateriaal	●
Reagentia / testen	●
PBM	●
Verkeersstromen	●
Labs op locatie	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
Procesbeschrijvingen	●
Capaciteitsplanning en forecast	●
Waarborging privacy	●

Aantal testen verwacht vs. actueel

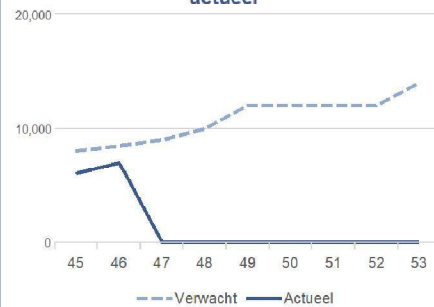

VOORBEELD

Activiteiten afgelopen week

1. Het opschalingsplan is in grote lijnen gemaakt
2. Extra materiaal besteld voor de LAMP testen
- 3.

Activiteiten komende week

1. Het opschalingsplan gedetailleerder uitwerken
2. Woensdag komt er een extra portal cabin
- 3.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

4. Luchthaven Schiphol

Datum: 2 november 2020


Projectleider: 5.1.2e



Testlocatie

- P2
- Volgens concept Amsterdams paviljoen (XL)
- Openingstijden:


Test	vanaf	# testen / dag
PCR	23-nov	
Antigeen		
LAMP		
Breathomix		

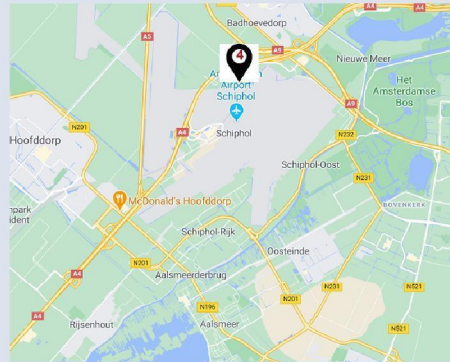

Status XL-locatie Schiphol

Toelichting op status algemeen: Projectteam is gestart. Locatie Schiphol P2 bezocht en offertes worden aangeleverd. Project Amsterdam is aangehaakt v.w.b. de bouw van het paviljoen. De verwachte opening is 23/11

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	○
	Driehoek DPG – LAB - OB	○
	Vergunningen en contracten	○
	Materieel en inrichting	○
	Personeel	○
	Opleiding	○
	Koppeling CoronIT	○
	Infrastructuur	○
	Apparatuur	○
	Afnamemateriaal	○
	Reagentia / testen	○
	PBM	○
	Verkeersstromen	○
	Labs op locatie	○
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	○
	Procesbeschrijvingen	○
	Capaciteitsplanning en forecast	○
	Waarborging privacy	○

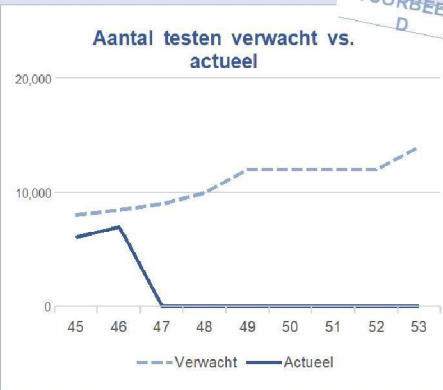

VOORBEELD

Activiteiten afgelopen week

1. Projectteam ingericht
2. Locatie (P2 Schiphol) bezocht, offerte aangevraagd
3. Project Amsterdam aangehaakt over XL-paviljoen

Activiteiten komende week

1. Ontvangen van offerte van locatie
2. Go geven op start bouw XL-paviljoen
3. Bouw van paviljoen
4. Werven en opleiden van personeel
5. Verkennen welke testen op locatie aan bieden

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

5. Jaarbeurs Utrecht

Datum: 2 november 2020


Projectleider:

5.1.2e

Testlocatie

- Parkeerterrein P2 van de Jaarbeurs
- Volgens concept Amsterdams paviljoen (XL)
- Openingstijden: start 9:00-17:00 (doorgroei 8:00-21:00)

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	16 nov	max 4000 eerste week
Antigeen	-	-
LAMP	Medio dec	30%-#?
Breathomix	Medio dec	100% - #?

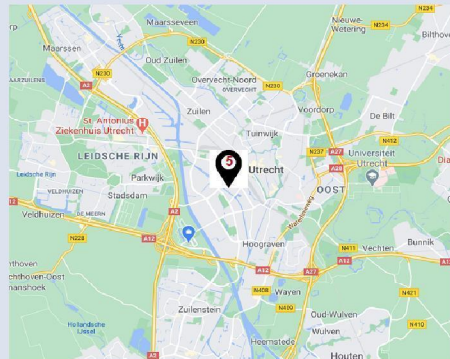


Status XL-locatie Jaarbeurs

Vrijdag 30 oktober is men in Utrecht enthousiast van start gegaan met de bouw van het XL-paviljoen. De verwachte opening is 16 november. De acties rondom onderstaande onderwerpen lopen volgens planning.

✓	Onderwerp	Progress
✓	Contact met DPG	●
✓	Driehoek DPG – LAB - OB	●
✓	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

Aantal testen verwacht vs. actueel

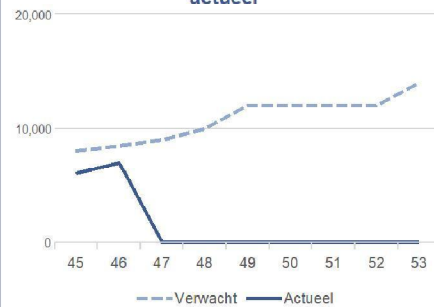

VOORBEELD

Activiteiten afgelopen week

- Onderhandeling/contract huur P2
- Aanvraag omgevingsvergunning
- Start bouw paviljoen
- Werven/opleiden bemonsteraars/teststraatcoördinatoren
- Plan van Eisen facilitaire ondersteuning
- Afstemming/informeren OB, LAB, pers etc.

Activiteiten komende week

- Bouw paviljoen
- Werven/opleiden bemonsteraars/teststraatcoördinatoren
- Afstemming/Inkopen facilitaire ondersteuning
- Inkopen hardware en infrastructuur ICT
- Afstemming diverse partners

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

6. Broodfabriek Haaglanden

Datum: 2 november 2020

Projectleider:

5.1.2e




Testlocatie

- Indoor locatie
- Hal van Broodfabriek
- Volgens concept VNO-NCW
- Openingstijden:

Type testen	vanaf	# testen / dag
-------------	-------	----------------

■ PCR

■ Antigeen

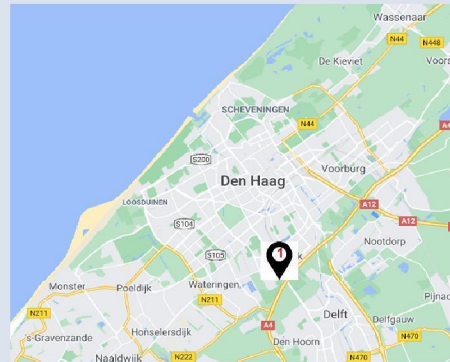


Status XL-locatie Haaglanden

Toelichting op status algemeen:

✓ Onderwerp	Progress
Contact met DPG	<input type="radio"/>
Driehoek DPG – LAB - OB	<input type="radio"/>
Vergunningen en contracten	<input type="radio"/>
Materieel en inrichting	<input type="radio"/>
Personeel	<input type="radio"/>
Opleiding personeel	<input type="radio"/>
Koppeling CoronIT	<input type="radio"/>
Infrastructuur	<input type="radio"/>
Apparatuur	<input type="radio"/>
Afnamemateriaal	<input type="radio"/>
Reagentia / testen	<input type="radio"/>
PBM	<input type="radio"/>
Verkeersstromen	<input type="radio"/>
Labs op locatie	<input type="radio"/>
Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	<input type="radio"/>
Procesbeschrijvingen	<input type="radio"/>
Capaciteitsplanning en forecast	<input type="radio"/>
Waarborging privacy	<input type="radio"/>

Aantal testen verwacht vs. actueel

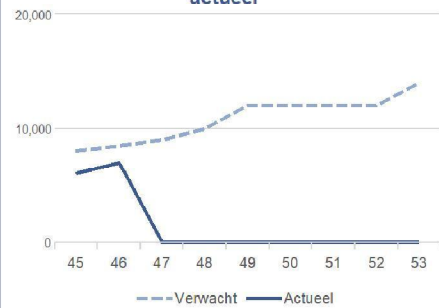

VOORBEELD

Activiteiten afgelopen week

- 1.
- 2.
- 3.

Activiteiten komende week

- 1.
- 2.
- 3.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

7. Rotterdam The Hague Airport

Datum: 2 november 2020

Aanspreekpunt:

5.1.2e



Testlocatie

- Parkeerterrein
- Concept: paviljoen met sneltesten
- Openingstijden: 7:00 – 17:30


Test	vanaf	# testen / dag
PCR	23 nov	~4.000 – 7.000
Antigeen	30 nov	~500 - 1.000
LAMP	Dec	N.t.b.
Breathomix	Dec	N.t.b.



Status XL-locatie RTH Airport

Vorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Bestaande aanpak en ervaringen worden toegepast op inrichten XL locatie. Onduidelijk is nog het eigenaarschap van de DPG m.b.t. de Antigeen testen.

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

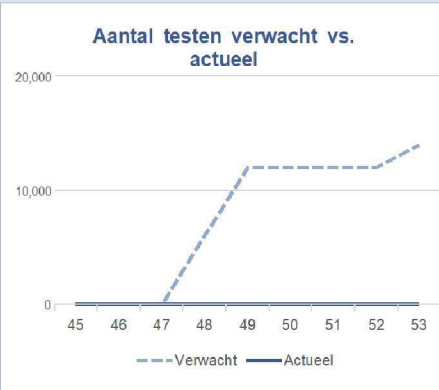

Activiteiten afgelopen week

1. Afstemming met lokale GGD en DPG
2. Inventarisatie Amsterdam paviljoen bij RTHA locatie
3. Onderhandeling over locatie en huurprijs afgerond
4. Afstemmen met locatie coordinator VNO / VCW
5. Akkoord start bouw gegeven op 2 november

Activiteiten komende week

1. Start bouw woensdag 4 november op locatie
2. Inventarisatie en start werving en opleiden personeel
3. Uitwerken nieuw logistiek proces voor XL locaties
4. Inventarisatie IT benodigheden en bestellen hardware
5. Afstemmen samenwerking met VNO/CW (hoe te integreren)
6. Onderzoeken samenwerking Den Haag m.b.t. XL

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

8. Ahoy Rotterdam

Datum: 2 november 2020

Aanspreekpunt: 5.1.2e

Testlocatie

- Ahoy Parkeerterrein
- Concept: Paviljoen met sneltesten
- Openingstijden: 7:00 – 17:30

Test	Vanaf	# testen / dag
PCR	30 nov	~ 4.000 – 7.000
Antigeen	7 dec	~500 – 1.000
LAMP	Dec	N.t.b.
Breathomix	Dec	N.t.b.




Status XL-locatie Ahoy

Met Ahoy is nog geen overeenstemming rondom de huurprijs, formeel dus nog geen GO om te starten met bouwen. Voorbereidende werkzaamheden starten we wel parallel op tot definitieve GO.

✓ Onderwerp	Progress
Contact met DPG	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●
Vergunningen en contracten	●
Materieel en inrichting	●
Personeel	●
Opleiding	●
Koppeling CoronIT	●
Infrastructuur	●
Apparatuur	●
Afnamemateriaal	●
Reagentia / testen	●
PBM	●
Verkeersstromen	●
Labs op locatie	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
Procesbeschrijvingen	●
Capaciteitsplanning en forecast	●
Waarborging privacy	●

Aantal testen verwacht vs. actueel

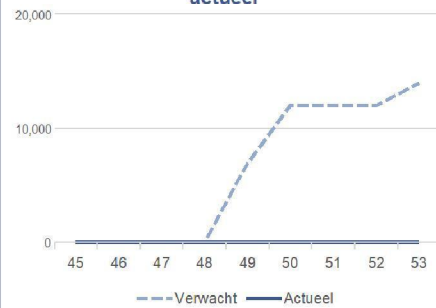

Activiteiten afgelopen week

- Onderhandeling over locatie en huurprijs
- Afstemmen met locatie coordinator VNO - NCW

Activiteiten komende week

- Overeenkomst bereiken over huurprijs
- Akkoord geven start bouw
- Inventarisatie en start werving en opleiden personeel

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

9. Brabant Zuid Oost

Datum: 2 november 2020


Projectleider: 5.1.2e



Testlocatie

- Indoor locatie
- Volgens concept VNO-NCW
- Openingstijden:


Type testen	vanaf	# testen / dag
PCR		
Antigeen		

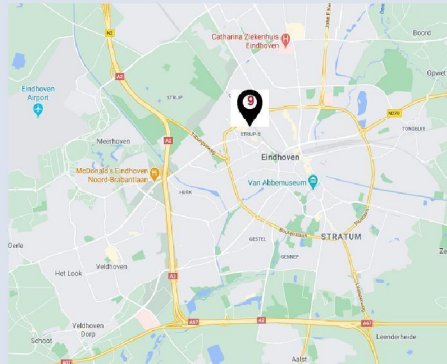

Status XL-locatie Brabant

Toelichting op status algemeen: Locatie in Eindhoven blijkt niet geschikt, GGD en gemeente nu gezamenlijk op zoek naar een geschikte locatie. Bezoek van twee mogelijke locatie en op korte termijn keuze maken.

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding personeel	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

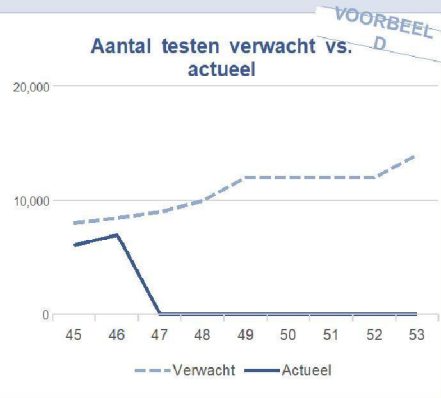

- ### Activiteiten afgelopen week
- Gezamenlijk (GGD en gemeente) op zoek naar locatie voor XL-teststraat
 - Locatie bezoek van twee mogelijke locaties voor XL-teststraat
 -
 -

- ### Activiteiten komende week
- Selecteren locatie voor XL-teststraat
 -
 -
 -

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

10. Arnhem / Nijmegen

Datum: 2 november 2020



Projectleider: 5.1.2e
5.1.2e



Testlocatie

- Nog geen locatie overeengekomen
- Wenselijk volgens concept Amsterdam paviljoen (L)

Test	vanaf	# testen / dag
PCR		
Antigeen		
LAMP		
Breathomix		

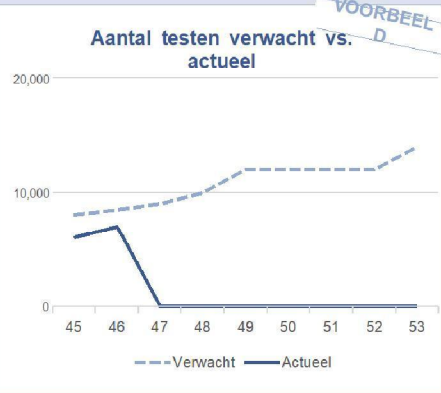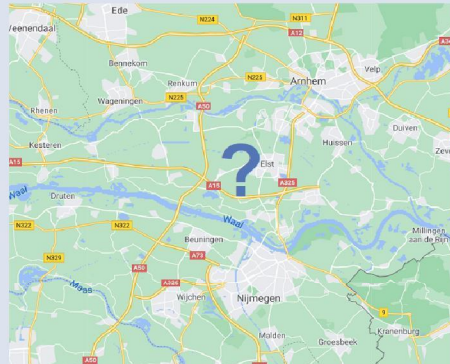

Activiteiten afgelopen week

1. Vraag duidelijk krijgen
2. Organisatie starten
3. Locatie zoeken
- 4.

Activiteiten komende week

1. Locatie vaststellen en voorbereiden
2. Organisatie helder, wie doet wat
3. Bezoek paviljoen Amsterdam
4. Locatiebezoek door bouwer paviljoen?
5. Communicatie direct belanghebbenden locatie

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Arnhem/Nijmegen

Toelichting op status algemeen: Locatie keuze leidend voor start. Locatie momenteel op het oog, deze week keuze definitief maken.

✓	Onderwerp	Progress
✓	Contact met DPG	○
	Driehoek DPG – LAB - OB	○
	Vergunningen en contracten	○
	Materieel en inrichting	○
	Personeel	○
	Opleiding	○
	Koppeling CoronIT	○
	Infrastructuur	○
	Apparatuur	○
	Afnamemateriaal	○
	Reagentia / testen	○
	PBM	○
	Verkeersstromen	○
	Labs op locatie	○
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	○
	Procesbeschrijvingen	○
	Capaciteitsplanning en forecast	○
	Waarborging privacy	○
