



Nationaal moment
Stilstaan bij
Corona
23-24-25 september 2022





Inhoud

Inleiding

Aanpak

Opdracht projectteam

Rollen en Verantwoordelijkheden

Planning en Voortgangsbewaking

- Projectorganisatie



Projectteam breed:



Inleiding



Impact Corona

De impact van de coronacrisis op de samenleving is enorm en duurt nog steeds voort. Velen zijn getroffen door het Coronavirus en de uitwassen ervan. Corona heeft mensen niet alleen ziek gemaakt maar heeft ook geresulteerd in banen- en bedrijfsverlies en de gevolgen hiervan. Schoolgaanden en studerende zijn getroffen en het verdriet van geen afscheid kunnen nemen van dierbaren op de manier waarop iemand dit gewenst had is groot.

Besmettingsgolven en strenge maatregelen hebben uiteindelijk tot een langdurige crisis geleid. Door de lockdown en beperkingen in sociale contactmomenten hebben alle Nederlanders te maken gehad met corona. Zorgpersoneel, leerkrachten, mantelzorgers en vrijwilligers hebben op alle fronten moeten bijspringen.

Tegelijk bleek ook dat de veerkracht en het vermogen tot aanpassen binnen de samenleving groot is. Veel organisaties bleken er goed in te slagen om medewerkers betrokken, vitaal en gemotiveerd te houden.

Respectvol stilstaan

Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen zijn de coronamaatregelen woensdag

23 maart jongstleden weliswaar vrijwel volledig afgeschaft, maar zijn de gevolgen van de pandemie nog altijd voelbaar. "De impact van de coronacrisis is enorm en duurt nog steeds voort. Voor velen is nu ruimte voor herstel, maar we moeten ook stilstaan bij het stille leed van veel Nederlanders."

De minister-president heeft een nationaal moment om stil te staan bij corona toegezegd aan de Tweede Kamer. Het is belangrijk dat dit plaats gaat vinden, vanwege de grote impact die het heeft gehad op de maatschappij. Zo moet er ruimte komen om stil te staan bij verlies van dierbaren of de gevolgen die ondernemingen of festiviteiten hebben ondervonden.

Eenzijds gaat dit over eervol stil staan bij en op een menselijke manier steun bieden in het verwerken van verdriet. Anderzijds kijken we ook terug op momenten van veerkracht en creativiteit in de samenleving en durven we weer wat verder vooruit te kijken. Er zal ruimte zijn voor momenten van inspireren en het waarderen van onze maatschappelijke veerkracht.

Het nationaal moment vindt plaats in de periode van 23 t/m 25 september. Aan dit moment wordt betekenis gegeven door het organiseren van activiteiten zowel op landelijk als op lokaal niveau.



Aanpak Nationaal moment 'Stilstaan bij corona'

Comité met een speciale opdracht

Ten behoeve van de organisatie van de wijze waarop stil gestaan kan worden bij Corona is het comité 'Stilstaan bij Corona' opgericht. Het comité wordt nadrukkelijk gevraagd om ook op andere manieren na te denken over "Hoe we stil kunnen staan bij de gevolgen die de coronacrisis op de samenleving heeft gehad". Het verwerken, reflecteren en vooruitkijken is waar het comité invulling aan gaat geven.

De doelstelling is dat de mensen in de samenleving die er behoefte aan hebben, zich gehoord voelen. De nadruk ligt op de effecten van corona op personen. Eén van de activiteiten die door het comité wordt uitgewerkt is een nationale event welke zal plaatsvinden op een moment tussen 23-25 september 2022. Van het event zal een televisieregistratie uitgezonden worden op de landelijke televisie. De inhoudelijke invulling hiervan zal nader bekendgemaakt worden.

Het comité speelt ook een rol in het coördineren en bevorderen van de afstemming van lokale evenementen om stil te staan bij corona. Deze zullen regionaal plaatsvinden waarbij rekening gehouden wordt met de unieke plek die de provincie Brabant in neemt in de pandemie omdat het daar voor het eerst tot uiting kwam in Nederland. Zowel landelijk als lokaal zal er aandacht zijn. Nationale en regionale media zullen aandacht besteden aan het nationaal moment.

Het comité wordt bij haar opdracht ondersteund door een projectteam van VWS.

Voor het totaal van activiteiten stelt VWS een maximaal budget beschikbaar van maximaal 1,2 mln euro. Tevens draagt VWS zorg voor praktische ondersteuning van het (hoofd)event en moedelijk bij andere evenementen.

De opdracht aan het projectteam luidt:

Zorg voor een goede en pro actieve ondersteuning van het Comité 'Stilstaan bij Corona' met als eindresultaat een nationaal moment wat over een aantal dagen uitvoering krijgt waarbij binnen (financiële) kaders goed uitvoering wordt gegeven aan de belofte door het Kabinet aan de Kamer waarbij tevens hierover adequaat verantwoording plaats kan vinden.

Aanpak

Om tot de juiste stappen en inzicht in betrokkenen te komen is informatie verzameld: er is een inventarisatie gedaan van kaders en aandachtspunten, knelpunten zijn verzameld en er is geïnventariseerd wie en wat er nodig is om het Comité goed in stelling te zetten.

Het gaat om een kort tijdsplan om uitvoering te geven aan de opdracht. Een slagvaardige aansturing is daarom dringend gewenst (minimaliseren bestuurlijke drukte en eenvoud in bekostiging).



Comitéleden





Opdracht projectteam

De projectleider 'Stilstaan bij Corona':

- Fungeert als aanspreekpunt VWS voor de voorzitter en het Comité en ondersteunt hem bij het realiseren van de opdracht (regelen, verbinden, gezond tegenwicht bieden);
- Draagt zorg voor de uitvoering van een programma ten aanzien van een nationaal moment 'Stilstaan bij Corona' waarmee terug kan worden gekeken, en weer vooruit kan worden gekeken.

Het projectteam realiseert:

- Uitvoeringswerkzaamheden voor een nationaal moment 'Stilstaan bij Corona' waarmee terug kan worden gekeken en weer vooruit kan worden gekeken.
- De focus komt te liggen op:
 - Een nationaal event voor 'Stilstaan bij Corona' met live televisie uitzending;
 - (rondreizende) Tentoonstelling (persoonlijke) portretten;
 - Een dansvoorstelling;
 - Mogelijke initiatieven vanuit de regio.



Projectomstandigheden

Uitgangspunten

- a. (Lokale) initiatieven (bottom-up), aangedragen door onder andere de Comitéleden, en een brede betrokkenheid vanuit diverse sectoren;
- b. Een a-politiek karakter;
- c. Zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving;
- d. Er wordt rekening gehouden met diverse scenario's (een forse nieuwe besmettingsgolf/een lichte najaarsopleving van Corona/geen noemenswaardige opleving van Corona);
- e. Het gaat nadrukkelijk om een a-politiek moment wat wel uit gaat stralen op het Kabinet;
- f. Direct belanghebbenden worden meegenomen door vroegtijdige betrokkenheid en goede informatie en communicatie.

Randvoorwaarden

- g. De projectteamleden hebben mandaat en voldoende tijd om zich te kunnen committeren aan de in dit projectplan vermelde resultaten;
- h. Het projectteam kent een integrale samenstelling vanuit de verschillende disciplines van bedrijfsvoering (financiën, communicatie, inkoop en contractmanagement, juridisch (in-out));
- i. De opdrachtgever stelt het benodigde budget van € 1,2 mln. beschikbaar;
- j. De opdrachtgever is beschikbaar;
- k. De richting en focus worden door het Comité gedragen;
- l. Heldere taken, rollen en verantwoordelijkheden;
- m. De comitéleden dragen voorstellen aan en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering;
- n. Er is een goede TV producent beschikbaar die ervaring heeft met dergelijke evenementen waarbij de NOS bereid is een tv programma op een passend zendtijdmoment te organiseren, in principe op eigen kosten

Bij de uitwerking van dit plan van aanpak is rekening gehouden met de onderstaande kaders en uitgangspunten:

Rijksbrede kaders

- Rijksbreed bedrijfsvoeringsbeleid (zoals Strategisch personeelsbeleid Rijk, Rijksinkoopstelsel).
- Interdepartementale context & governance landschap.

Departementale kaders

De inrichtingsprincipes voor bedrijfsvoering:

- Aansluiten bij de Rijksbrede kaders en ontwikkelingen.
- Begrotingsregels en verplichte winkelnering binnen mantels.

Risico's:

- Opleving van virus september
- Afhankelijkheid van andere regionale organisatoren
- Beperkt budget per activiteit
- Afbreukrisico: 17 miljoen meningen
- Krappe organisatie-periode (vakantie)
- Beperkte beschikbaarheid (freelance) professionals die ingehuurd dienen te worden voor de tentoonstelling en het hoofdevenement doordat veel events nu 'ingehaald' worden en veel professionals in de culturele sector zijn overgestapt naar andere vakgebieden.

Projectaanpak



De basis van het nationaal 'stilstaan bij Corona' zal bestaan uit een hoofdactiviteit met een portrettenserie en een dansvoorstelling. De rode draad is: '(stilstaan bij) de gezichten van corona' middels portretten en verhalen van 'gewone' Nederlanders uit de coronatijd. De gekozen personen worden geportretteerd middels een foto en/ of film en er wordt een bijbehorend verhaal geschreven. Deze portretten zullen in de verschillende provincies bekend worden gemaakt. Inwoners van Nederland kunnen zo letterlijk 'stilstaan bij corona'. Bij de organisatie van het hoofdevent is hulp benodigd van een extern bureau dat ervaring heeft met multi media en een specialistisch bureau voor TV productie.

In dit project staan de overige mogelijke initiatieven vanuit de regio centraal. In verschillende regio's van Nederland zullen diverse activiteiten en bijeenkomsten plaatsvinden. Bij de organisatie hiervan kan ook een rol liggen voor het extern bureau, indien het hier bijeenkomsten betreft met een online/ hybride component.

Eerste ideeën die er nu zijn, zijn de volgende:

- o Een oecumenische dienst als onderdeel van het 'Stilstaan bij'
- o In zorginstellingen een aantal activiteiten organiseren
- o Het uitschrijven van een tekenwedstrijd voor jongeren, dat uiteindelijk kan resulteren in een boekje met gebundelde verhalen

Ook hiervoor zal een apart projectteam worden ingericht met daarbij onder andere deelnemers vanuit inkoop en financiën.

Activiteiten die voor dit deelproject dienen te worden opgepakt zijn onder andere het uitdenken van het proces hoe de financiële middelen aan de regio kunnen worden toebedeeld, hoe dit proces vorm te geven en processturing van de voorstellen van het Comité.

Om het projectresultaat te kunnen realiseren is een VWS projectteam beschikbaar met daarbij vertegenwoordiging vanuit evenementen, inkoop en financiën. Daarnaast is bijstand van Dienst Maatschappelijke Ondersteuning toegezegd door te klankborden en mee te denken op inhoud en voortgang van de activiteiten van het comité. Deze dienst wordt actief in de voortgang meegenomen. Tevens is de juridische (aanbesteding)expertise van WJZ beschikbaar.

Bewaking voortgang

De voortgang van de projecten wordt gemonitord met een activiteitenoverzicht. Dit wordt in het wekelijks projectteamoverleg besproken en bijgewerkt. De voortgang van de activiteiten is tevens geregeld onderwerp van gesprek met de opdrachtgever. De opdrachtgever houdt de Staatssecretaris in haar reguliere overlegmomenten op de hoogte van de voortgang van het Nationaal moment. Communicatie is aangesloten bij het kernteam, geeft strategisch advies en draagt zorg voor een helder en concreet communicatieplan wat wekelijks wordt bijgewerkt. Het communicatieplan en een voortgangsoverzicht worden separaat bijgevoegd.

1	Opdrachtformulering en start van het projectteam
2	Uitwerken beknopt plan van aanpak
3	Bespreken vaststellen pva opdrachtgever/gedelegeerd opdrachtgever
4	Uitvoering van de geplande activiteiten
5	Tussentijdse terugkoppeling en afstemming (wekelijks)
6	Monitoren initiatieven Comité
7	Uitvoeren evenementen
8	Afrondende rapportage



Belangen, rollen en verantwoordelijkheden


Duidelijke aansturing minimaliseert bestuurlijke drukte en draagt bij aan goede ondersteuning van het comité en haar voorzitter. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden helder en éénduidig belegd in drie rollen.

Belangen

De **voorzitter (en de leden van het Comité)** wenst adequate ondersteuning van VWS teneinde de opdracht van het Kabinet zo goed mogelijk te vervullen. De directeur PG streeft naar zo adequaat mogelijke projectondersteuning voor het Comité teneinde het Nationaal moment succesvol te doen zijn.

De **opdrachtgever** geeft aan welke ondersteuning zij door het projectteam uitgevoerd wenst te zien en benoemt hierbij de kwaliteitseisen. Kwaliteit, snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn kernwoorden.

De **opdrachtnemer** is een kernteam van drie projectleiders, een projectsecretaris, een controller en een adviseur van de directie Communicatie. Een van de projectleiders heeft de overall projectleiding en is direct aanspreekpunt van de opdrachtgever. De andere twee projectleiders leiden de twee deelprojecten. Het projectteam is verantwoordelijk voor de beheersmatige aspecten en wil de continuïteit borgen.

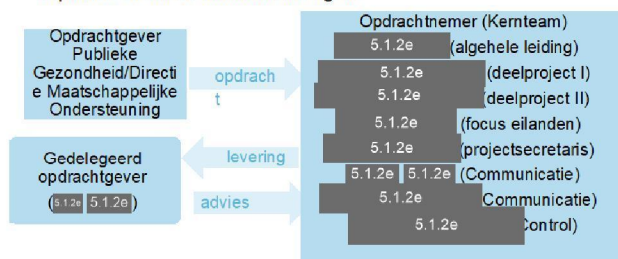

Verantwoordelijkheden

De **voorzitter** van het Comité is aanspreekpunt voor de leden. Hij zorgt er voor dat de groep gemotiveerd en doelgericht blijft. Een concrete taak is tevens het zorg dragen voor een gestructureerd overleg van het Comité.

De (gedelegeerd) **opdrachtgever** is budgethouder en verantwoordelijk voor:

- de opdrachtformulering door middel van een opdrachtverlening met een zo concreet mogelijke omschrijving van het gewenste resultaat,
- het tijdig betrekken van de projectleider bij onvoorziene ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht,
- het maken van afspraken en prestatie-indicatoren en rapportageafspraken zodat de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht kan monitoren,
- het toezicht houden op kwaliteit en kosten van de geleverde dienstverlening.

De **opdrachtnemer (projectleider)** is verantwoordelijk voor:

- het doelmatig, rechtmatig, professioneel, conform afspraken met de opdrachtgever(s) én conform vigerende wet- en regelgeving leveren van ondersteuning,
- het actief ophalen, bundelen van de vragen en verzoeken van het Comité en de afstemming daarover met de opdrachtgever(s)
- het tijdig betrekken van de opdrachtgever(s) bij onvoorziene ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht,
- het begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering, inclusief het afleggen van verantwoording hierover.



Verantwoordingsstructuur

Om te komen tot een goede aansturing van het project is de verantwoordingsstructuur in beeld gebracht. Deze structuur beschrijft wat minimaal nodig is op verschillende niveaus, vanuit de verschillende rollen met hun belangen, maar ook dat de gezamenlijkheid bevordert wordt en dat er kan worden gestuurd op prioriteiten en snelheid.

