

Roll-out plan Ademtest

Spoor 2-a



Roll-out plan Ademtest

Versie 14 maart 2021




Roll-out plan Spironose (versie 14 maart 2021)

Beschikbare testmix korte termijn

	PCR	Antigeen	Ademtest (Spirose)
Sensitiviteit	<ul style="list-style-type: none"> • Hoog sensitief 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensitief 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoog Sensitief
Beschikbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Op alle testlocaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Op alle testlocaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Beperkt beschikbaar, zoveel mogelijk verdeeld over NL
Capaciteit	<ul style="list-style-type: none"> • Ruim voldoende lab-capaciteit min. 50.000 per dag 	<ul style="list-style-type: none"> • Zie schema 25.000 ---> 225.000 p/d (slide 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zie schema Breathomix (slide 12)
Tijd tot uitslag	<ul style="list-style-type: none"> • 8-12 uur (afhankelijk van logistiek en lab) 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 minuten 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 seconden
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> • Aansluiting met laboratoria 	<ul style="list-style-type: none"> • geen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hertest bij (15-30%) nodig (antigeen of PCR) • Validatie nodig (5% PCR) • CE markering ontheffing

Testmethodiek: ademtest met vervolg

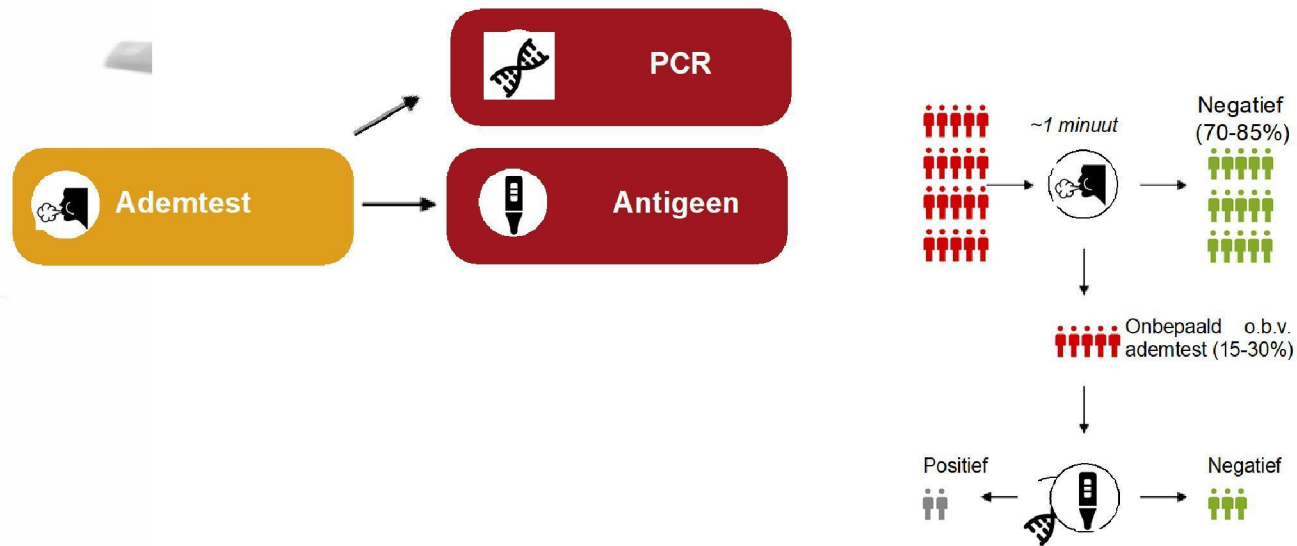

Uitgangspunten t.b.v. uitrol over S/M/L/XL locaties


Belangrijke voorwaarden (zie ook slide 11 en 12)

- Beschikbaarheid voldoende devices
- Beschikbaarheid voldoende implementatie teams
- Beschikbaarheid voldoende trainers-capaciteit
- Beschikbaarheid voldoende support
- Beschikbaarheid van personeel op de testlocaties
In zowel aantallen, maar ook in tijd en werkdruk op locatie
- Testlocatie moet voldoen aan juiste richtlijnen
- 4-6 dagen voorbereiding minimaal nodig
Levering & Installatie kost minimaal 4 dagen (o.a. vanwege de inbrandtijd van nieuwe sensoren en de monitoring van de omgeving.)
- Werken conform ontheffingsvoorwaarden t.b.v. CE markering
Bijv. 5% validatie met PCR bij negatieve uitslagen

Uitgangspunten uitrol op S/M/L/XL locaties

- Gelijke verdeling over Nederland
- Zorgen voor een intensieve samenwerking met korte lijnen tussen de uitvoerders (Lead Healthcare) & ontwikkelaar (Breathomix)
- Kennis, kunde en ervaring aanwezig bij zowel de uitvoerders als de ontwikkelaars.
- Learnings van de Botlek pilot en de GGD pilot meenemen
- Implementatie op zowel S/M/L/XL locaties
- Fijnmazig beschikbaar (dus niet alleen op grote centrale plaatsen)
- Gefaseerde uitrol om te kunnen bijsturen indien nodig
- Juiste locatiekeuze in eerste fase (gezien beschikbaarheid van lab capaciteit // snelheid rondom logistiek //testmix)
- Snelheid van uitrol kan worden gewaarborgd, mits de uitrol z.s.m. begint.

Opbouw testcapaciteit hoog sensitief en antigeen

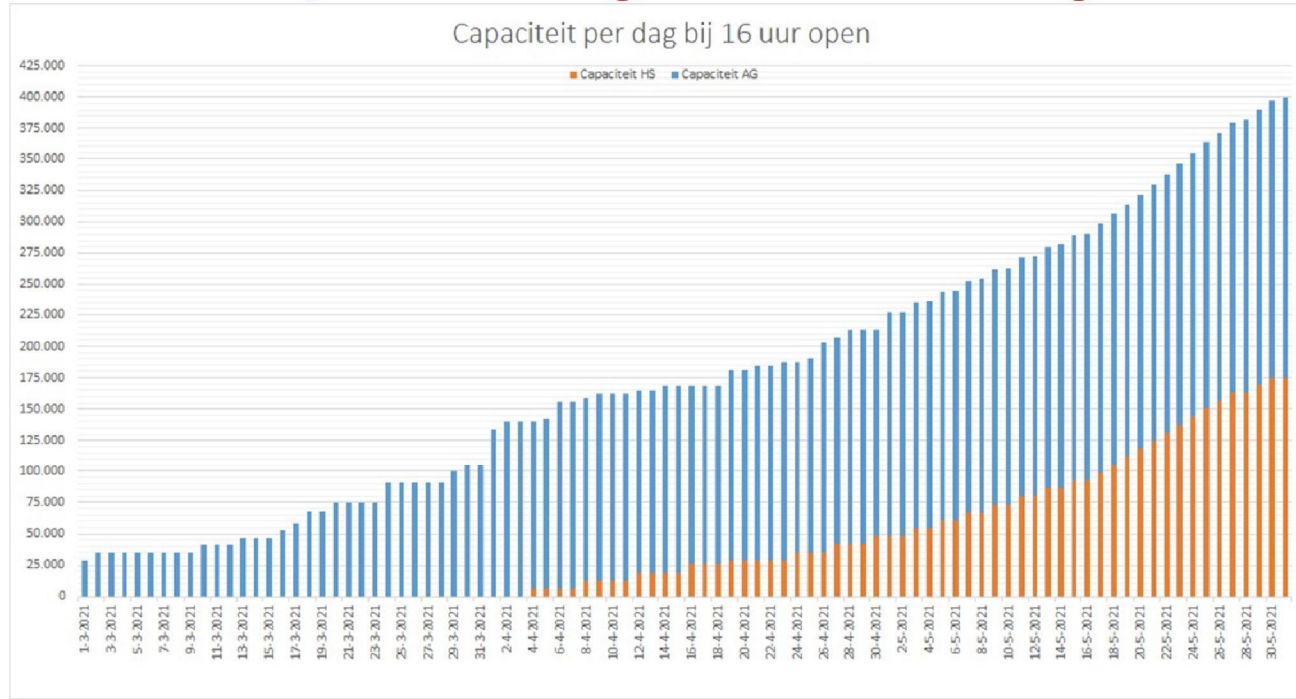

Uitrol Spironose – bigger picture

Maart 2021

- Voorbereidingen treffen voor uitrol. Overleg tussen Breathomix, Lead Healthcare, Stichting Open Nederland & binnen de werkgroepen met VWS.
- Keuze maken eerste testlocaties en haalbare gedetailleerde planning maken

April 2021

- Iedere week minimaal 1 locatie voorzien van devices (5 locaties in april)
- 10-20 devices per locatie. Dus 50-100 devices actief in april
- Extra: Start (6 april) met testen op Eurovisie Songfestival testlocatie 15 devices actief in april en 30 devices actief in mei

Mei 2021 <

- Verdere uitrol (eind mei 175.000 hoog sensitieve testen per dag)
- Iedere week 3-5 locaties voorzien van Spironose; 65 devices per week
- Eventuele uitrol in spoor 2b/c
- Eindstand: min. 550 devices op 25-35 locaties, benodigd per 1 juni voor spoor 2-a. *uitgaande van 16 uur open per dag, en 20 tests per device per uur.*

Concept: 6 locaties voor SpiroNose in april



Aalsmeer	Eindhoven	Rotterdam
Alkmaar	Enschede	Utrecht
Almere	Geersdijk	Venlo
Amersfoort	Gorinchem	Zwolle
Amsterdam	Groningen	Maastricht
Arnhem	Haaren (NB)	Leeuwarden
Baarn	Haarlem	Den Bosch
Bergen op Zoom	Hilversum	Apeldoorn
Bladel	Meteren	Etc.
Breda	Naarden	
Den Haag	Rijswijk	
Deventer	Roermond	



Samenwerking met verschillende betrokken organisaties



Vragen?



Bijlagen

I: Beschikbaarheid Devices (SpiroNose) - Breathomix

II: Uitrolproces Breathomix

Beschikbaarheid devices

Voorraad en forecast

- o Maart - Voorraad 300 stuks
- o April - Voorraad 500 stuks (200 devices verwacht 22 maart)
- o Mei - Voorraad 1.800 stuks (1.300 stuks verwacht per eind april)

Geschat aantal locaties is gebaseerd op 10 devices per locatie.

Productiesnelheid is beïnvloed door wereldwijde tekorten in elektronica

Beschikbaarheid SpiroNosen



Gestructureerd uitrolproces

