




Ministerie van
Landbouw, Natuur
en Voedselzekerheid

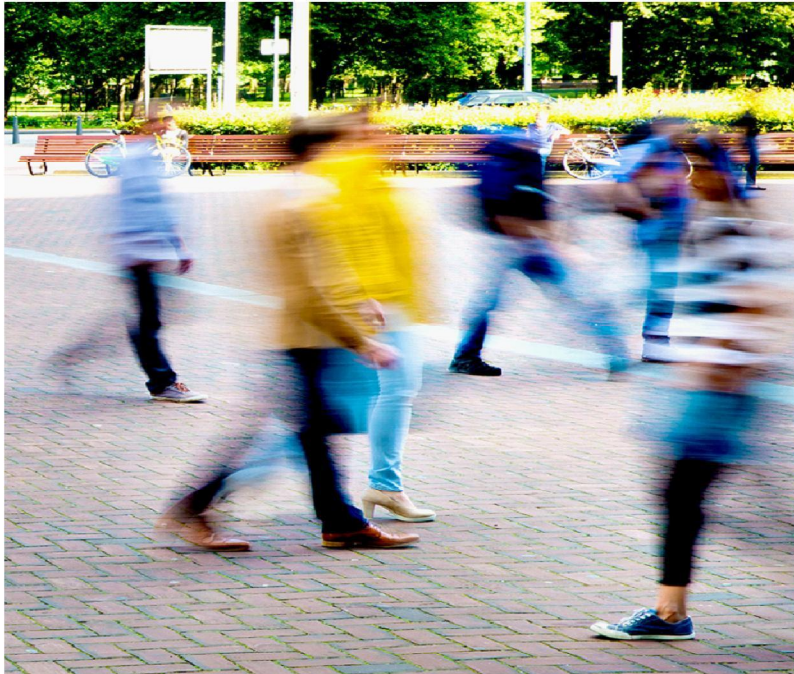

NOODVOORRAAD PBM

Uitkomsten marktconsultatie
27-5-2021



AGENDA

- Opening en doel
- Kaders
- Processtappen en deelnemers
- Uitwerking naar scenario's
- Gewenst resultaat
- Afsluiting



OPENING EN DOEL

- Terugkoppeling marktconsultatie noodvoorraad
- In kaart brengen scenario's mogelijke richtingen
- Directe verband tussen noodvoorraad en ijzeren voorraad bespreken
- Toelichting inhoud nota ter besluitvorming

Voor continuïteit dienstverlening noodvoorraad is bepalen richting in deze fase cruciaal!



KADERS

- Einde contracten LCH consortium 23 juni 2021
- Maximale overbrugging 6 maanden tot en met 23 december 2021
- Looptijd aanbesteding +/- 6 maanden
- Eventuele transitie goederen +/- 3 maanden

Besluitvorming is cruciaal voor 23 juni 2021!



PROCESSTAPPEN EN DEELNEMERS

Vragen categorie

Inrichting dienstverlening en voorraad, samenwerking, aanbesteding, contractmodel en prijsmodel

Deelnemers

Aanwezig bij Informatiebijeenkomst	Reactie ingediend
Splendid De ridder BV/Bunzl 5.1.2e BV Sterisets International B.V. AG Logistics Mediq Medeco DHL Supply chain CB Healthcare NTEU	Splendid De ridder BV/Bunzl Sterisets International B.V. AG Logistics Mediq Medeco CB Healthcare NTEU Fresco Farma Neelevat One Med



RODE DRAAD REACTIES

1. Alleen noodvoorraad geen gewenst uitgangspunt om op de markt te zetten.
Want noodvoorraad is *rommelig* en *niet courant*
Overnemen eigendom is daarom groot risico voor markt
2. Reacties geven aan een aanbesteding noodvoorraad en ijzeren voorraad samen wel als positief te zien. Noodvoorraad is daarbij start inhoud ijzeren voorraad
3. Laat de markt zijn werk doen! Ziekenhuizen moeten betrokken worden voor ijzeren voorraad



PROCES

- Uitwerking scenario's voor besluitvorming
- Op basis van het gekozen scenario wordt een aanbestedingsscenario uitgevoerd
- Er zijn 4 mogelijke aanbestedingsscenario's.
- Als er wordt gesproken over aanbesteding Noodvoorraad gaat het om het aanbesteding van de dienstverlening rondom de Noodvoorraad.
- Het gaat dus niet om een aanbesteding van goederen zelf voor de noodvoorraad!
- Informatie uit deze slides wordt verwerkt in nota voor stuurgroep PBM



SCENARIO'S

Scenario A

aanbesteding noodvoorraad & ijzeren voorraad

Scenario B

alleen aanbesteding ijzeren voorraad

Scenario C

alleen aanbesteding Noodvoorraad

Scenario D

geen aanbesteding voor beide

Voor alle scenario's geldt dat er uiterlijk voor 23 juni 2021 een keuze moet worden gemaakt!



SCENARIO A – noodvoorraad en ijzeren voorraad

Partij die voorraad over neemt en exit strategie uitvoert.
Bij besluitvorming over ijzeren voorraad aanbesteding uitvoeren.
Samenhang zoeken tussen twee aanbestedingen.

Pro's

- Rechtmatigheid geborgd maar wel tegen een hoge prijs.

Contra's

- Marktpartijen zitten niet te wachten op de noodvoorraad blijkt uit de markconsultatie.
- Hoge kosten (twee tenders en transitiekosten).
- Negatieve publiciteit vanwege ondoelmatigheid en huidige sentiment over de corona uitgaven.
- Houdbaarheid van de voorraad zorgt ervoor dat de voorraad redelijk beperkt is en om daar dan zoveel werk voor te doen en uitgaven lijkt niet doelmatig.



SCENARIO B – alleen aanbesteding ijzeren voorraad

Noodvoorraad zoveel mogelijk afbouwen en over laten gaan in ijzeren voorraad.
Ijzeren voorraad aanbesteden.

Pro's

- Marktpartijen zitten niet te wachten op de noodvoorraad blijkt uit de markconsultatie.
- Geen dubbele kosten en werk omdat er maar 1 tender wordt gedaan nl. van de ijzeren voorraad.

Contra's

- Rechtmatigheid niet geborgd maar wel doelmatig.
- Mogelijke marktversturende werking (omdat de voorraad van de overheid is en niet van de markt) vanwege herstel van de markt.



SCENARIO C – alleen noodvoorraad aanbesteden

Noodvoorraad aanbesteden.

Partij die voorraad over neemt en exit strategie uitvoert.

IJzeren voorraad wordt niet uitgevoerd.

Pro's

- Rechtmatigheid geborgd maar wel tegen een hoge prijs.

Contra's

- Marktpartijen zitten niet te wachten op de noodvoorraad blijkt uit de marktconsultatie.
- Negatieve publiciteit vanwege ondoelmatigheid en huidige sentiment over de corona uitgaven.
- Houdbaarheid van de voorraad zorgt ervoor dat de voorraad redelijk beperkt is en om daar dan zoveel werk voor te doen en uitgaven lijkt niet doelmatig.



SCENARIO D – geen aanbesteding, afronding noodvoorraad

Huidige contracten/dienstverlening voorzetten.

Noodvoorraad afbouwen en LCH eindigen.

Geen zicht op beslissing ijzeren voorraad -> kan later altijd nog, starten met schone lei

Pro's

- Marktpartijen zitten niet te wachten op de noodvoorraad blijkt uit de marktconsultatie.
- Focus op afbouw noodvoorraad.
- Past bij het huidige sentiment van aangaande de corona uitgaven.
- Bij eventuele ijzeren voorraad starten met schone lei

Contra's

- Rechtmatigheid niet geborgd maar wel doelmatig.
- Mogelijke marktversturende werking (omdat de voorraad van de overheid is en niet van de markt) vanwege herstel van de markt.



PUNTEN TER OVERWEGING

1. Afname voorraad omlaag (markt is aan het herstellen)
2. Producten niet courant (tht)
3. Kwaliteit verschilt – uiteenlopend
4. Markt wil niets met de (nood)voorraad
5. Is COVID-19 pandemie dit jaar afgelopen?
6. Wanneer sluit de noodvoorraad?



KADERS

- Einde contracten LCH consortium 23 juni 2021
- Maximale overbrugging 6 maanden tot en met 23 december 2021
- Looptijd aanbesteding +/- 6 maanden
- Eventuele transitie goederen +/- 3 maanden

Besluitvorming is cruciaal voor 23 juni 2021!



GEWENST RESULTAAT

Besluitvorming in stuurgroep 8 juni 2021: keuze scenario X

Want voor alle scenario's geldt dat er uiterlijk voor 23 juni een keuze moet worden gemaakt!
