

Rapporteren voortgang – 24 nov | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Antigeen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coronamelder en BCO scripts worden aangepast om testen op dag 5 mogelijk te maken, inclusief validatie ● ■ Goedkeuring METC validatie eerstelijnszorg wordt vandaag verwacht ● ■ ● is 24-11 begonnen met wijkbrede screening op basis van riooldata. ■ ● heeft raamwerk gedeeld, meerdere onderzoekers hebben zich bij hem aangesloten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Validatie BCO/Coronamelder wordt voorbereid 2) Validatie eerstelijnszorg antigeentesten/biasstesten wordt gestart 3) ● (Erasmus MC) werkt voorstel wijkbrede screening op basis van riooldata verder uit 4) Voorstel voor validatie in verpleeghuizen wordt opgestart. Raamwerk wordt opgesteld zodat andere partijen aan kunnen haken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BCO/coronamelder validatie wordt verder uitgewerkt 2. Wijkstudie Marion bezig 3. Studie eerstelijns spoedzorg gaat van start. 4. Aansluiting met verpleeghuizen wordt gezocht 	●	●
Werkgroep LAMP/enose	<ul style="list-style-type: none"> ■ Op dit moment wordt de eerste LAMP-analysestraat geïmplementeerd op de RAI, onderdeel hiervan is bepalen hoe het definitieve pakket er uit ziet (zie slide 2 van de factsheet) ■ Expertgroep beoordeelt ademtest geschikt voor inzet bij symptomen, nu volgt voorbereiding op OMT-advies 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bepalen hoe definitieve LAMP-pakket er uit ziet in implementatiesetting 2. Cohortvalidatie ademtest, inclusief afsluitende expertmeeting over uitkomsten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bepalen hoe definitieve LAMP-pakket er uit ziet, inkoop definitief maken en laatste implementatievalidatie 2. Voorbereiden OMT-advies ademtest 3. Voorbereiden implementatie ademtest 	●	●
Werkgroep STRIP	<ul style="list-style-type: none"> ■ STRIP pilot loopt. Robot 14 december beschikbaar voor pilot, eind januari launch robot 1 voor 10.000 – 20.000 testen per etmaal. Zorgen om consumables nog niet weggenomen. ■ STRIP scale-up kan vertraging oplopen tenzij VWS/LCH deze week bestelt. Inzet minister voor verkorting levertijd geen optie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procesgang voor locatie robots (zie memo) 2. Pilot Fase 1 loopt voorspoedig 3. Validatieplan beschikbaar 4. Communicatieplan beschikbaar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumables pilot orders plaatsen 2. Consumables scale-up orders plaatsen 3. Robots 2-5 orders plaatsen 4. Scenario's opname STRIP in teststromen 	●	●
Werkgroep Innovatieve thuis testen	<ul style="list-style-type: none"> ■ De werkgroep heeft twee bijeenkomsten gehad ■ Werkgroep kan loketfunctie vervullen voor innovatieve testmethoden ■ Kern van werkzaamheden is daarnaast opstellen validatiemethodologie innovatieve sneltesten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NDA opgesteld en getekend 2. Meer methodologen uitgenodigd om deel te nemen in werkgroep 3. Start gemaakt met overzicht innovatieve testen in scope 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conceptcriteria voor innovatieve testen (toelating werkgroep en evt. inzet) bespreken en aanscherpen 	●	●
Werkgroep Thuis testen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Validatie thuis testen wordt voorbereid (onderzoekskoördinator voorgedragen, standaarden ontwikkeld) ■ Pilot Roamier en samenwerkende thuiszorgorganisaties uitgesteld, woensdag (25-11) overleg tussen ministerie/GGD-GHOR en initiatiefnemer over financiering. ■ Eerste indicatieve resultaten bij zelftest zorgmedewerkers laten zien dat zelfafname nog niet in alle gevallen goed werkt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onderzoek naar thuis testen verder uitwerken/voorbereiden 2. Pilot Roamier en samenwerkende thuiszorgorganisaties wordt verder uitgewerkt. GGD-GHOR kijkt in hoeverre SAN aan kan haken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validatie zelftesten wordt verder uitgewerkt. 2. Contact met onderzoekskoördinator wordt gelegd 3. Kwalitatieve problemen bij zelfafname worden verder onderzocht 	●	●

Rapporteren voortgang – 24 nov | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Uitrol en implementatie	<p>Deze week XL-locatie Rotterdam The Hague airport geopend voor PCR, Utrecht ook open met antigeen. Overdracht voor Den Haag en Groningen naar lokale GGD gestart. Andere locaties liggen op schema.</p> <p>! Aansluiten van lab voor antigeen geen vereiste</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitwerken flexibiliteit personeel XL-straten 2. Nieuwe versie van capaciteitsoverzicht aangepast aan go-live data 3. Project Amsterdam is agenda-lid geworden van de trialat 4. Landelijke call voor projectleiders XL-locaties opgezet ter kennisdeling 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitwerken fase 2 inclusief doorrekening van capaciteit naar personeelsbehoefte 2. Standaard uitwerken voor inzet lab voor verantwoordelijkheid antigeenproces 3. Toolkit voor antigeenproces voor GGD fase 2 4. Sessie over LAMP met TNO en project Amsterdam 	●	●
Informatie en prognose	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cockpit 1.0 versie afgerond, meeste informatieverzameling rond ■ Problemen data-aansluiting coronIT. Verschillende bronnen vanuit M&I partners sluiten niet op elkaar aan in doorlooptijden. Zowel cijfers uit GGD performance dashboard als LCDK overzicht laten afwijkende en onrealistische outliers zien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cockpit 1.0 afgerond en na LCT rondgestuurd 2. Eerste raming Reizigers 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aansluiting vinden in Bronnen vanuit M&I partners (ggd monitor en productieoverzicht voor LCDK) 2. Aanscherpen scenario Reizigers 3. Updates aan Cockpit 	●	●
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Communicatieaanpak voor teststraten ingeregeld. Rolverdeling verduidelijkt. ■ Voorbereiding 1 december wijzigingen testbeleid gaande ■ Werkgroep DOT – communicatie besproken 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protocol triage afgestemd. Rolverdeling verduidelijkt 2. Voorbereiding 1 dec. Wijzigingen 3. Voorbereiding presentatie The Beast 21/12 4. Voorbereiding grootschalig testen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finetunen 1 dec. Aanpak 2. Grootschalig testen initiatiefgroep 3. Triage aanscherpen (KT/LT) 4. Stimuleren testbereidheid 5. Afstemming met communicatie quarantaine en vaccin 	●	●
Triage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Op schema om op 1 december de triage ingeregeld te hebben. ■ Verkenning triage op middellange termijn is gestart. Doel is om bij de stuurgroep op 2 december een eerste voorstel te presenteren. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triage per 1 december is vastgesteld. 2. Voorstel voor verkenning triage op middellange termijn is goedgekeurd. 3. GGD is druk bezig met inregelen triage per 1 december en VWS/GGD/RIVM met updates communicatie (flyer, website). 4. Verkenning middellange termijn gestart. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afronden inregelen triage per 1 december incl. bijbehorende update communicatie. 2. Woensdag gesprek GGD/VWS met LHV over rol huisartsen en gesprek GGD en VWS over prioriteitsgroepen. 3. Uitwerking triagemogelijkheden medische risicogroepen door GGD en VWS. 	●	●

GGD regio	Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Groningen	Martiniplaza 5.1.2e	Indoor	09-nov	800	2469		Locatie nog niet overgenomen door regionale GGD. Vanmiddag gesprek over de overdracht en hoe dit verder vorm te geven. Ook bekijken hoe mensen van Randstad breder ingezet kunnen worden (nu slechts inzetbaar op 1 smal onderdeel)	<ul style="list-style-type: none"> Overdracht van locatie naar regionale GGD Inzetbaarheid Randstad mogelijk verbreden
Amsterdam	Zuidoost 5.1.2e	Paviljoen L	LAMP 14-dec	AL in GGD roadmap	3000		Staat al en lab ook. Donderdag nieuwe validatieronde met andere buizen voor LAMP. Als validatie goed gaat kunnen we snel starten met LAMP	<ul style="list-style-type: none"> Validatie buizen LAMP Start met LAMP op korte termijn
Amsterdam	RAI 5.1.2e	Indoor	LAMP 7-dec	AL in GGD roadmap	5040		Staat al en lab ook. Donderdag nieuwe validatieronde met andere buizen voor LAMP. Als validatie goed gaat kunnen we snel starten met LAMP	<ul style="list-style-type: none"> Validatie buizen LAMP Start met LAMP op korte termijn
Amsterdam	Sloterdijk 5.1.2e	Paviljoen XL	LAMP 18-jan	AL in GGD roadmap	5040		Momenteel bezig met scouten van locatie. Planning om 2e / 3e week van januari te starten	<ul style="list-style-type: none"> Scouten van locatie
Amsterdam	Noord 5.1.2e	Paviljoen L	LAMP 16 dec	AL in GGD roadmap	3000		Bouw van Paviljoen start maandag	<ul style="list-style-type: none"> Paviljoen bouwen
Kennemerland	Schiphol 5.1.2e	Paviljoen XL	01-dec	1.100	2899		Locatie Schiphol is akkoord vanuit alle betrokken partijen. Vergunningsvraag is ingediend, bouw is afgelopen weekend gestart.	<ul style="list-style-type: none"> Paviljoen oplevering Draaiboek maken Vergunning afronden Personele inzet Operationele processen inrichten
Kennemerland	Vijfhuizen ntb	Expo	-	-	-		Starten met inzetten van antigeen op bestaande locatie in Vijfhuizen. Locatie is tweede hal op de bestaande locatie Expo.	<ul style="list-style-type: none"> Projectteam samenstellen en in contact brengen met landelijke organisatie voor uitrol antigeen
Utrecht	Jaarbeurs 5.1.2e	Paviljoen XL	16-11-2020 (PCR) 23-11-2020 (Antigeen)	1300	3905		Maandag 23/11 naast PCR ook open met antigeen. Was flinke klus om alle processen rondom antigeen in te regelen. Maar XL Utrecht draait nu waar het voor bedoeld is.	<ul style="list-style-type: none"> Overdracht defensiepersoneel naar Randstad en Jaarbeurs Contract regio lab Finetunen (logistieke) (bestel)processen Ervaringen opzet XL delen met Trilat Werkbezoeken diverse GGD-en
Haaglanden	Broodfabriek 5.1.2e	Indoor	11-nov	600	2400		Nog niet verantwoordelijkheid van lokale GGD wordt wel over gesproken. Heel rustig in de locatie. Lastig om op stoom te draaien en te zien hoe het dan gaat. Vrijdag eerste bezoek van lab om samenwerking te onderzoeken	<ul style="list-style-type: none"> Samenwerking met lab vorm geven Overname door regionale GGD
Rotterdam Rijmond	RTH Airport 5.1.2e	Paviljoen XL	23-11-2020 (PCR) 30-11-2020 (Antigeen)	2600	7578		RTHA is 23 november open voor PCR. Door lage vraag beginnen we met aantal straten. Komende week wordt LAB ingericht voor sneltesten en mensen opgeleid onder regie van EMC.	<ul style="list-style-type: none"> Opening paviljoen voor PCR Inrichten 1e laboratorium (inclusief IT) Opleiden GGD RR medewerkers voor labwerkzaamheden Proefdraaien met sneltesten

GGD regio	Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Rotterdam Rijnmond	Ahoy 5.1.2e	Paviljoen XL	21-dec	1400	4245		Met Ahoy is overeenstemming over de huurprijs. Start bouw paviljoen woensdag 25 november. Verwachte opening met PCR in week 51 of 52	<ul style="list-style-type: none"> Start bouw woensdag 25 november Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten
Brabant Zuidoost	Anton Coolenlaan 5.1.2e	Outdoor	01-dec	1100	3196		Locatie Eindhoven, Anton Coolenlaan. Oplevering op 30 november 2020 dan ook proefdraaien. Formele start op 01 december	<ul style="list-style-type: none"> Gereedmaken voor gebruik / test op 30 nov
Gelderland	P&R Lent 5.1.2e	Paviljoen L	14-dec	1100	3309		Bouw paviljoen is gestart op vrij. 20 november. Opdracht aanleg infra verstrekt. Prioriteit in de volgende stap: schema personele invulling en werving personeel	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve opdrachtverstrekking GGD Verantwoordelijkheden projectteam duidelijk Schema personele invulling Opdrachtverstrekking personele invulling
Zwolle	Ijsselhallen 5.1.2e	Indoor	01-dec	600	1855		Vergevorderd in voorbereiding wat betreft locatie, logistiek, capaciteit en formatieplan. In afwachting van testbeleid, koppeling lab. Kwaliteitskader. Definitieve startdatum volgt!	<ul style="list-style-type: none"> Kwaliteitskaderinrichting analyse verhelderen, koppeling lab Bouw en inrichting in uitvoering Personeelsplan naar uitvoering / scholing Startdatum pas volgend op landelijk bepaald test- en toewijzingsbeleid.
Zuid Limburg	MECC 5.1.2e	Outdoor	15-dec	900	2673		Startbijeenkomst met landelijke partners is geweest. Nu aan de slag met inregelen. Bouw start deze week.	<ul style="list-style-type: none"> Vergunningstraject en contracten Start bouw locatie Werving personeel
Twente	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	600	1864		Mogelijk aansluiten bij locatie in Hengelo. Vraag over type antigeentesten	
West Brabant	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	900	3379		Uitbreiden van huidige locaties. Gesprekken zijn gestart met landelijk contactpersoon, plan ingediend en concrete hulpvraag gesteld. Deze week bekijken wat haalbaar is.	<ul style="list-style-type: none"> Haalbaarheid inschatten en datum van livegang
Friesland	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	425	1275		Net gestart projectgroep samengesteld, kennisgemaakt. Nieuwe locatie vinden aangezien huidige testlocaties niet geschikt zijn	<ul style="list-style-type: none"> Locatie scouten
Drenthe	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	275	824		Net gestart, kennismaking/ projectaftrap met DPG Kennismaking projectleider GGD met projectleider Antigeen	<ul style="list-style-type: none"> Bezoek aan locatie Jaarbeurs Keuze definitieve locatie en inrichting
Zeeland	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	324	971		Net gestart. Projectgroep samengesteld en bezig met het vinden van locatie	<ul style="list-style-type: none"> Locatie scouten



Monitoring uitrol XL-teststraten

Week 48

6. Luchthaven Schiphol


Datum: 23 november 2020

Projectleider: Arjan Smit

Testlocatie

- P4
- Volgens concept Amsterdams paviljoen (XL)
- Openingstijden: 08.00 – 18.00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	1 dec.	1.000
Antigeen	1 dec.	1.000
LAMP	N.n.b.	N.n.b.
Breathomix	N.n.b.	N.n.b.

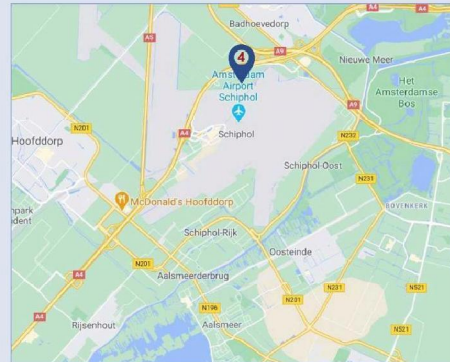


Status XL-locatie Schiphol

Toelichting op status algemeen: Locatie Schiphol is akkoord vanuit alle betrokken partijen. Vergunningsvraag is ingediend, bouw is afgelopen weekend gestart.

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

Aantal testen verwacht vs. actueel

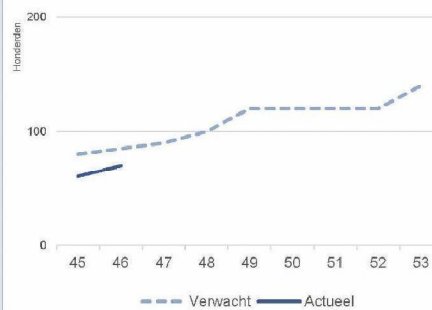

Activiteiten afgelopen week

1. Keuze soort test
2. ICT geregeld
3. Uitvraag personeel
4. Facilitaire zaken zoals schoonmaak geregeld
5. Logistieke zaken zoals verkeersregelaars en beveiliging geregeld

Activiteiten komende week

1. Paviljoen oplevering
2. Draaiboek maken
3. Vergunning afronden
4. Personele inzet
5. Operationele processen nrichten

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

8. Jaarbeurs Utrecht


Datum: 23 november 2020

Projectleider: 5 1 2m

Testlocatie

- Parkeerterrein P2 van de Jaarbeurs
- Volgens concept Amsterdams paviljoen (XL)
- Openingstijden: start 9:00-17:00 (doorgroei 8:00-21:00)


Test	vanaf	# testen / dag
PCR	16 nov	23 nov 650 (50% van 1300)
Antigeen	23 nov	1000 (25% van 4000)
LAMP	Medio dec	30% - #?
Breathomix	Medio dec	100% - #?

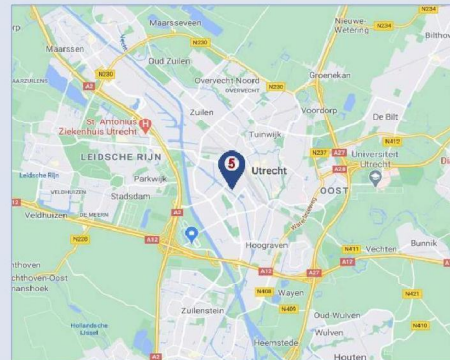

Status XL-locatie Jaarbeurs

Vandaag naast PCR ook open met antigeen. Was flinke klus om alle processen rondom antigeen in te regelen. Maar XL Utrecht draait nu waar het voor bedoeld is ;)

✓	Onderwerp	Progress
✓	Contact met DPG	●
✓	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

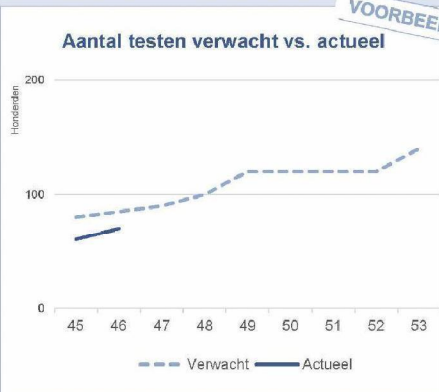

Activiteiten afgelopen week

- Inrichting antigeen lab
- Inregelen antigeen processen (personeel/materiaal)
- Werven/opleiden bemonsteraars/testraat coördinatoren
- Procesbeschrijvingen Antigeen
- Afstemming processen UMCU/GGD/VNO
- Generale repetitie antigeenproces op locatie

Activiteiten komende week

- Overdracht defensiepersoneel naar Randstad en Jaarbeurs
- Contract regio lab
- Finetunen (logistieke) (bestel)processen
- Ervaringen opzet Utrecht XL delen met Trilat
- Werkbezoeken diverse GGD-en

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

10. RTHA

Datum: 23 november 2020


Aanspreekpunt

5.1.2e

Testlocatie

- Parkeerterrein
- Concept: paviljoen met sneltesten
- Openingstijden: 8:30 – 16:00

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	~ 23 nov	~1.000 – 2.600
Antigeen	~ 30 nov	~1.000 – n.t.b.
LAMP	Dec	N.t.b.
Breathomix	Dec	N.t.b.

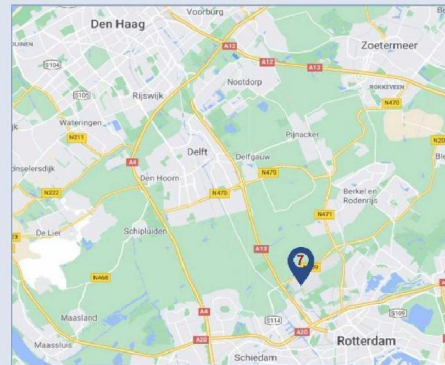


Status XL-locatie RTH Airport

RTHA is 23 november open voor PCR. Door lage vraag beginnen we met aantal straten. Komende week wordt LAB ingericht voor sneltesten en mensen opgeleid onder regie van EMC.

✓ Onderwerp	PCR/LAMP	Antigeen
Contact met DPG	●	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●	●
Vergunningen en contracten	●	●
Materieel en inrichting	●	●
Personeel	●	●
Opleiding	●	●
Koppeling CoronIT	●	●
Infrastructuur	●	●
Apparatuur	●	●
Afnamemateriaal	●	●
Reagentia / testen	●	●
PBM	●	●
Verkeersstromen	●	●
Labs op locatie	●	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantw.	●	●
Procesbeschrijvingen	●	●
Capaciteitsplanning en forecast	●	●
Waarborging privacy	●	●

Aantal testen verwacht vs. actueel

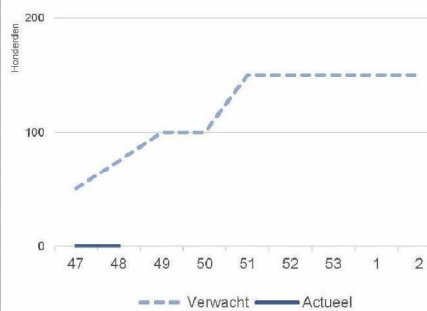

Activiteiten afgelopen week

1. Oplevering paviljoen
2. Inrichten IT werkplekken
3. Testdagen witte en groene kolom t.b.v. PCR
4. Afspraken maken over inrichting sneltest laboratorium
5. Afstemming met Fastlane m.b.t. Witte en groen kolom XL
6. Afstemming met EMC over uitvoering lab werkzaamheden

Activiteiten komende week

1. Opening paviljoen voor PCR
2. Inrichten 1^o laboratorium (inclusief IT)
3. Opleiden GGD RR medewerkers voor labwerkzaamheden
4. Proefdraaien met sneltesten

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

11. Ahoy Rotterdam

Datum: 23 november 2020

Aanspreekpunt: 5.1.2e

Testlocatie

- Ahoy Parkeerterrein
- Concept: Paviljoen met sneltesten
- Openingstijden: 8:30 – 16:00

Test	Vanaf	# testen / dag
PCR	n.t.b.	~ 1.000 – 2.600
Antigeen	n.t.b.	~ 1.000 – 4.200
LAMP	Dec	N.t.b.
Breathomix	Dec	N.t.b.




Status XL-locatie Ahoy

Met Ahoy is overeenstemming over de huurprijs. Start bouw paviljoen woensdag 25 november. Verwachte opening met PCR in week 51 of 52

✓ Onderwerp	PCR/LAMP	Antigeen
Contact met DPG	●	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●	●
Vergunningen en contracten	●	●
Materieel en inrichting	●	●
Personeel	●	●
Opleiding	●	●
Koppeling CoronIT	●	●
Infrastructuur	●	●
Apparatuur	●	●
Afnamemateriaal	●	●
Reagentia / testen	●	●
PBM	●	●
Verkeersstromen	●	●
Labs op locatie	●	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantw.	●	●
Procesbeschrijvingen	●	●
Capaciteitsplanning en forecast	●	●
Waarborging privacy	●	●

Aantal testen verwacht vs. actueel

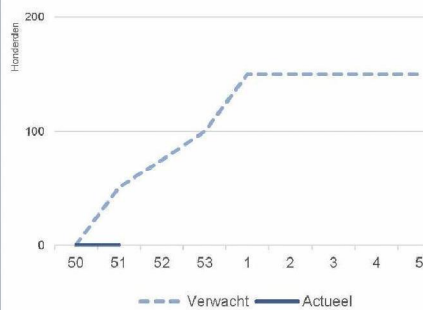

Activiteiten afgelopen week

- Onderhandeling over locatie en huurprijs
- Afronden onderhandeling
- Akkoord start bouw

Activiteiten komende week

- Start bouw woensdag 25 november
- Starten reguliere voorbereidingen werven, opleiden medewerkers voor PCR & sneltesten

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

12. Brabant Zuid Oost


Datum: 23 november 2020

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- Indoor locatie
- Volgens concept VNO-NCW
- Openingstijden: nader overeen te komen.
Start dagelijks: 08.30 – 17.00 uur


Type testen	vanaf	# testen / dag
PCR	1-12	
Antigeen	1-12	

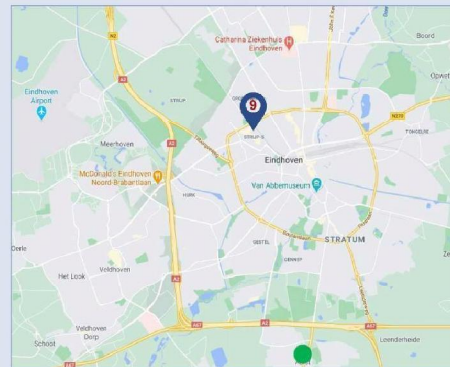

Status XL-locatie Brabant

Toelichting op status algemeen: Locatie Eindhoven, Antoon Coolenlaan. Oplevering op 30 november 2020 dan ook proefdraaien. Formele start op 01 december

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding personeel	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

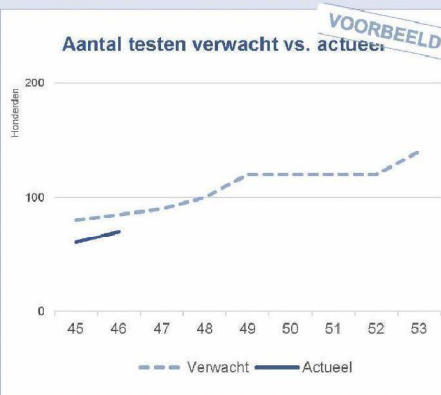

Activiteiten afgelopen week

1. Contracten zijn getekend / voorspoedig gestart
- 2.

Activiteiten komende week

1. Gereedmaken voor gebruik / test op 30 nov
- 2.
- 3.
- 4.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

13. Arnhem / Nijmegen



Datum: 23 november 2020

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- Locatie gekozen
- Volgens concept Amsterdam Z-O paviljoen (L)

Test	vanaf	# testen / dag
PCR		
Antigeen		
LAMP		
Breathomix		

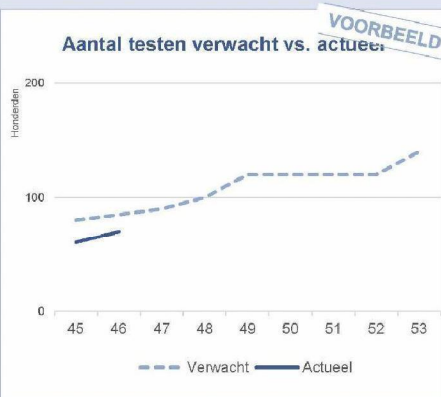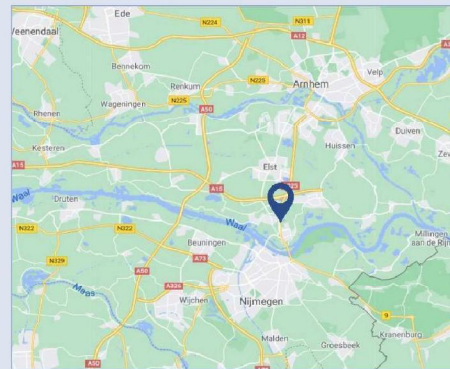

Activiteiten afgelopen week

- Aanvraag omgevingsvergunning
- Start bouw vanaf vrijdag 20 nov.
- Opdrachtverstrekking verkeersplan
- Opdracht aanbrengen NUTS-voorzieningen
- Contact Berenschot / Randstad / Goodguyz – personeel
- Eerste afstemming personele invulling GGD en ACBN

Activiteiten komende week

- Definitieve opdrachtverstrekking GGD aan ACBN (Stuurgroep)
- Verantwoordelijkheden projectteam duidelijk
- Schema personele invulling
- Opdrachtverstrekking personele invulling

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Arnhem/Nijmegen

Toelichting op status algemeen: Bouw paviljoen is gestart op vrij. 20 november. Opdracht aanleg infra verstrekt. Prioriteit in de volgende stap: schema personele invulling en werving personeel.

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

15. Zuid Limburg

Datum: 23 november 2020



Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- Locatie: MECC Maastricht (parkeerplaats)
- Openingstijden:

Test	vanaf	# testen / dag
------	-------	----------------

- PCR
- Antigeen
- LAMP
- Breathomix

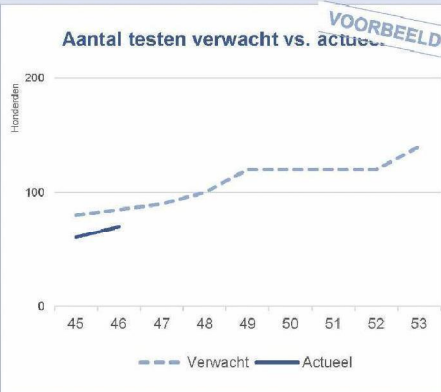

Activiteiten afgelopen week

- Locatiekeuze
- Overleg met Lab
- Verder inrichten projectorganisatie

Activiteiten komende week

- Vergunningtraject en contracten
- Start bouw locatie
- Werving personeel

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Zuid Limburg

Locatie is bekend. Startbijeenkomst met landelijke partners is geweest. Nu aan de slag met inregelen. Bouw start deze week.

✓	Onderwerp	Progress
●	Contact met DPG	●
●	Driehoek DPG – LAB - OB	●
○	Vergunningen en contracten	○
○	Materieel en inrichting	○
○	Personeel	○
○	Opleiding personeel	○
○	Koppeling CoronIT	○
○	Infrastructuur	○
○	Apparatuur	○
○	Afnamemateriaal	○
○	Reagentia / testen	○
○	PBM	○
○	Verkeersstromen	○
○	Labs op locatie	○
○	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	○
○	Procesbeschrijvingen	○
○	Capaciteitsplanning en forecast	○
○	Waarborging privacy	○

14. IJsselland

Datum: 20-11-2020



Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- Locatie: De IJsselhallen
- Openingstijden: volgen

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	?	600
Antigeen	?	1800
LAMP		
Breathomix		

Aantal testen verwacht vs. actueel

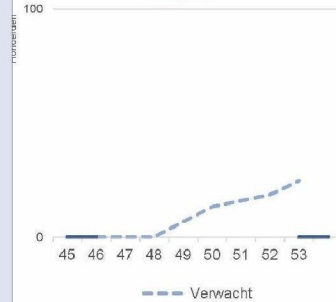

Activiteiten afgelopen week

- Locatie en infrastructuur in kaart
- Inkoop / ICT koppelingen
- Personeelsplan
- Verkeerstromen ingeregeld
- Afstemming kwaliteit

Activiteiten komende week

- Kwaliteitskaderinrichting analyse verhelderen, koppeling lab
- Bouw en inrichting in uitvoering
- Personeelsplan naar uitvoering / scholing
- Startdatum pas volgend op landelijk bepaald test- en toewijzingsbeleid.

- Op koers
- Issues, in control
- Issues, interventie nodig

Status L-locatie IJsselland

Vergevorderd in voorbereiding wat betreft locatie, logistiek, capaciteit en formatieplan. In afwachting van testbeleid, koppeling lab. Kwaliteitskader. Definitieve startdatum volgt!

Onderwerp	Progress
✓ Contact met DPG	<input type="radio"/>
Driehoek DPG – LAB - OB	<input type="radio"/>
Vergunningen en contracten	<input type="radio"/>
Materieel en inrichting	<input type="radio"/>
Personeel	<input type="radio"/>
Opleiding personeel	<input type="radio"/>
Koppeling CoronIT	<input type="radio"/>
Infrastructuur	<input type="radio"/>
Apparatuur	<input type="radio"/>
Afnamemateriaal	<input type="radio"/>
Reagentia / testen	<input type="radio"/>
PBM	<input type="radio"/>
Verkeerstromen	<input type="radio"/>
Labs op locatie	<input type="radio"/>
Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	<input type="radio"/>
Procesbeschrijvingen	<input type="radio"/>
Capaciteitsplanning en forecast	<input type="radio"/>

17. Drenthe

Datum: 23 november 2020


Projectleider: 5.1.2e



Testlocatie

- Locatie: n.t.b.
- Openingstijden: n.t.b.


Test	vanaf	# testen / dag
PCR	15-12	nog onbekend
Antigeen	15-12	280 (van 507)
LAMP		
Breathomix		



Status XL-locatie Drenthe

Toelichting op status algemeen: Net gestart

✓	Onderwerp	Progress
✓	Contact met DPG	●
✓	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	○
	Materieel en inrichting	○
	Personeel	○
	Opleiding personeel	○
	Koppeling CoronIT	○
	Infrastructuur	○
	Apparatuur	○
	Afnamemateriaal	○
	Reagentia / testen	○
	PBM	○
	Verkeersstromen	○
	Labs op locatie	○
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	○
	Procesbeschrijvingen	○
	Capaciteitsplanning en forecast	○
	Waarborging privacy	○

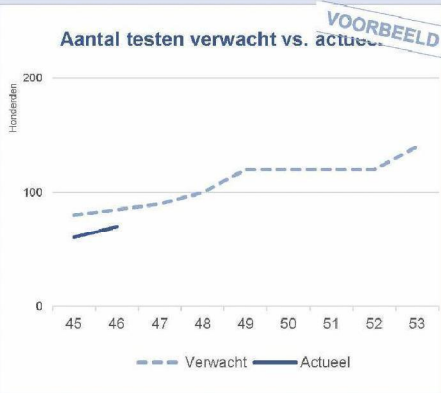

- ### Activiteiten afgelopen week
- Kennismaking/ projectaftrap met DPG
 - Kennismaking projectleider GGD met projectleider Antigeen
 -

- ### Activiteiten komende week
- Bezoek aan locatie Jaarbeurs
 - Keuze definitieve locatie en inrichting
 -
 -

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig
