

Rapporteren voortgang – 17 nov | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Antigeen	- Validatievoorstellen 5.1.2e wordt verder uitgewerkt. Onderzoeksofzet wordt groter, zodat vanaf start op 1 december binnen twee weken resultaten kunnen worden verkregen. 5.1.2e 5.1.2e start vrijdag met onderzoek naar eerstelijns spoedzorg (is in afwachting van goedkeuring METC).	- Financiering voorstel 5.1.2e voor contacten uit BCO/coronameider goedgekeurd - Financiering voorstel 5.1.2e 5.1.2e voor contacten uit eerstelijns spoedzorg goedgekeurd	- Validatie BCO/Coronameider wordt voorbereid - Validatie eerstelijnszorg antigeentesten/blaasstenen wordt gestart 5.1.2e (Erasmus MC) werkt voorstel wijkbrede screening op basis van riooldata verder uit - Voorstel voor validatie in verpleeghuizen wordt opgestart	●	●
Werkgroep LAMP/enose	- Uitrol LAMP afhankelijk van landelijk inkoop, de lopende validatie van robots is vertraagd door onduidelijkheid over het pakket van geleverde materialen van de leverancier en technisch probleem - Onzekerheid planning ademtest door beperkte toestroom testers in aanvullende cohortvalidatie en drempel validatie – zie tijdslijn	- Eerste analysestraat LAMP open in Zuidoost en implementatievalidatie gestart - Cohortvalidatie eNose - Werkgroep LAMP buiten testpaviljoens	- Afronding implementatievalidatie analysestraat LAMP - Opschaling naar 4 LAMP-analysestraten - Versnelling cohortvalidatie eNose	●	●
Werkgroep STRIP	- STRIP pilot loopt. Robot 14 december beschikbaar voor pilot, eind januari launch robot 1 voor 10.000 – 20.000 testen per etmaal. Zorgen om consumables nog niet weggenomen. - STRIP scale-up kan vertraging oplopen tenzij VWS/LCH deze week bestelt. Inzet minister voor verkorting levertijd geen optie.	- Vierde werkgroepvergadering 9-11-2020 - Criteria voor locatie robots - Overwegingen voorkeur TECAN - Kostprijs per test < 20 euro mogelijk	- Consumables pilot orders plaatsen - Consumables scale-up orders plaatsen - Robots 2-5 orders plaatsen - Scenario's opname STRIP in teststromen	●	●
Innovatieve thuish testen	- De werkgroep heeft twee bijeenkomsten gehad - Werkgroep kan loketfunctie vervullen voor innovatieve testmethoden - Kern van werkzaamheden is daarnaast opstellen validatiemethodologie innovatieve sneltesten	- NDA opgesteld en getekend - Meer methodologen uitgenodigd om deel te nemen in werkgroep - Start gemaakt met overzicht innovatieve testen in scope	Concept opstellen van criteria voor innovatieve testen	●	●
Thuis test nte	- Financiering voor onderzoek naar thuish testen wordt aan stuurgroep voorgelegd. - Pilot Roamier en samenwerkende thuiszorgorganisaties wordt gestart.	- Oprichting werkgroep - Pilot Roamier en samenwerkende thuiszorgorganisaties wordt voorbereid	- Onderzoek naar thuish testen verder uitwerken/voorbereiden - Pilot Roamier en samenwerkende thuiszorgorganisaties wordt verder uitgewerkt. GGD-GHOR kijkt in hoeverre San aan kan haken.	●	●

Rapporteren voortgang – 17 nov | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Uitrol en implementatie	Er zijn inmiddels 3 XL-locaties open. Overige locaties op schema. <i>! We zien dat de XL-straten die open zijn maar voor de helft worden benut. Goed om hier aandacht voor de vragen en actief over te communiceren en aan de testbereidheid te werken.</i> <i>! Nu vooral inzet van beschikbaar personeel. Daardoor weinig nieuwe personeel aan het werven. Dit kan een drempel voor opschaling worden</i>	1. Groningen overgedragen aan lokale GGD 2. Den Haag deze week overdracht 3. Locatie Utrecht open (PCR), Antieen 23/11 4. Kick off met DPG Rotterdam over Ahoy 5. Kick off met Drenthe, Friesland en Zeeland (laatste locaties fase 1) 6. Personeelsbehoefte doorgerekend	1. Finaliseren testbeleid, inclusief triage en asymptomatisch testen 2. Afstemming begroting 3. Uitwerken fase 2 inclusief doorrekening van capaciteit naar personeelsbehoefte 4. Rolverdeling in coördinatie van LAMP 5. Locaties selecteren voor laatste locaties	●	●
Informatie en prognose	■ Cockpit wordt nu gebouwd in samenwerking met het LCDK, directe toegang tot de juiste bronnen ■ Weekstructuur bepaald met wekelijks ketenoverleg, kamerbrief en LCT als kader voor planning	1. Afstemming LCDK proces en werkwijze 2. Integraal capaciteitsoverzicht voor beleidskeuze toevoegen BCO/coronamelder 3. Bouwen aan eerste versie voor LCT 19/11	1. Eerste volledige versie cockpit voor LCT 19/11 afronden 2. Valideren en aansluiten bronnen doorlooptijden 3. Toevoegen scenario Reizigers	●	●
Communicatie				●	●

GGD regio	Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Groningen	Martiniplaza 5.1.2e	Indoor	09-nov	800	2469		XL-locatie is open. Nu met trilat in gesprek over beleggen van verantwoordelijkheden bij regionale GGD.	
Amsterdam	Zuidoost 5.1.2e	Paviljoen L	LAMP wk 49	AL in GGD roadmap	2520		In afwachting van apparatuur en materiaal om te kunnen starten met LAMP	
Amsterdam	RAI 5.1.2e	Indoor	LAMP wk 48	AL in GGD roadmap	5040		In afwachting van apparatuur en materiaal om te kunnen starten met LAMP	▪ Starten met de LAMP test
Amsterdam	Sloterdijk 5.1.2e	Paviljoen XL	?	AL in GGD roadmap	2520		Momenteel aan het scouten om een juiste locatie te vinden	
Amsterdam	Noord 5.1.2e	Paviljoen L	?	AL in GGD roadmap	2520		Aangezien er niet voldoende grond beschikbaar is in Noord (7000m2), is het niet mogelijk om een XL locatie in te openen. Noord is daarom aangepast naar een L locatie.	▪ Definitieve locatie vaststellen ▪ Vergunningen en contracten aanvragen/verwerken
Kennemerland	Schiphol 5.1.2e	Paviljoen XL	Eind nov	1.100	2899		Bouw van het Paviljoen loopt voorspoedig. Nu bekijken met welk testen te starten. Communicatieplan gereed, ICT voorzieningen in beeld gebracht en besteld. Personele inzet in beeld gebracht. NUTS voorzieningen geregeld en teststrategie in kaart gebracht	▪ Afstemming/Inkopen facilitaire ondersteuning ▪ Verkeersplan gereed ▪ Ontruimingsplannen opstellen ▪ Oplevering paviljoen bouw
Kennemerland	Vijfhuizen ntb	Expo	-	-	-		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen
Utrecht	Jaarbeurs 5.1.2e	Paviljoen XL	16-11-2020 (PCR) 23-11-2020 (Antigeen)	1300	3905		Vandaag is het paviljoen geopend, eerste PCR testdag goed verlopen met veel media aandacht. Nog steeds planning 23 nov open voor Antigeen, gele issues hebben daar betrekking op (o.a.)	▪ Plaatsing en inrichting analyse lab ▪ Werven/opleiden bemonsteraars/teststraat coördinatoren ▪ Afstemming processen UMCU/GGD/VNO ▪ Integrale procesbeschrijvingen & verantwoordelijkheden diverse partijen Antigeen (inclusief contacten)
Haaglanden	Broodfabriek 5.1.2e	Indoor	11-nov	600	2400		Morgen laatste dag defensie personeel, Randstad nu aan het opschalen. Locatie niet vol, regio heeft het rustig.	▪ Overdracht van verantwoordelijkheid voor XL-locatie naar regionale GGD
Rotterdam Rijnmond	RTH Airport 5.1.2e	Paviljoen XL	23-11-2020 (PCR) 26-11-2020 (Antigeen)	2600	7578		Planning XL PCR op schema. Afspraken gemaakt met Fastlane t.b.v. Antigeen. Deze worden deze en volgende week verder geconcretiseerd en ingevuld.	▪ Oplevering paviljoen ▪ Inrichten IT werkplekken ▪ Testdagen witte en groene kolom t.b.v. PCR ▪ Afspraken maken over inrichting Antigeenlab ▪ Afstemming met Fastlane m.b.t. Witte en groen kolom XL

GGD regio	Locatie	Type locatie	Livegang	Aantal tests PCR	Aantal sneltesten	Huidige status	Toelichting status	Activiteiten komende week
Rotterdam Rijmond	Ahoy 5.1.2e	Paviljoen XL of Indoor	30-nov	1400	4245		Met Ahoy is overeenstemming over de huurprijs. In RBT van dinsdag 17 november wordt besloten wanneer te starten met bouw Ahoy XL locatie.	Akkoord voor Ahoy als XL testlocatie vragen dinsdag 17 november in RBT
Brabant Zuidoost	Anton Coolenlaan 5.1.2e	Outdoor	01-dec	1100	3196		Locatie in Eindhoven Antoon Coolenlaan (Parking). Nog geen akkoord op vergunningen en contracten. Tekening ontwerp door GGD/GHOR zijn gemaakt. Afstemming geweest op locatie / integratie	Selecteren leverandiers voor XL-teststraat
Gelderland	P&R Lent 5.1.2e	Paviljoen L	01-dec	1100	3309		De bouw is nog niet gestart. Streven is om uiterlijk di. 17/11 groen licht te hebben van de omgevingsdienst en ook de GGD als opdrachtgever. Daar stopt het op dit moment. Start bouw paviljoen kan dan op wo. 18/11	- Definitieve opdrachtverstrekking GGD aan ACBN - Keuzes personele invulling door GGD - Voortgang aanvraag omgevingsvergunning - Start bouw - Afstemming verkeersplan - Vervolgonderzoek NUTS-voorzieningen
Zwolle	IJsselhallen 5.1.2e	Ntb	01-dec	600	1855		Hopen deze week tot een akkoord te komen. Eind november/begin december operationeel. Personeel en bouw niet het probleem. Bekijken hoe analyse van antigeen gaan beleggen	- Akkoord voor locatie - Start met opbouw locatie
Zuid Limburg	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	900	2673		Verkenning locatie is nagenoeg afgerond. Huurprijzen zijn bekend. Keuze locatie wordt deze week verwacht. Projectorganisatie wordt ingericht.	- Locatiekeuze - Overleg met Lab - Verder inrichten projectorganisatie
Twente	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	600	1864		Nog niet gestart met XL-locatie Voorbereidend stadium, onderzoeken of antigeen niet geïntegreerd kan worden in bestaande locaties i.p.v. één grote XL-locatie.	Uitsluitel over antigeen integreren in bestaande locaties of een XL-locatie openen
West Brabant	NTB 5.1.2e	ntb	15-dec	900	3379		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen
Friesland	NTB	ntb	15-dec	425	1275		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen
Drenthe	NTB	ntb	15-dec	275	824		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen
Zeeland	NTB	ntb	15-dec	324	971		Geen input ontvangen	Geen input ontvangen



Monitoring uitrol XL-teststraten

Week 46

2. Paviljoen Zuidoost

Datum: 16 november 2020


Projectleider:

5.1.2e

Testlocatie

- Concept Amsterdams Paviljoen (L) reeds aanwezig
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	Wk 44	1.200
Antigeen		
LAMP	Wk 48	1.000
	Wk 49	2.250
Breathomix		

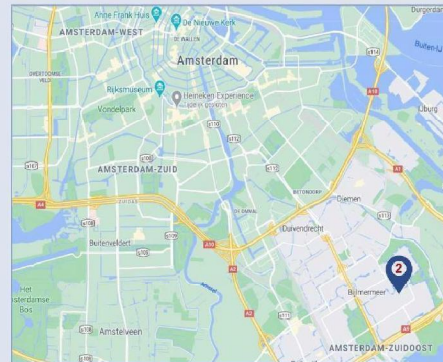


Status L-locatie Zuidoost

Toelichting op status algemeen:

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

Aantal testen verwacht vs. actueel

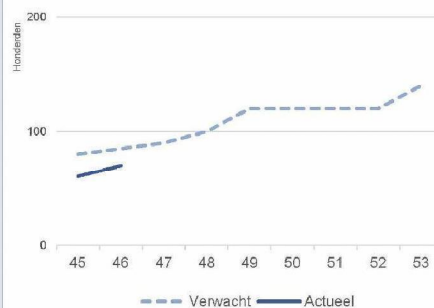

VOORBEELD

Activiteiten afgelopen week

1. Het opschalingsplan gedetailleerder uitwerken

Activiteiten komende week

- 1.
- 2.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

3. Amsterdam RAI


Datum: 16 november 2020

Projectleider: 5.1.2c

Testlocatie


- Aansluiten bij de bestaande teststraat GGD
- Hal 1 is beschikbaar
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	Wk 45	3.600
Antigeen		
LAMP	Wk 47	100
	Wk 52	5.300
Breathomix		

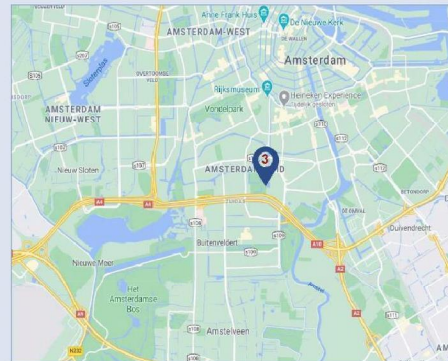

VOORBEELD

Aantal testen verwacht vs. actueel

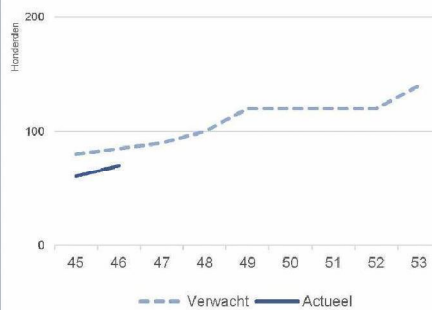

Activiteiten afgelopen week

- Een extra portal cabin geplaatst in week 46
-

Activiteiten komende week

- Starten met de LAMP test

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie RAI

Toelichting op status algemeen:

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

4. Paviljoen Sloterdijk


Datum: 16 november 2020

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie


- Concept Amsterdams Paviljoen (XL)
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR		
Antigeen		
LAMP	Wk 1	3.000
	Wk 4	5.000
Breathomix		



VOORBEELD

Aantal testen verwacht vs. actueel

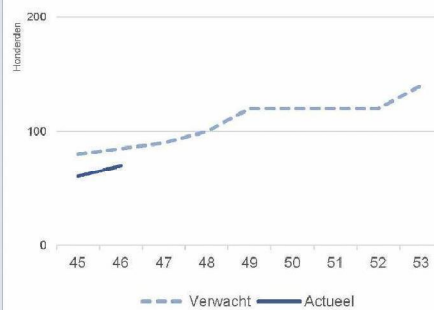

Activiteiten afgelopen week

- Locaties scouten

Activiteiten komende week

- Locaties scouten
-
-

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Sloterdijk

Toelichting op status algemeen:

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	○
	Vergunningen en contracten	○
	Materieel en inrichting	○
	Personeel	○
	Opleiding	○
	Koppeling CoronIT	○
	Infrastructuur	○
	Apparatuur	○
	Afnamemateriaal	○
	Reagentia / testen	○
	PBM	○
	Verkeersstromen	○
	Labs op locatie	○
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	○
	Procesbeschrijvingen	○
	Capaciteitsplanning en forecast	○
	Waarborging privacy	○

5. Paviljoen Noord

Datum: 16 november 2020


Projectleider:

5.1.2e

Testlocatie


- Concept Amsterdams Paviljoen (L)
- Openingstijden: 08:45 tot 16:00 uur

Test	vanaf	# testen / dag
PCR		
Antigeen		
LAMP	Wk 49	1.500
	Wk 52	3.000
Breathomix		

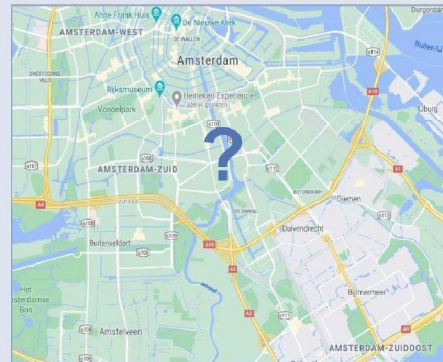

VOORBEELD

Aantal testen verwacht vs. actueel

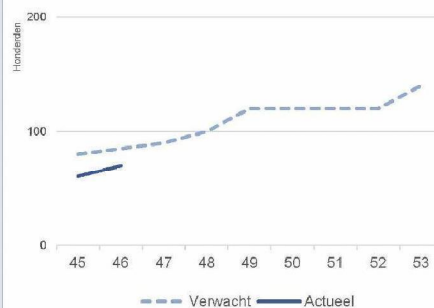

Activiteiten afgelopen week

1. Start werven personele capaciteit
- 2.
- 3.
- 4.

Activiteiten komende week

1. Definitieve locatie vaststellen
2. Vergunningen en contracten aanvragen/verwerken
- 3.
- 4.

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status L-locatie Noord

Toelichting op status algemeen:

Aangezien er niet voldoende grond beschikbaar is in Noord (7000m2), is het niet mogelijk om een XL locatie in te openen. Noord is daarom aangepast naar een L-locatie.

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	○
	Materieel en inrichting	○
	Personeel	○
	Opleiding	○
	Koppeling CoronIT	○
	Infrastructuur	○
	Apparatuur	○
	Afnamemateriaal	○
	Reagentia / testen	○
	PBM	○
	Verkeersstromen	○
	Labs op locatie	○
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	○
	Procesbeschrijvingen	○
	Capaciteitsplanning en forecast	○
	Waarborging privacy	○

6. Luchthaven Schiphol


Datum: 16 november 2020

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- P4
- Volgens concept Amsterdams paviljoen (XL)
- Openingstijden n.n.b.

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	1 dec.	N.n.b.
Antigeen	N.n.b.	N.n.b.
LAMP	N.n.b.	N.n.b.
Breathomix	N.n.b.	N.n.b.

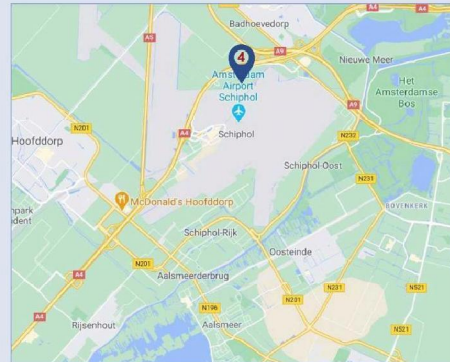


Status XL-locatie Schiphol

Toelichting op status algemeen:

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	○
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	○
	Afnamemateriaal	○
	Reagentia / testen	○
	PBM	○
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	○
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

VOORBEELD

Aantal testen verwacht vs. actueel

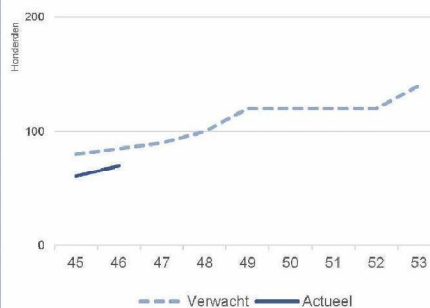

Activiteiten afgelopen week

1. Communicatieplan gereed
2. ICT voorzieningen in beeld gebracht en besteld
3. Personele inzet in beeld gebracht
4. NUTS voorzieningen geregeld
5. Teststrategie in kaart gebracht

Activiteiten komende week

1. Afstemming/inkopen facilitaire ondersteuning
2. Verkeersplan gereed
3. Ontruimingsplannen opstellen
4. Oplevering paviljoen bouw

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

8. Jaarbeurs Utrecht

Datum: 16 november 2020


Projectleider:

5 1 2m

Testlocatie


- Parkeerterrein P2 van de Jaarbeurs
- Volgens concept Amsterdams paviljoen (XL)
- Openingstijden: start 9:00-17:00 (doorgroei 8:00-21:00)

Test	vanaf	# testen / dag
PCR	16 nov	#325 (25% van 1300) #1000 (ivm nog niet beschikbaar antigeen)
Antigeen	23 nov	#1000 (25% van 4000)
LAMP	Medio dec	30%-#?
Breathomix	Medio dec	100% - #?

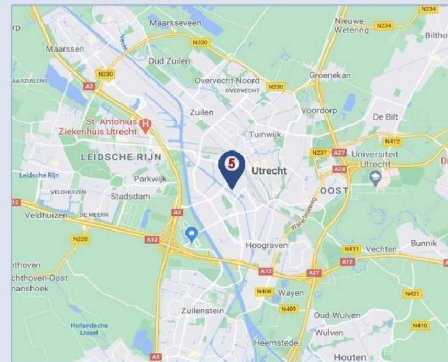

VOORBEELD

Aantal testen verwacht vs. actueel

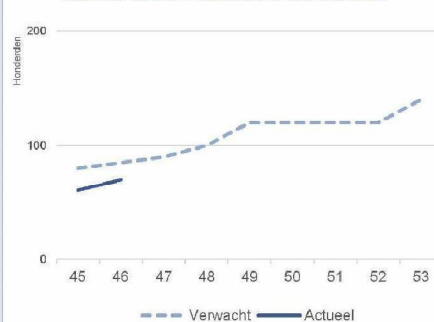

Activiteiten afgelopen week

- Bouw paviljoen en inrichting/bevoorrading
- Opening voorbereiden
- Werven/opleiden bemonsteraars/teststraat coördinatoren
- Integrale procesbeschrijvingen PCR en Antigeen
- Afstemming processen UMCU/GGD/VNO

Activiteiten komende week

- Opening paviljoen 16 nov
- Plaatsing en inrichting analyse lab
- Werven/opleiden bemonsteraars/teststraat coördinatoren
- Afstemming processen UMCU/GGD/VNO
- Integrale procesbeschrijvingen & verantwoordelijkheden diverse partijen Antigeen (inclusief contacten)

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Jaarbeurs

Vandaag is het paviljoen geopend, eerste PCR testdag goed verlopen met veel media aandacht. Nog steeds planning 23 nov open voor Antigeen, gele issues hebben daar betrekking op.

✓	Onderwerp	Progress
✓	Contact met DPG	●
✓	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

13. Arnhem / Nijmegen



Datum: 16 november 2020

Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie

- Locatie gekozen
- Volgens concept Amsterdam Z-O paviljoen (L)

Test	vanaf	# testen / dag
PCR		
Antigeen		
LAMP		
Breathomix		

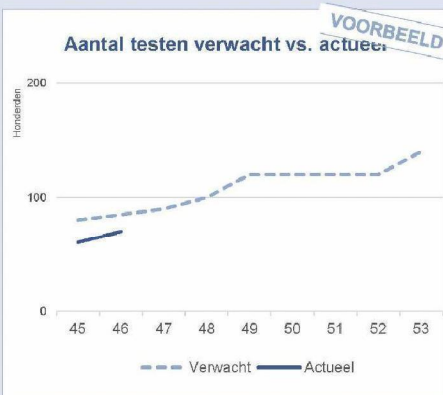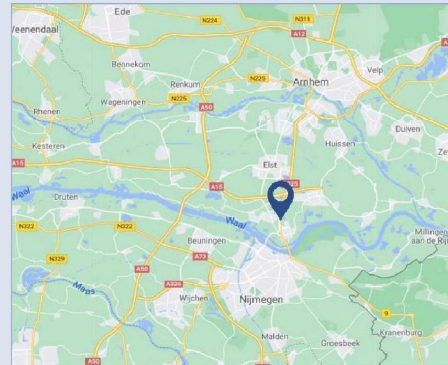

Activiteiten afgelopen week

- Verantwoordelijkheden projectteam duidelijk
- Start aanvraag omgevingsvergunning
- Opdrachtverstrekking verkeersplan
- Onderzoek NUTS-voorzieningen
- Bezoek Amsterdam Zuid_Osst door omgevingsdienst en projectmanager

Activiteiten komende week

- Definitieve opdrachtverstrekking GGD aan ACBN
- Keuzes personele invulling door GGD
- Voortgang aanvraag omgevingsvergunning
- Start bouw
- Afstemming verkeersplan
- Vervolgonderzoek NUTS-voorzieningen

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Arnhem/Nijmegen

De bouw is nog niet gestart. Streven is om uiterlijk di. 17/11 groen licht te hebben van de omgevingsdienst en ook de GGD als opdrachtgever. Daar stukt het op dit moment.
Start bouw paviljoen kan dan op wo. 18/11

✓ Onderwerp	Progress
Contact met DPG	●
Driehoek DPG – LAB - OB	●
Vergunningen en contracten	●
Materieel en inrichting	●
Personeel	●
Opleiding	●
Koppeling CoronIT	●
Infrastructuur	●
Apparatuur	●
Afnamemateriaal	●
Reagentia / testen	●
PBM	●
Verkeersstromen	●
Labs op locatie	●
Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
Procesbeschrijvingen	●
Capaciteitsplanning en forecast	●
Waarborging privacy	●

12. Brabant Zuid Oost

Datum: 16 november 2020

Projectmanager: 5.1.2e


Testlocatie

- Auto / loop locatie
- Volgens concept
- Openingstijden: nog afstemmen

Type testen	vanaf	# testen / dag
-------------	-------	----------------

■ PCR		
-------	--	--


■ Antigeen		
------------	--	--

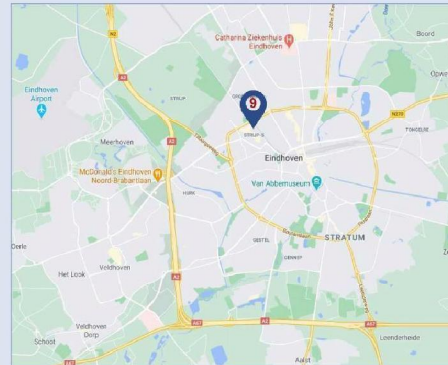

Status XL-locatie Brabant

Toelichting op status algemeen: Locatie in Eindhoven : Antoon Coolenlaan (Parking)

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	●
	Vergunningen en contracten / AKKOord	●
	Materieel en inrichting	●
	Personeel	●
	Opleiding personeel	●
	Koppeling CoronIT	●
	Infrastructuur	●
	Apparatuur	●
	Afnamemateriaal	●
	Reagentia / testen	●
	PBM	●
	Verkeersstromen	●
	Labs op locatie	●
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	●
	Procesbeschrijvingen	●
	Capaciteitsplanning en forecast	●
	Waarborging privacy	●

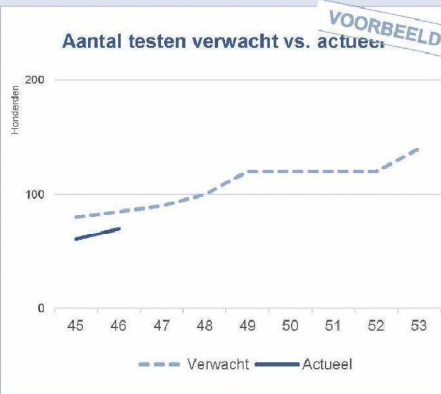

Activiteiten afgelopen week

1. Tekening ontwerp door GGD/GHOR
2. Afstemming op locatie / integratie

Activiteiten komende week

1. Selecteren leveranciers voor XL-teststraat
- 2.
- 3.
- 4.

● Op koers ● Issues, in control ● Issues, interventie nodig

15. Zuid Limburg

Datum: 9 november 2020


Projectleider: 5.1.2e

Testlocatie


- Locatie:
- Openingstijden:

Test	vanaf	# testen / dag
------	-------	----------------

- PCR
- Antigeen
- LAMP
- Breathomix

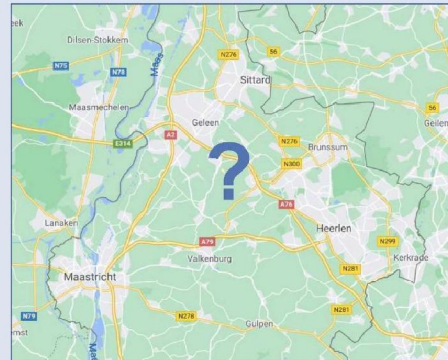

Aantal testen verwacht vs. actueel

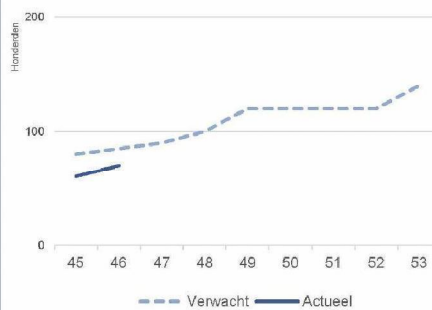

Activiteiten afgelopen week

- Verkenning locaties uitgevoerd
- Overleg met DPG & openbaar bestuur gevoerd
- Inrichten projectorganisatie

Activiteiten komende week

- Locatiekeuze
- Overleg met Lab
- Verder inrichten projectorganisatie

● Op koers
 ● Issues, in control
 ● Issues, interventie nodig

Status XL-locatie Zuid Limburg

Verkenning locatie is nagenoeg afgerond. Huurprijzen zijn bekend. Keuze locatie wordt deze week verwacht

✓	Onderwerp	Progress
	Contact met DPG	●
	Driehoek DPG – LAB - OB	○
	Vergunningen en contracten	○
	Materieel en inrichting	○
	Personeel	○
	Opleiding personeel	○
	Koppeling CoronIT	○
	Infrastructuur	○
	Apparatuur	○
	Afnamemateriaal	○
	Reagentia / testen	○
	PBM	○
	Verkeersstromen	○
	Labs op locatie	○
	Kwaliteitsbewaking en medische verantwoordelijkheid	○
	Procesbeschrijvingen	○
	Capaciteitsplanning en forecast	○
	Waarborging privacy	○
