



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Coördinatiegroep Bewijzen (VWS/RIVM/GGD GHOR)

17 juni 2021

5.1.2e




## Agenda

- **Verslag en acties**
- **Overall planning**
  - Projectorganisatie\*
  - Geïntegreerde planning\*
- **Resultaten en voortgang**
  - CoronaCheck en -Scanner
  - EU Gateway
  - DigiD
  - Datakoppelingen RIVM
  - Datakoppelingen GGD GHOR (+ backoffice en verwachtingen)
  - Datakoppelingen ziekenhuizen en overige hulpverleners
  - Herstelbewijzen HPZone
  - Buitenlandse vaccinaties
- **Communicatie**
  - Helpdesk (visual)
  - Campagne
  - Verhoogde dijkbewaking
  - Aanleveren vragen
- **Vervolgacties**

\* Work in progress




# Compacte programmastructuur DCC VWS voor de ondersteuning en begeleiding implementatie DCC

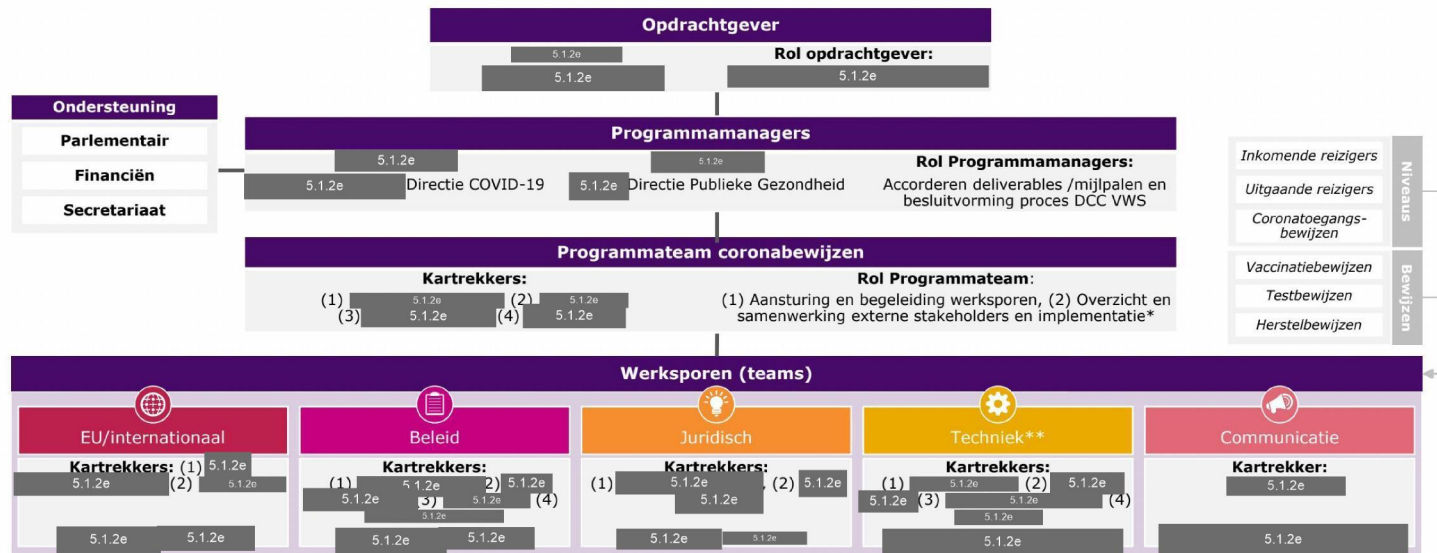

30 oktober 2024 | Voettekst \* Koppeling met werkspoor implementatie: interdepartementale werkgroep  
 \*\* Stuurgroep coronabewijzen onderdeel van werkspoor Techniek: wekelijks overleg met RIVM, GGD en VWS)




# Compacte interdepartementale programmastructuur voor implementatie Digitaal Corona Certificaat

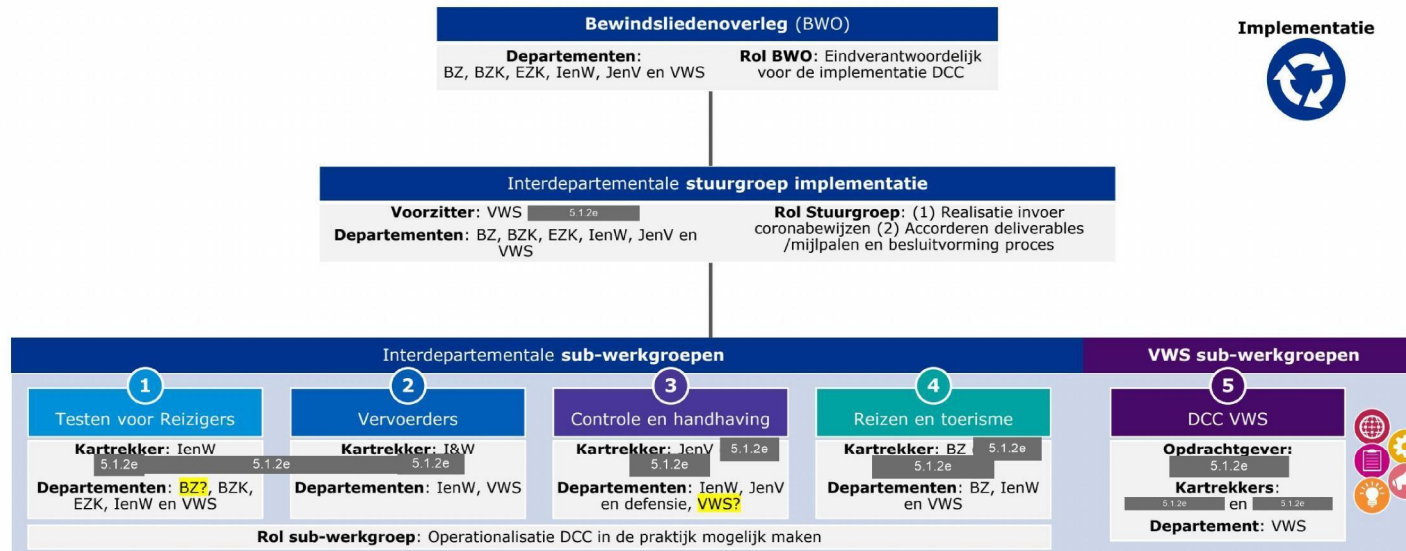

WIP Floris: eerst akkoord op  
planningsplaten



## Overzicht mijlpalen per werkspoor VWS DCC

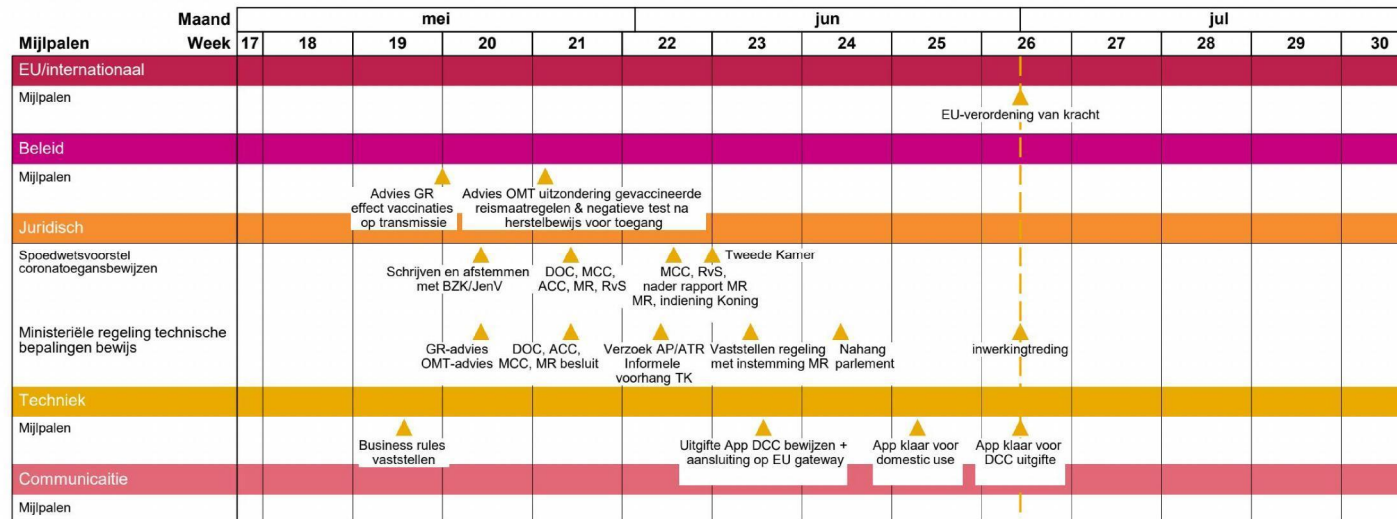

## Resultaten & voortgang RIVM

Resultaten

Zorgpunten

Gevraagde support

1

Technische  
Ontwikkeling

2

Beschikbaar maken  
RIVM data

- Beheer wordt ingeregeld en er wordt gewerkt aan de verhoogde dijkbewaking 24/7 voor de eerste drie weken
- Woensdag 16-6 is start gemaakt met PROD data inlezen in View en Staging vanuit CIMS

- Tijdstip van live gang hebben wij nodig om alles op het juiste moment 'aan' te kunnen zetten
