
Bijlage 1: Proces totstandkoming opschalingslijst per ziekenhuis

- **Als voorbeeld wordt per datum de aantallen IC-bedden voor de regio AZO weergegeven -**

30 juni 2020: aanbieden opschalingsplan LNAZ aan minister MZS. Dit plan is met betrokkenheid van vele veldpartijen opgesteld en vooraf uitgebreid afgestemd met de NVZ, NFU, V&VN, NVIC en alle ROAZen.

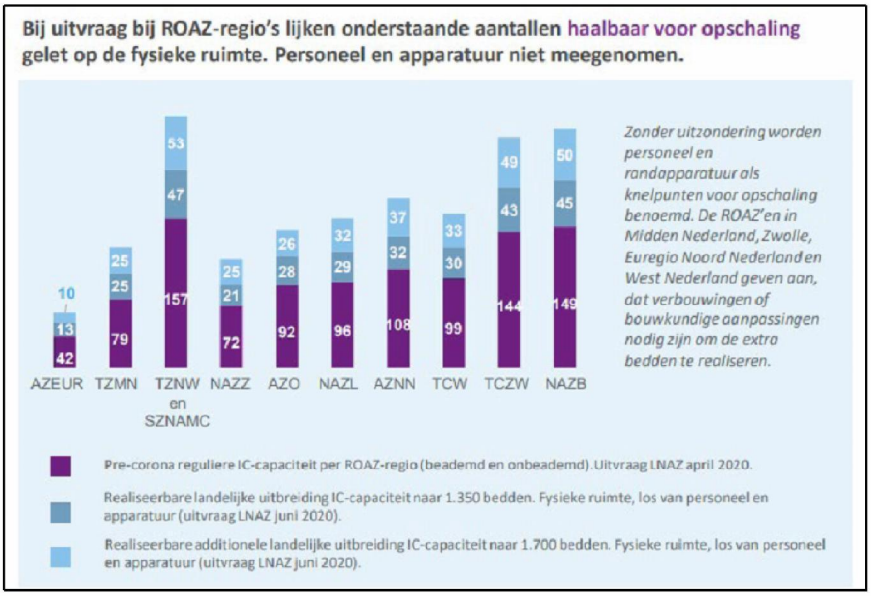

29 juli: In het Bestuurlijk Overleg van 29 juli jl. waar alle ROAZen, het LNAZ en VWS aanwezig waren, hebben alle ROAZen expliciet commitment uitgesproken op de gezamenlijke opschalingsopgave en het belang van de onderlinge verdeling daarvan per ziekenhuis onderstreept.

5 augustus: brief DGCZ aan ROAZ voorzitters met daarbij de door de ROAZ-regio's ingediende opschalingsvoorstellen per ziekenhuis. Hierin is ook de afspraak beschreven dat het niet mogelijk is om minder of meer bedden op te schalen, behalve als de ziekenhuizen onderling binnen de eigen ROAZ-regio ruilen en beide dit schriftelijk bevestigen richting het desbetreffende ROAZ; het ROAZ dit via de 5.1.2e aan VWS meldt; en VWS daarop schriftelijk een akkoord geeft.

ROAZ regio	Ziekenhuizen	Uitbreiding IC bedden naar 1.350 (fase 1 en 2) (uitsplitsing fase en 2 volgt PM)	Uitbreiding IC bedden van 1.350 naar 1.700 (fase 3)	Totaal uitbreiding IC bedden naar 1700
Totaal uitbreiding IC capaciteit		**334**	**329**	**663**
AZO	Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	7	5	12
	Radboudumc	12	11	23
	Rijnstate	8	6	14
	Ziekenhuis Rivierenland Tiel	2	0	2
	Slingeland Ziekenhuis	1	0	1
	Ziekenhuis Gelderse Vallei	5	3	8
	Totaal AZO	**35**	**25**	**60**

1 september: nieuwe opschalingslijst ontvangen van het LNAZ met wijzigingen van de regio's West, Noord-Nederland en Limburg. De totale aantallen per fase zijn gelijk gebleven.

De opschalingslijst was tot nu toe onderverdeeld in de opschaling tot 1350 bedden (fase 1 en 2 samen) en de opschaling tot 1700 bedden (fase 3) per ziekenhuis. VWS heeft aan het LNAZ aangegeven dat het voor de subsidieverlening nodig is dat het basisaantal IC bedden per ziekenhuis wordt aangegeven. Het totale aantal bedden in de uitgangssituatie moet uitkomen op 1035 bedden zoals aangegeven in het LNAZ opschalingsplan. Daarnaast was het noodzakelijk dat de opgegeven opschaling tot 1350 bedden werd opgesplitst in het aantal bedden dat wordt opgeschaald in fase 1 (1150 bedden) en fase 2 (1350 bedden). Fase 1 zal door de zorgverzekeraar betaald worden, fase 2 zal door middel van een VWS subsidie betaald worden. Aan het LNAZ is een nader uitgewerkte en uitgesplitste opschalingslijst gevraagd.

21 september: nieuwe opschalingslijst ontvangen van het LNAZ met daarin aangegeven per ziekenhuis de uitgangssituatie en opgesplitst het aantal bedden in fase 1 (1150), fase 2 (1350) en fase 3 (1700). Deze opsplitsing was nog niet aangeleverd door regio Zwolle en Midden-Nederland.

ROAZ regio	Ziekenhuizen	Uitgangssituatie	Uitbreiding IC bedden van uitgangssituatie naar 1150 (fase 1)	Uitbreiding IC bedden van 1150 naar 1.350 (fase 2)	Uitbreiding IC bedden van 1.350 naar 1.700 (fase 3)	Totaal uitbreiding IC bedden naar 1700
	Totaal uitbreiding IC capaciteit	**967**	**170**	**254**	**307**	**731**
	Totaal aantal bedden		**1137**	**1391**	**1698**	
AZO	Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	8	7	5	0	12
	Radboudumc	30	12	11	9	32
	Rijnstate	14	8	6	0	14
	Ziekenhuis Rivierenland Tiel	6	2	0	0	2
	Slingeland Ziekenhuis	7	1	0	0	1
	Ziekenhuis Gelderse Vallei	12	5	3	0	8
	Totaal opschaling AZO		**35**	**25**	**9**	**69**
	Totaal bedden AZO	**77**	**112**	**137**	**146**	

26 september: nieuwe opschalingslijst ontvangen van het LNAZ met daarin ook de opsplitsing tussen fase 1 en fase 2 voor de regio Zwolle en Midden-Nederland. Ook de laatste aanpassingen van verschillende regio's zijn hierin verwerkt.

ROAZ regio	Ziekenhuizen	Uitgangssituatie	Uitbreiding IC bedden van uitgangssituatie naar 1150 (fase 1)	Uitbreiding IC bedden van 1150 naar 1.350 (fase 2)	Uitbreiding IC bedden van 1.350 naar 1.700 (fase 3)	Totaal uitbreiding IC bedden naar 1700
	Totaal uitbreiding IC capaciteit	**967**	**151**	**265**	**300**	**716**
	Totaal aantal bedden		**1118**	**1383**	**1683**	
AZO	Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	8	7	5	0	12
	Radboudumc	30	12	11	9	32
	Rijnstate	14	8	6	0	14
	Ziekenhuis Rivierenland Tiel	6	2	0	0	2
	Slingeland Ziekenhuis	7	1	0	0	1
	Ziekenhuis Gelderse Vallei	12	5	3	0	8
	Totaal opschaling AZO		**35**	**25**	**9**	**69**
	Totaal bedden AZO	**77**	**112**	**137**	**146**	

5 oktober: laatste herziene versie van de opschalingslijst ontvangen van het LNAZ met de laatste wijzigingen voor een aantal regio's en onderstaande punten.

* Geen reactie nog ontvangen van AZO en Zwolle
* Ook niet van Limburg, maar die verwacht ik ook niet
* Ook niet van zuidwest (Rotterdam) maar die verwacht ik niet gelet op klein verschil
* Wel van Utrecht, Euregio en Brabant
* Andere regio's conform opgave.

ONDERSTAAND OVERIZICHT IS OPGESTELD OP BASIS VAN OPGAVEN VAN DE REGIO'S D.D. 25 SEPTEMBER 2020 OP ONDERDELEN WIJKEN FASE 1, 2 EN 3 (LICHT) AF VAN HET OPSCHALINGPLAN COVID-19 D.D. 30 JUNI DEZE AFWIJKINGEN WORDEN BENOEMD						
ROAZ regio	Ziekenhuizen	Uitgangssituatie	Uitbreiding IC bedden van uitgangssituatie naar 1150 (fase 1)	Uitbreiding IC bedden van 1150 naar 1.350 (fase 2)	Uitbreiding IC bedden van 1.350 naar 1.700 (fase 3)	Totaal uitbreiding IC bedden naar 1700
	Totaal uitbreiding IC capaciteit opgave aan VWS		121	265	307	693
	Totaal aantal bedden opgave aan VWS	999	1120	1385	1692	
	was in opschalingplan d.d. 30 juni	*1035*	*1145*	*1359*	*1692*	
	uitbreiding volgens opschalingsplan d.d. 30 juni		*110*	*214*	*333*	*657*
		was 72	*73* *berekend op 80*	*97* *was 93*	**115** *was 118*	
AZO	Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	8	7	5	0	12
	Radboudumc	30	12	11	9	32
	Rijnstate	14	8	6	0	14
	Ziekenhuis Rivierenland Tiel	6	2	0	0	2
	Slingeland Ziekenhuis	7	1	0	0	1
	Ziekenhuis Gelderse Vallei	12	5	3	0	8
	Totaal AZO	77	35	25	9	69

- Bij deze laatste lijsten komt het aantal bedden in de uitgangssituatie niet overeen met de afspraken die zijn gemaakt in het opschalingsplan (999 ipv 1035). Het aantal bedden in fase 1 en fase 2 komt ook niet overeen met de afspraken die zijn gemaakt over de hoeveelheid bedden die gefinancierd worden door de zorgverzekeraar en door de subsidie van VWS (fase 1: 1120 ipv 1150; fase 2: 1385 ipv 1350).
- Er is meerdere malen via het LNAZ gevraagd om een aanpassing van het aantal bedden in de uitgangssituatie, fase 1 en fase 2 zodat de totale aantallen uitkomen op het afgesproken aantal bedden in de uitgangssituatie en per opschalingsfase. Hier is in de verschillende ROAZ-overleggen aandacht aan besteed.
- Een sluitende lijst volgens deze afspraken is niet aangeleverd waarna VWS zelf een definitieve indeling heeft gemaakt. Hierbij is teruggegrepen naar de uitgangssituatie zoals weergegeven in het LNAZ opschalingsplan en de eerder aangeleverde overzichten (zonder opsplitsing). De verschuivingen zijn naar rato van de aangegeven verdelingen over de instellingen (in tabel van 5 oktober) doorgevoerd. Op die manier blijft de verhouding tussen de instellingen gelijk, maar wordt wel (bijna) het goede totaal aantal bedden per fase per regio gehaald.
- Ten opzichte van de aangeleverde informatie op 5 oktober zijn met name voor de volgende regio's aanpassingen doorgevoerd in fase 1 en fase 2 naar het niveau van het opschalingsplan: TZMN, NAZZ, AZO, NAZL. Het totaal aantal bedden per ziekenhuis (basis + opschaling) is wel gelijk gebleven aan de opschalingslijst van 5 oktober.

6 oktober: de aangepaste opschalingslijst, inclusief toelichting over de verdeling naar rato, is voorgelegd aan de ROAZ voorzitters met daarbij de mogelijkheid dat wijzigingen binnen een fase en binnen een regio nog gemeld kunnen worden voor het overleg op 7 oktober.

ROAZ regio	Ziekenhuizen	Uitgangssituatie	Uitbreiding IC bedden van uitgangssituatie naar 1150 (fase 1)	Uitbreiding IC bedden van 1150 naar 1.350 (fase 2)	Uitbreiding IC bedden van 1.350 naar 1.700 (fase 3)
	Totaal uitbreiding IC capaciteit opgave aan VWS		109	206	345
	Totaal aantal bedden opgave aan VWS	1037	1146	1352	1697
AZO	Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	10	2	4	4
	Radboudumc	36	3	8	15
	Rijnstate	17	2	4	5
	Ziekenhuis Rivierenland Tiel	7	1	0	0
	Slingeland Ziekenhuis	8	0	0	0
	Ziekenhuis Gelderse Vallei	14	2	2	2
	Totaal AZO	92	10	18	26

7 oktober: de aangepaste opschalingslijst is vastgesteld in het bestuurlijk overleg met DGCZ en alle ROAZ-voorzitters. Hier is afgesproken dat de enige verschuivingen die nog kunnen plaatsvinden een verschuiving is van bedden tussen ziekenhuizen binnen een regio en binnen

eenzelfde fase. De totale aantallen per fase dienen in de toekomst gelijk te blijven omdat anders de subsidieregeling niet kan worden uitgevoerd.

30 oktober: publicatie Subsidieregeling opschaling curatieve zorg Covid-19 met bijlage 1; opschalingslijst:

ROAZ regio	Ziekenhuizen	Uitgangssituatie	Uitbreiding IC bedden van uitgangssituatie naar 1.150 (fase 1)	Uitbreiding IC bedden van 1.150 naar 1.350 (fase 2)	Uitbreiding IC bedden van 1.350 naar 1.700 (fase 3)
	Totaal uitbreiding IC capaciteit opgave aan VWS		**109**	**206**	**343**
AZO	Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	10	2	4	4
	Radboudumc	36	3	8	15
	Rijnstate	17	2	4	5
	Ziekenhuis Rivierenland Tiel	7	1	0	0
	Slingeland Ziekenhuis	8	0	0	0
	Ziekenhuis Gelderse Vallei	14	2	2	2
	Totaal AZO	**92**	**10**	**18**	**26**
