# Stand van zaken
# ‘Actiecentrum Overplaatsingen VVT’

Presentatie DB, 9 april 2020

**RONAZ**

# Agenda

- Beoogde fasering in aanpak
- Stand van zaken fase 1 en 2
- Overgang naar fase 3?
- Lopende acties (mede n.a.v. voortschrijdend inzicht)
- Conclusies, aannemelijk scenario en vervolg
- Discussie / vragen

# Afspraken in DB 26 maart – Aanpak in 3 Fasen

| | |
|---|---|
| Fase 1 | • Reeds operationele externe cohorten vullen met cliënten vanuit de ziekenhuizen<br>• Overige bestaande capaciteit vullen met cliënten die medisch stabiel zijn, maar Covid-<br>• Inventariseren capaciteit van (nieuwe) externe cohorten<br>• Inventariseren capaciteit virale thuiszorgteams<br>• Inventariseren van plekken die er zijn binnen externe cohorten voor palliatief-terminale zorg. |
| Fase 2 | • Operationeel maken van nieuwe externe cohorten<br>• Aanspreken vrijgevallen capaciteit van de externe cohorten en de virale thuiszorgteams |
| Fase 3 | • (Mogelijke) aansluiting bij landelijke structuur<br>• Het beschikbaar stellen van externe cohorten en/of overige capaciteit aan andere regio's in Nederland |

N.B. 'extern cohort' is binnen de ouderenzorg, maar beschikbaar voor overplaatsingen uit ziekenhuis;
'intern cohort' is voor de eigen cliënten van een V&V organisatie

# Stand van zaken fase 1

*1. Reeds operationele externe cohorten vullen vanuit de ziekenhuizen*

- Operationele Beddencapaciteit d.d. 8 april – **382**
- Gestart met **6** locaties, inmiddels verdeeld over **24** locaties (zie volgende dia)
- Bezettingsgraad 'intramuraal' – **65%**

- Capaciteit thuiszorg moeilijk inzichtelijk te maken
- Bezetting in aantallen (Noord en Midden-West) **388**

**RONAZ**

# Overzicht externe cohorten

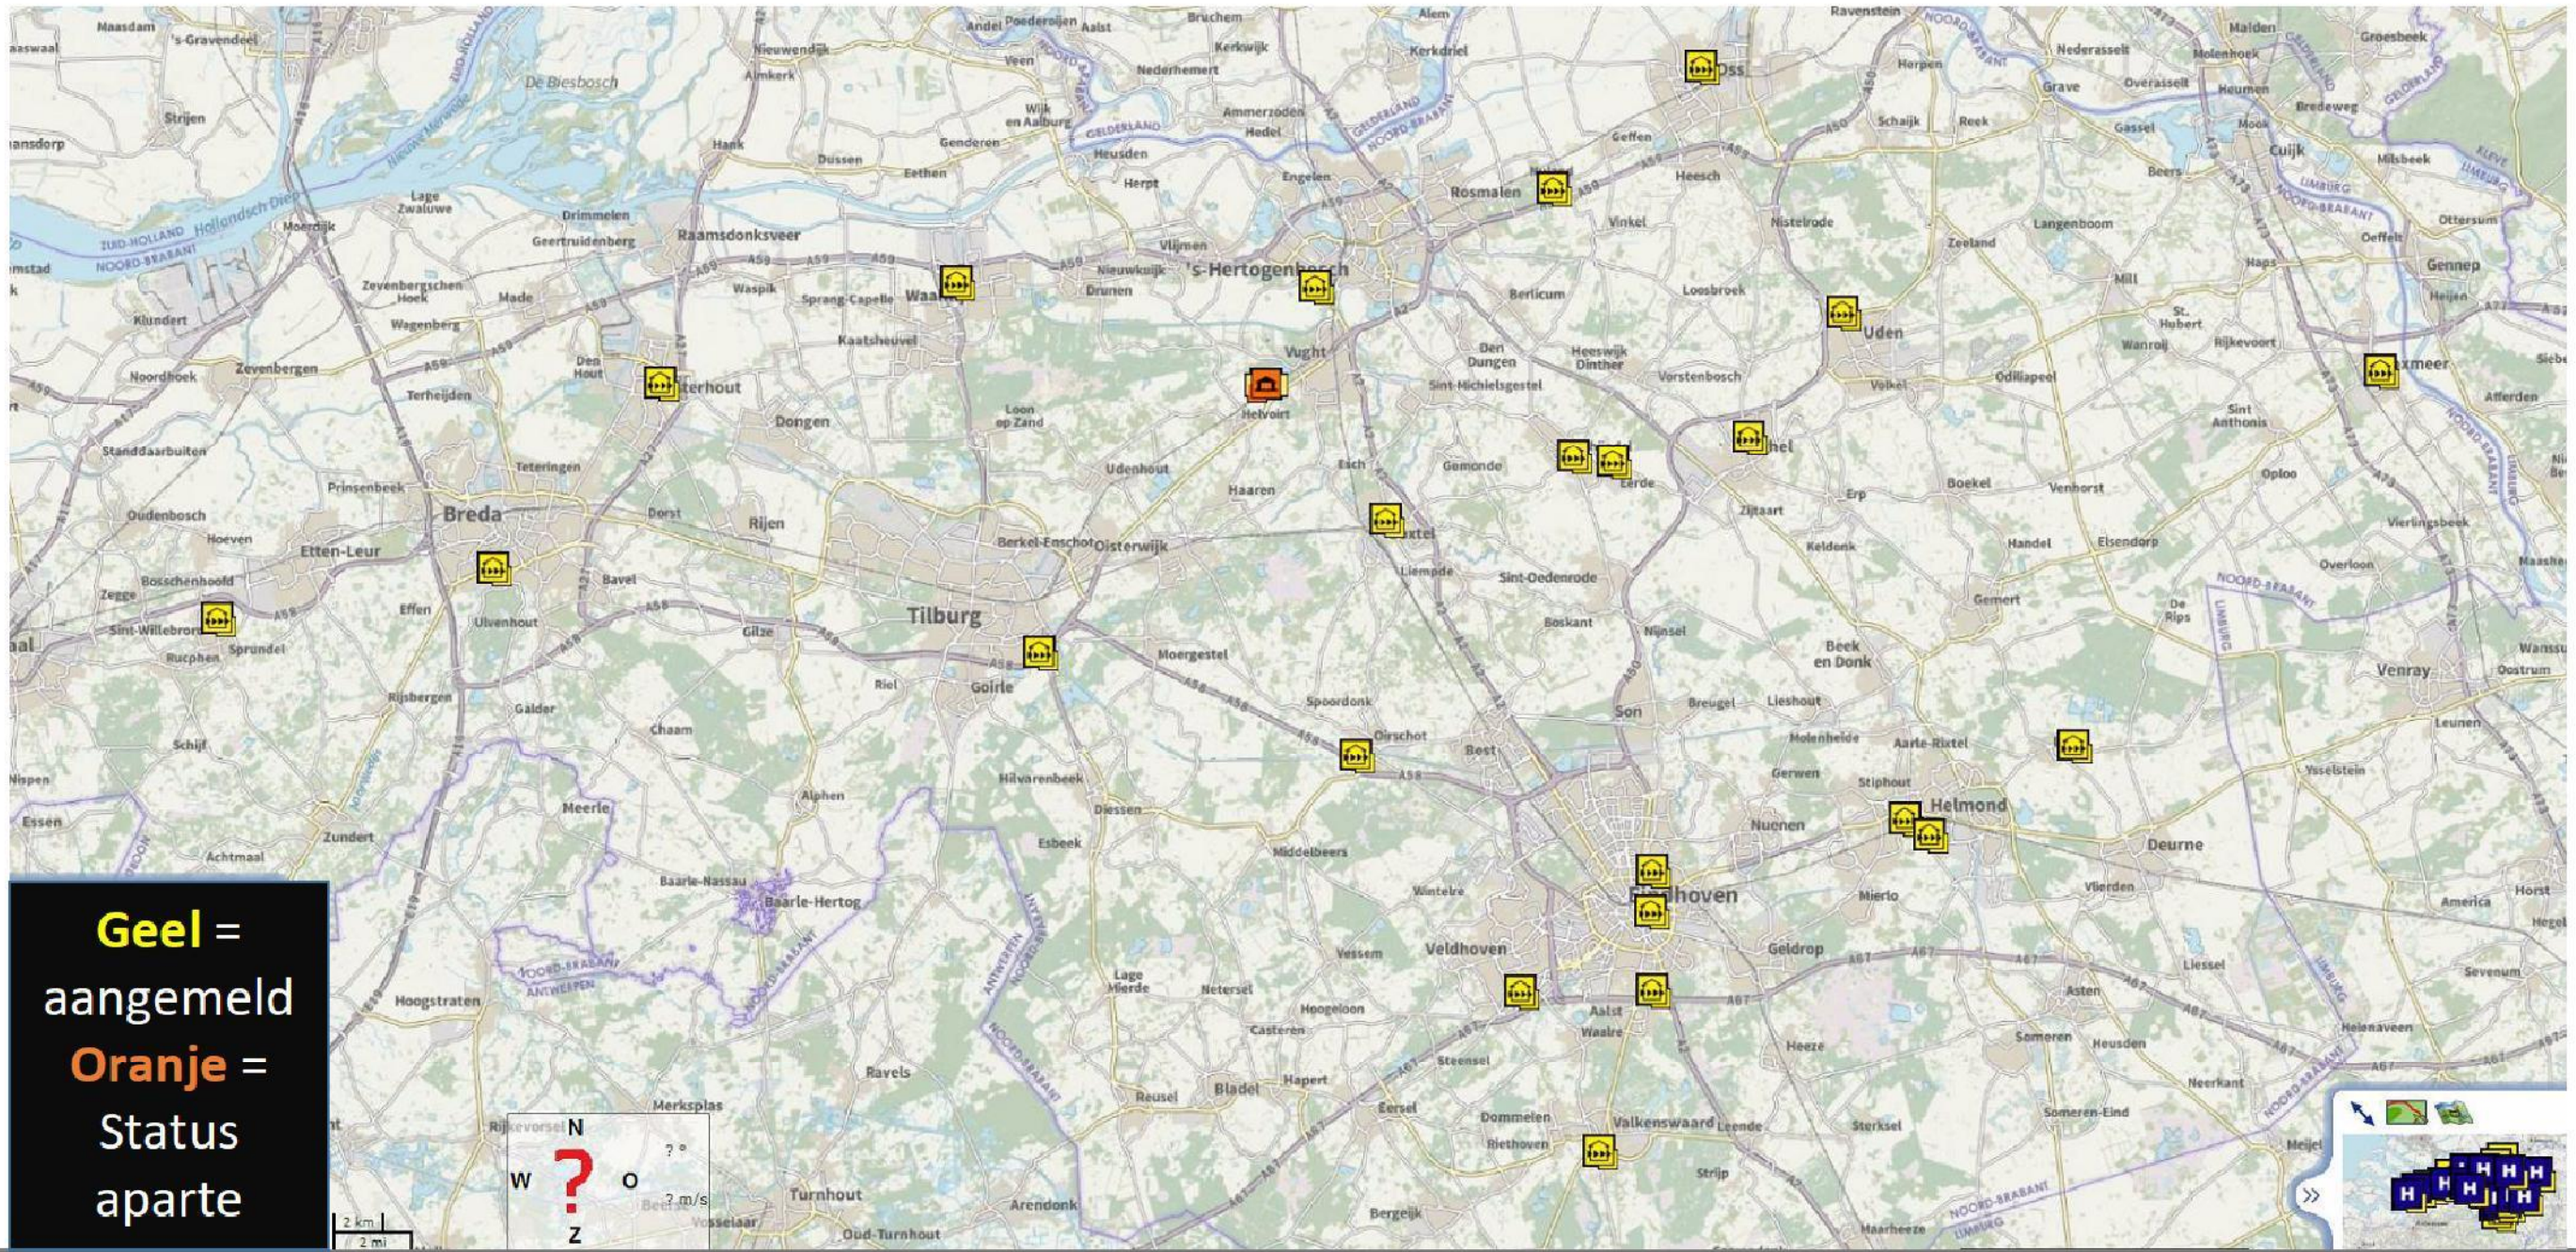

# Capaciteit versus bezetting

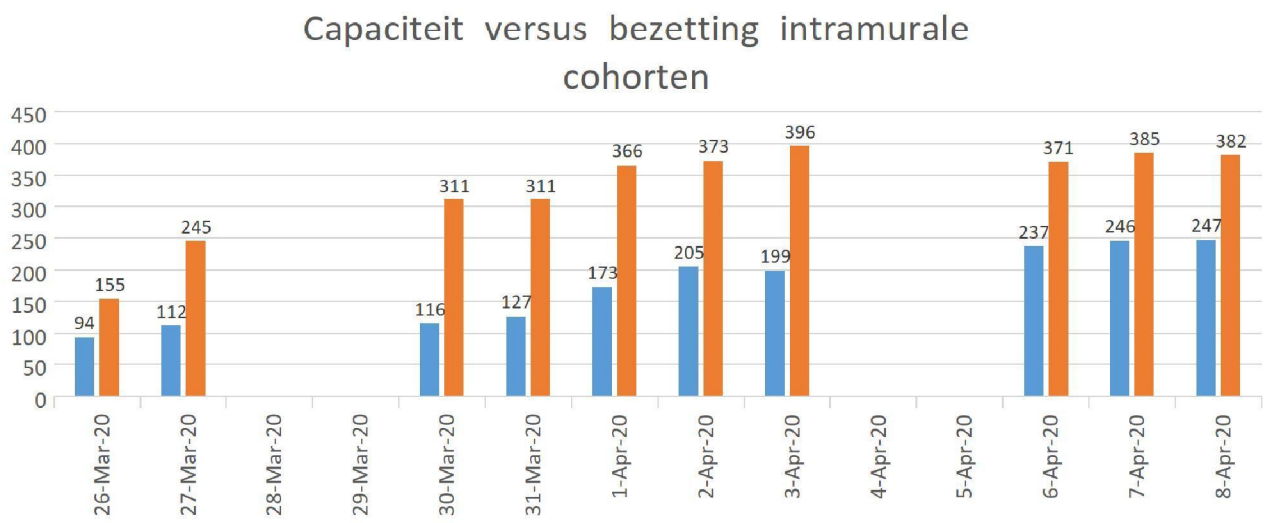


**RONAZ**

# Stand van zaken fase 1 - vervolg

*2. Overige bestaande capaciteit vullen met cliënten die medisch stabiel zijn, maar Covid-*

- Vooral van toepassing in de eerste 3 tot 4 dagen na opening (26 mrt.)
- Naar schatting **120 – 130** overplaatsingen in die periode
- Daarna minder noodzaak vanuit ziekenhuizen

**RONAZ**

# Stand van zaken fase 1 - vervolg

*3. Inventariseren capaciteit (nieuwe) externe cohorten (incl. thuiszorg)*

- Extra V&V capaciteit geopend – **137** plaatsen (sinds 26 mrt.)
- Extra capaciteit thuiszorg naar schatting tenminste **1.200** plaatsen (400 per veiligheidsregio)
- Totale capaciteit 382 (V&V) en 1.200 (thuiszorg) **1.582** plaatsen

**RONAZ**

# Stand van zaken fase 1 - vervolg

*4. Inventariseren van plekken die er zijn binnen externe cohorten voor palliatief-terminale zorg*

- Vooral capaciteit thuiszorg kan benut worden
- Geen exacte aantallen, maar vrijwel alle thuiszorgteams hierop berekend
- Intramuraal is er alleen in regio Zuidoost een pall. cohort met **7** plaatsen

**RONAZ**

# Stand van zaken fase 2

*Operationeel maken nieuwe externe cohorten* ✓

*Aanspreken thuiszorg capaciteit* ✓

**RONAZ**

# Uitgelicht: bezettingsgraad cohorten

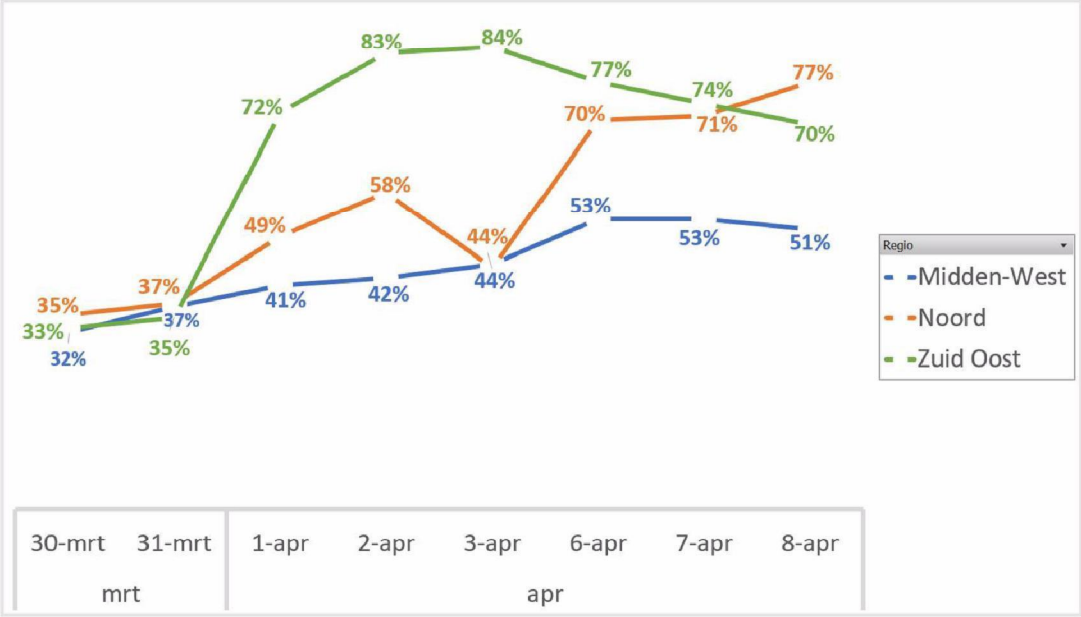


**RONAZ**

# Overgang naar fase 3?

*(Mogelijke) aansluiting bij landelijke structuur (LCPS)*

*Het beschikbaar stellen van onze cohortcapaciteit aan andere regio's in Nederland*

# Afgeronde acties

**Top 3**

- Op een aantal plaatsen (cure & care) extra capaciteit voor transferafdeling gerealiseerd, dan wel voor organisatie met ‘acute nood’
- Per veiligheidsregio een regionaal aanmeldcentrum ingericht
- Toolkit gemaakt met belangrijkste documenten voor vragen uit andere regio’s

# Lopende acties

**Top 3**

- Terugkeer van eerste bovenregionale uitplaatsingen vanuit de cure mogelijk maken m.b.v. regionale aanmeldcentra
- Per (intramuraal) cohort in beeld brengen wat de startdatum is en de bezetting per dag i.v.m. financiering
- Voorbereiden communicatie over distributie PBM's (i.p.v. ophalen) i.s.m. mensen van de GHOR

**RONAZ**

# Conclusies

- Doelstellingen fase 1 en 2 gerealiseerd
- Fase 3 deels niet van toepassing (aansluiting LCPS) en deels openstaande vraag (cohorten beschikbaar stellen voor andere regio's)
- Reguliere routes en regionale aanmeldcentra lopen goed
- Op korte termijn geen piek te verwachten in overplaatsingen naar VVT (zie volgende dia's)

# Uitgelicht: verloop intramurale bezetting

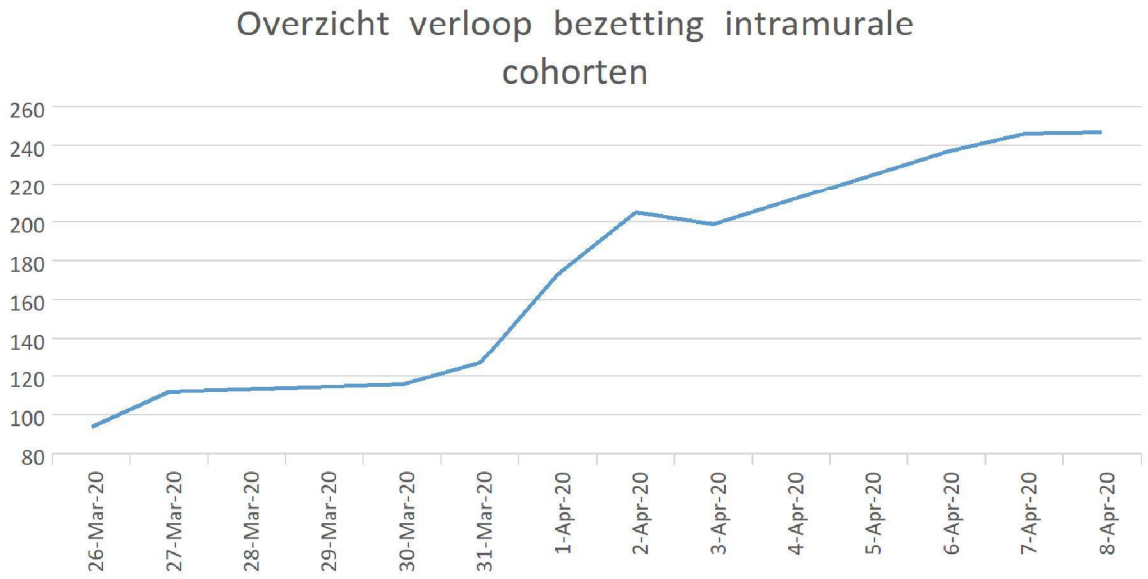

# Vervolg

- Onzekerheden in verloop de komende weken:
  - *Wat komt er nog terug vanuit de ziekenhuizen in Noord-Brabant naar de VVT?*
  - *Wat komt er nog terug n.a.v. bovenregionale overplaatsingen vanuit de cure?*
  - *(Wat stroomt er vanuit de bezette IC's door naar een plaats op de GRZ/ELV?)*

# Opmaat voor scenario – stap 1

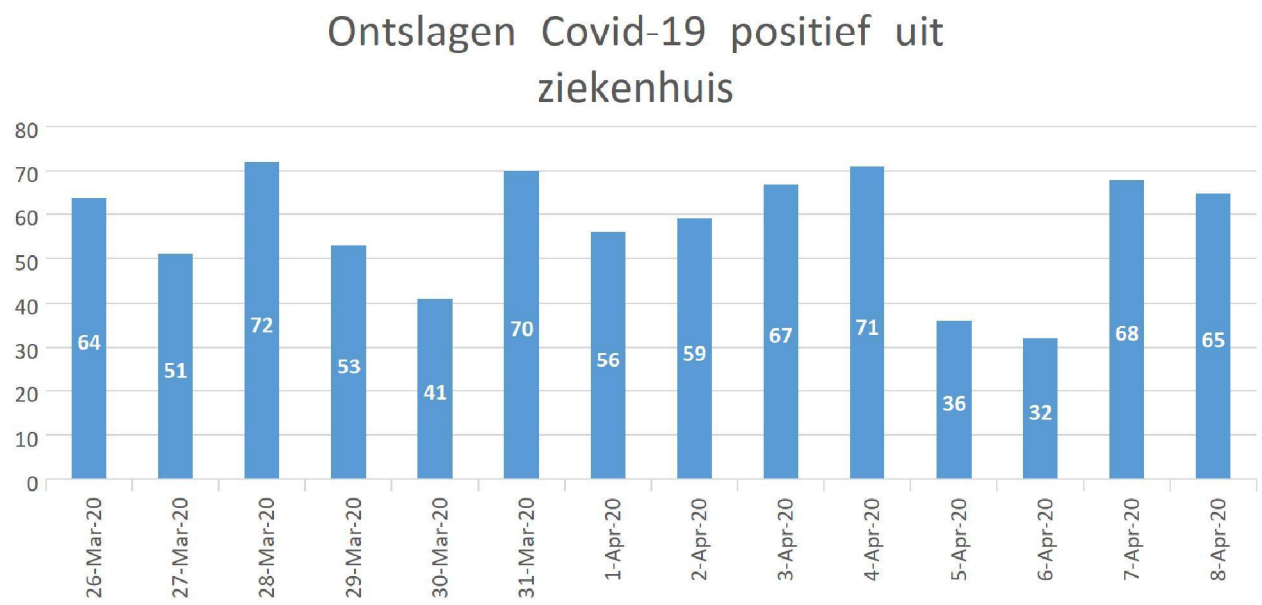


Totaal

**805**

**RONAZ**

# Opmaat voor scenario – stap 2

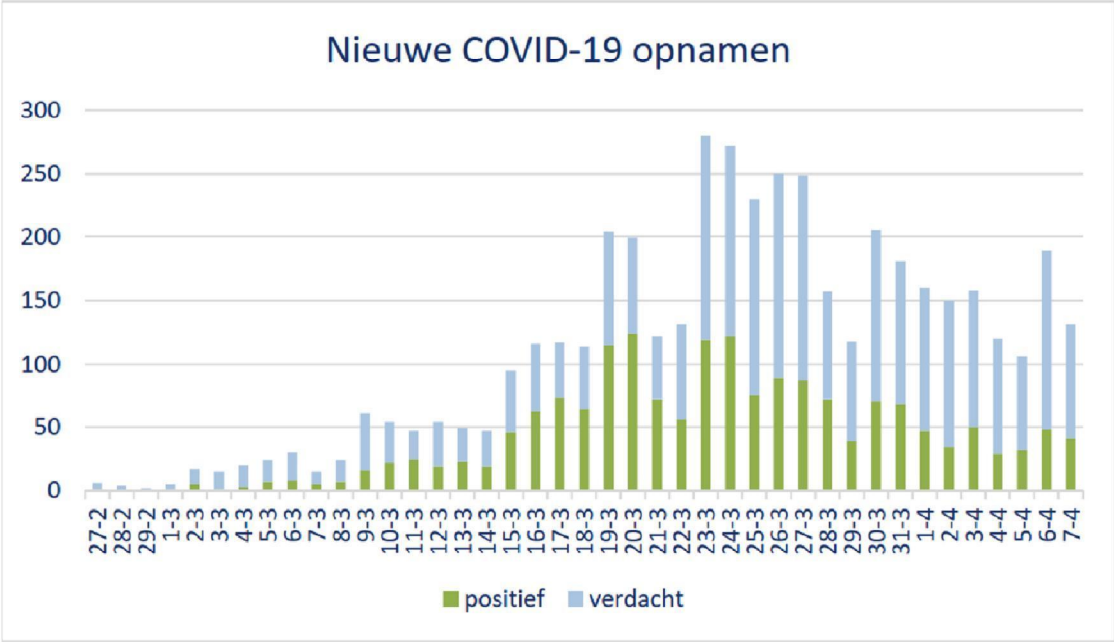


Duidelijk dalende lijn in cure van opname besmette mensen

# Opmaat voor scenario – stap 3

- Besmette mensen in afgelopen 2 weken ontslagen uit ziekenhuis: **805**
  Dalende lijn laat zien dat opnames inmiddels gehalveerd zijn

- In deze periode bezetting bereikt van **247** besmette mensen op intramuraal cohort (= 30,6% t.o.v. uitgeplaatste mensen vanuit zkh.)

- Stel dat er in de 2 komende weken nog eens 400 bijkomen (n.a.v. halvering) dan is capaciteit van **120** extra intramurale bedden nodig

- Deze capaciteit is inmiddels aanwezig, namelijk **382** totaal

# Voorstel

- Geen extra capaciteit meer creëren in ‘intramurale cohorten’
- Actiecentrum Overplaatsingen/VVT kan (tenminste voor nu) afschalen; wel dagelijks de overplaatsingen blijven monitoren
- Blijven aanhaken bij ontwikkelingen Actiecentrum Overplaatsingen Cure
- DB RONAZ blijft (via [redacted] 5.1.2e ) regelmatig op de hoogte

**RONAZ**

# Discussie / vragen

# Bijlage: ‘goedgekeurde externe VVT cohorten’

| Noord | | |
|---|---|---|
| | Elde Maasduijnen | Liduina, Boxtel |
| | Brabantzorg | Uden |
| | Brabantzorg Watersteeg | Veghel |
| | Brabantzorg, De Wellen | Oss |
| | Laverhof vijverhof 2 | Schijndel |
| | Laverhof Mgr Bekkershuis | Schijndel |
| | Pantein | Madeleine |
| | Corona Zorgcentrum, JBZ | 5.1.2e |
| | Joszefoord | Nuland |

| Zuidoost | | |
|---|---|---|
| | Zorg in Oktober | Merefeldt, Veldhoven |
| | Archipel | Dommelhoef, Eindhoven |
| | Vitalis | Peppelrode |
| | Zorgboog, Savant | Fletcher hotel Helmond |
| | Zorgboog, Hospice | Populier |
| | Sint Annaklooster | Valkenhaeghe |
| | Valkenhof | Valkenswaard |
| | Amaliazorg | Kempenhaven |
| | Amaliazorg, Catherinenberg | Oisterwijk |

| Midden West | | |
|---|---|---|
| | Schakelring | Waalwijk |
| | De Riethorst Str./ Volckaert | Oosterhout |
| | tanteLouise | Bravis, Bergen op Zoom |
| | Groenhuysen | Heistede, St. Willebrord |
| | Thebe, DeMarq | Langendijk, Breda |
| | De Wever | Damast, Tilburg |

**RONAZ**
