



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Centraal Bureau voor de Statistiek
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit




Uitwerking planning eerste scena

Een voorlopige tijdsplanning, risico's en beheersmaatregelen en voorzet aansluiting ketenpartners voor het vaccinatieprogramma COVID-19

concept | 9 dec 2020



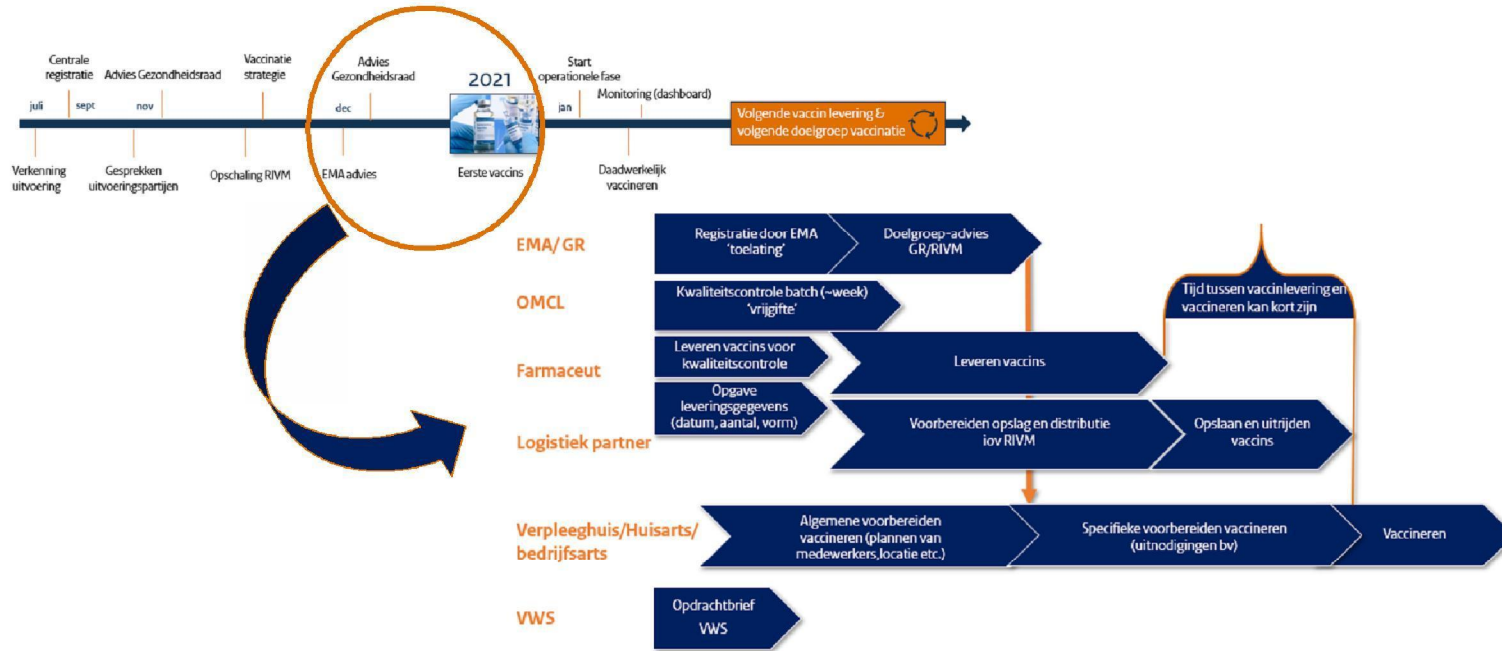




UITWERKING SCENARIO (1b)

Vaccinatie bewoners in verpleeghuizen en verstandelijk gehandicapten instellingen



5.1.2e aanvullen

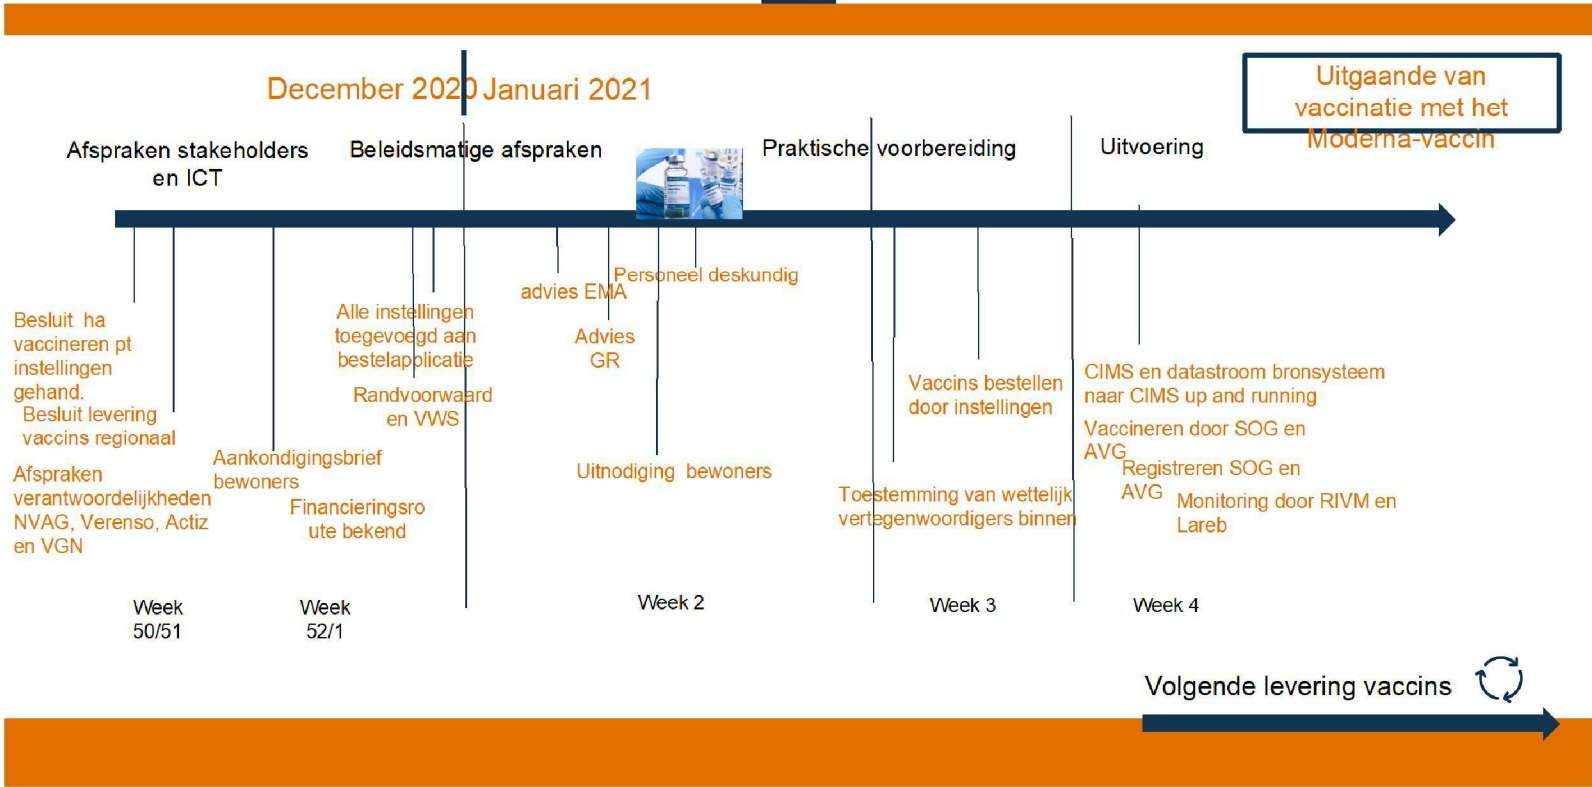



5.1.2e

aanvullen



Risico's	Beheersmaatregelen
Afhankelijkheid ICT (CIMS en bestelapplicatie ect.)	Alternatieven inrichten
Niet alle instellingen zijn bekend bij de branche	Uitbreiden met info van zorgkantoren
Logistiek en opslag (condities) lokaal is complex	Kijken naar samenwerkingsverbanden regional of alternatief plan
Vaccinlevering nog onbekend	Planning aanpassen zodra dit bekend is, alvast prioritering aanbrengen



5.1.2e

aanvullen

VWS

5.1.2e

Randvoorwaarden

- ✓ Tarief Toediening
- ✓ Tarief aanpassen ICT systeem t.b.v. registratie
- ✓ Randvoorwaarden OVAL
- ✓ Juridische grondslag wijzigen t.b.v. registratie
- ✓ Betrokkenheid relevante partijen, zoals instellingen en Arbodiensten en GGD
- ✓ Publiekscommunicatie
- ✓ Bekrachtiging besluit uitvoeringsscenario

RIVM

5.1.2e

Deskundigheidsbevordering

- ✓ LCI vraagbaak gereed
- ✓ Richtlijn professionals
- ✓ Calamiteitenprotocol gereed
- ✓ Communicatie professionals
- ✓ Vaccinlogistiek en fijndistributie
- ✓ Beveiliging vaccinatie locaties
- ✓ Vaccinatiebewijs
- ✓ Oproepafspraken beleggen en oproepset gereed
- ✓ Coördinatie van gehele keten (voorbereiding tot registratie)
- ✓ Monitoring vaccinaties
- ✓ Bestelapplicatie
- ✓ Ent financiering

5.1.2e

en

5.1.2e

Registratie

- ✓ CIMS gereed
- ✓ Decentrale registratie specificaties
- ✓ Koppelingen met decentrale bronssystemen gereed
- ✓ Alternatief plan voor koppeling (getest en gereed).
- ✓ Uitgifte digitaal vaccinatiebewijs
- ✓ Inrichting cliënten portaal

GGD GHOR

5.1.2e

- ✓ Bestellingen vaccins
- ✓ Infrastructuur gereed
- ✓ Logistiek planning en uitvoering
- ✓ Afspraken, vaccinatie locatie en tijdstip
- ✓ Decentrale registratiesysteem gereed

ARBO DIENSTEN

5.1.2e

5.1.2e

, en

- ✓ Uitvoering vaccinatie door bevoegd personeel
- ✓ Eigen registratie medisch dossier?
- ✓ Borging werken volgens de richtlijn
- ✓ PBM
- ✓ Niet bij Oval aangesloten arbodiensten aanhaken

WERKGEVERS

5.1.2e

(Actiz) en

5.1.2e

(VGN)

- ✓ Oproeplijsten maken
- ✓ Deelname vaccinatie faciliteren voor zorgpersoneel




UITWERKING SCENARIO (1a)

**Vaccinatie zorgmedewerkers werkzaam in verpleeghuizen, verstande
gehandicapten instellingen en thuiszorgmedewerkers**



December 2020 Januari 2021

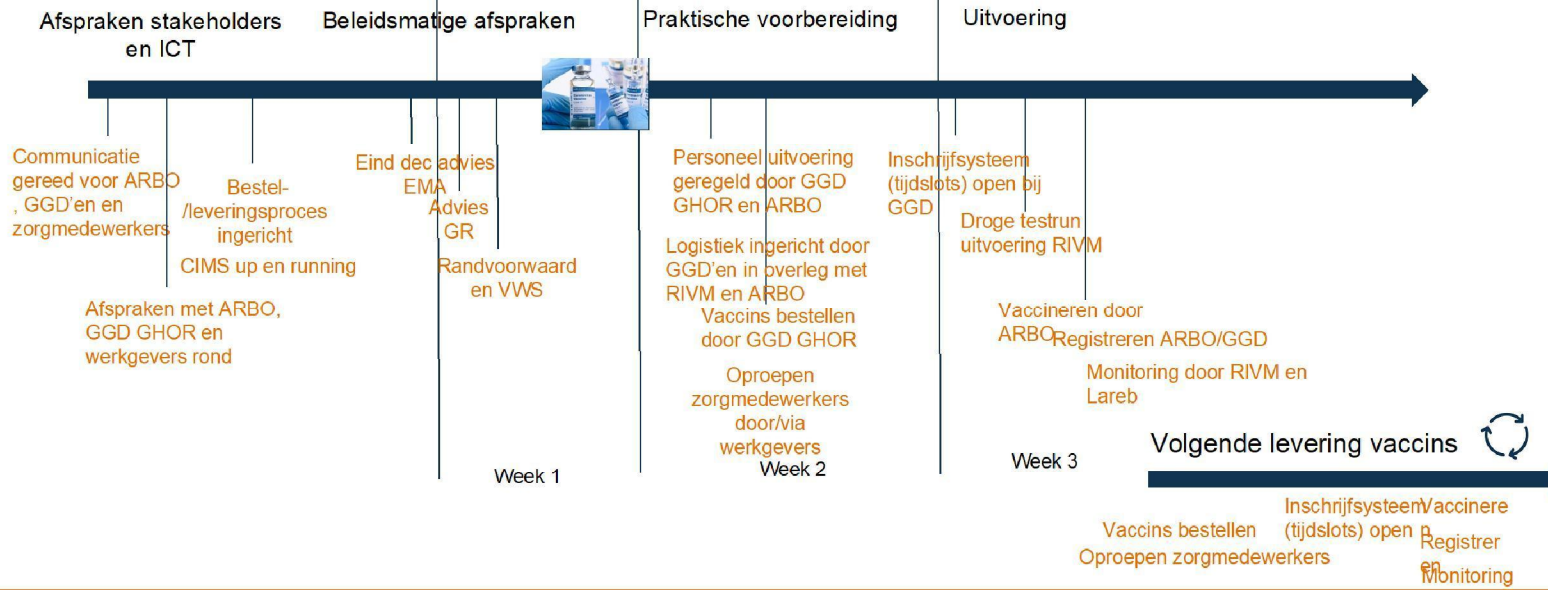



Risico's	Beheersmaatregelen
Dekking zorgmedewerkers zonder arbodienst	Worden meegenomen in andere doelgroepen
IT (CIMS en bestelapplicatie ect.)	Alternatieven inrichten
Lokale samenwerking	Proactief multidisciplinair faciliteren en creëren van draagvlak + inrichten opschalingsstructuur
Extra rondes inrichten noodzakelijk	Planning wendbaar inrichten



VWS

5.1.2e

Randvoorwaarden

- ✓ Tarief Toediening;
- ✓ Tarief aanpassen ICT systeem t.b.v. registratie;
- ✓ Randvoorwaarden OVAL;
- ✓ Juridische grondslag wijzigen t.b.v. registratie;
- ✓ Betrokkenheid partijen; instellingen en Arbo GGD
- ✓ Publiekscommunicatie
- ✓ Bekrachtiging besluit uitvoeringsscenario
- ✓ Randvoorwaarden GGD scheppen bij gebruik XL testlocaties in relatie tot testbeleid?

RIVM

5.1.2e en 5.1.2e

Draaiboek zorgprofessionals met o.a.

- ✓ Deskundigheidsbevordering
- ✓ Richtlijn professionals
- ✓ Communicatie professionals
- ✓ Vaccinlogistiek en fijn distributie
- ✓ Beveiliging grote vaccinatie locaties
- ✓ Vaccinatiebewijs
- ✓ Oproepafspraken beleggen en oproepset gereed
- ✓ Coördinatie van gehele keten (voorbereiding tot registratie)
- ✓ Monitoring vaccinaties
- ✓ Bestelapplicatie
- ✓ Ent financiering
- ✓ Calamiteiten protocol gereed

5.1.2e en 5.1.2e

Registratie

- ✓ CIMS gereed
- ✓ Decentrale registratie specificaties
- ✓ Koppelingen met decentrale bronssystemen gereed
- ✓ Alternatief plan voor koppeling (getest en gereed).
- ✓ Uitgifte digitaal vaccinatiebewijs
- ✓ Inrichting cliënten portaal

GGD GHOR

5.1.2e

- ✓ Bestellingen vaccins
- ✓ Infrastructuur gereed
- ✓ Logistiek planning en uitvoering
- ✓ Afspraken, vaccinatie locatie en tijdstip
- ✓ Decentrale registratiesysteem gereed

ARBO DIENSTEN

5.1.2e 5.1.2e, en

- ✓ Uitvoering vaccinatie door bevoegd personeel
- ✓ Eigen registratie medisch dossier?
- ✓ Borging werken volgens de richtlijn
- ✓ PBM
- ✓ Niet bij Oval aangesloten arbodiensten aanhaken

WERKGEVERS

5.1.2e (Actiz) en 5.1.2e (VGN)

- ✓ Oproeplijsten maken
- ✓ Deelname vaccinatie faciliteren voor zorgpersoneel
