



UEFA EURO 2020 (Amsterdam)
SCENARIO'S VWS V20210121



Beste 5.1.2a 5.1.2e

In navolging op ons overleg in december bespraken we afgelopen dinsdag 19 januari de vervolgstappen mbt besluitvorming over het te gebruiken scenario voor de organisatie van Euro2020. Zoals gevraagd hierbij een aantal zaken mbt de verschillende scenario's samengevat in een document.

Scenario's

De huidige status mbt de uitwerking van verschillende scenario's is dat het scenario waarin er geen of nauwelijks meer invloed is vanuit corona (het zgn oude normaal) definitief is afgefallen. Dat betekent dat we nog aan de volgende scenario's verder werken.

N2; 'Nieuwe normaal'

Dit betreft wedstrijden met een volledig gevuld stadion mogelijk gemaakt door het nemen van extra maatregelen. In dit scenario gaan we ervan uit dat toeschouwers ofwel gevaccineerd zijn ofwel negatief getest. Binnen Fieldlab evenementen wordt samen met de overheid gewerkt aan de juiste procedures en voorwaarden om op verantwoorde wijze door de anderhalve meter heen te komen. Uitgangspunt is verder dat de vaccinatiestrategie in juni voldoende uitgerold moet zijn zodat tenminste de meest kwetsbare groepen gevaccineerd zijn. En dat daarmee de druk op de zorg is weggenomen. In nauwe samenwerking met VNO-NCW wordt op dit moment al zeer concreet gewerkt aan de realisatie van voldoende (snel-)testcapaciteit.

Dit is ons 'lead-scenario'.

N3; 'Beperkt publiek'

Gebaseerd op een social distancing maatregel van 1,5m zou dit scenario op ongeveer 25% uitkomen.

Dit is ons 'back-up scenario'

N4; 'Wedstrijden zonder publiek'

Aanpak

De vier wedstrijden in Amsterdam maken onderdeel uit van het op twee na grootste sportevenement ter wereld. De in totaal 51 wedstrijden worden in 12 verschillende landen gespeeld, door 3,5 mln internationale tickethouders bezocht en door (cumulatief) 5 miljard mensen wereldwijd bekeken. Deze omvang maakt de organisatie minder flexibel. Om in juni een scenario te kunnen uitvoeren moet in maart een start gemaakt worden met de implementatie daarvan. Besluitvorming moet derhalve eind februari/begin maart plaatsvinden.

5 maart 2021 is de datum waarop wij bij UEFA dienen aan te geven welk scenario voor Nederland het zgn 'lead scenario' is. Het scenario dat we direct daarna gaan uitvoeren om tijdig alles klaar te hebben voor het toernooi. Omdat niemand met zekerheid kan voorspelen hoe de COVID-19 situatie in juni 2021 is wordt parallel daaraan een back-up scenario uitgewerkt. Opschalen is gezien de omvang en complexiteit van het toernooi zeer moeilijk.


We bespraken een aanpak waarbij we op uiterlijk 5 maart vaststellen dat scenario N2 het 'lead-scenario' is en dat we een moment afspreken waarop bekeken wordt of N2 nog steeds een verstandig scenario is of dat we terugschakelen naar N3. Uiteraard alleen indien echt noodzakelijk ivm de enorme implicaties die het afschalen met zich meebrengt (bv. tickethouders die reizen/hotels geboekt hebben). Op welk moment tussen maart en juni dat zou zijn nog af te stemmen, zowel onderling als met UEFA.



Wij vragen geen financiële compensatie in het geval er noodgedwongen toch afgeschaald moet worden. We zien dit dan los van het reguliere subsidieproces zoals reeds overeengekomen.

Verder kwamen we aan het einde van ons overleg op nog een nieuw alternatief scenario waarbij er geen nieuwe tickets verkocht worden voor de wedstrijden in Amsterdam, maar alleen de bestaande tickethouders de wedstrijden kunnen bezoeken. De bezetting zou voor de groepswedstrijden dan ongeveer 80% zijn en voor de achtste finale ongeveer 60%.

Planning

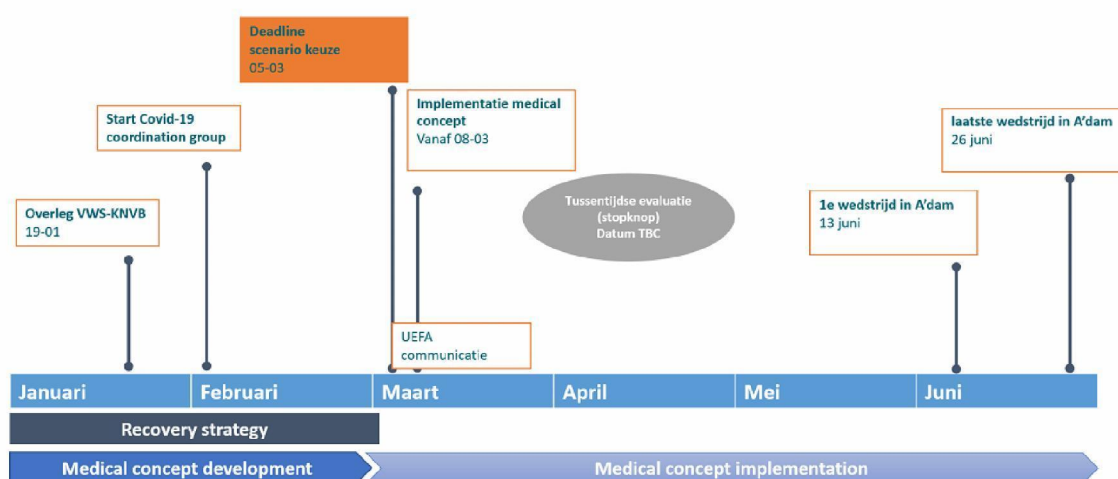

Covid-19 Coordination Group

Tijdens ons overleg spraken we ook over jullie deelname aan de zgn Covid-19 coordination group. Dit is een groep personen/organisaties die gaat beoordelen of de covid maatregelen die UEFA aan het opstellen is voor dit toernooi toepasbaar zijn in de Nederlandse context en vervolgens ook betrokken blijft voor een goede implementatie.

Dit betreft onderwerpen als:

- Testprocedures
- Team bubble-to-bubble
- Reisbeperkingen
- Wedstrijdorganisatie (bv warming-up, dragen van maskers, ballenjongens, etc)
- Stadionoperatie (maatregelen, zoning, media activiteiten, catering, etc)
- Toeschouwers (aanpassen van services en procedures, pro/re-actieve communicatie, etc)

Het Ministerie van VWS, directie Sport is binnen deze groep dan de liaison naar de landelijke overheid zoals reeds gebruikelijk is bij de organisatie van grootschalige sportevenementen. Waar nodig kan VWS andere ministeries/diensten op onderwerp uitnodigen aan te sluiten.



De overige leden van deze groep zijn:

- [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (toegezegd)
- [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (toegezegd)
- GGD Amsterdam (wordt benaderd); mede op verzoek van de wethouder Sport Amsterdam, tevens stuurgroep lid Euro2020
- Onafhankelijke viroloog (wordt benaderd)
- [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (toegezegd)

De grove planning hiervan is als volgt:

Tot eind januari	instellen Covid-19 coordination group
Begin februari	eerste overleg
Tot 5 maart	beoordeling/validatie van het Medical Operational Concept
Vanaf 8 maart	implementatie van het Medical Operational Concept

